

105
Huntis

289

33

D 1-0223

30304

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 NOV 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1933 för
"torrlägningsföretaget Österby" i Råby - Rekarne socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusensexhundratio (2.610) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundrasextio (2.260) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ende intressent i} ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ ~~er~~ och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Esterby m. Folkesta den *27. nov.* 19*33*.

Gottfr. Magnusson

Att *Gottfr. Magnusson, Esterby m. Folkesta*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Peter Björck
Adress *Esterby, Folkesta*

W. Schiller
Adress *Esterby, Folkesta*

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 december 1933.

Carl Hansson

W. Laitz

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1*0223

30304

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 NOV. 1933

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Österby

i Råby-Rekarne socknen av Södermanlands län.

1.
Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
Ö S T E R B Y
i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län,
upprättat år 1932 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 27 oktober 1933 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att sträckan
1+10 - 1+26 av Likasträckan B-C må utföras såsom öppet avlopp
med bottenbredd 0,3 m. och sidolutning 1:1,25.

Stockholm den 7 november 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftar på tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

2.

Betänkande rörande torrlägningsföre-

taget Österby i Råby-Rekarne socken av Sö-
dermanlands län, upprättat i och för er-
hållande av statsunderstöd år 1932.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet för-
ordnande har under år 1932 syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Österby i Råby-Rekarne soc-
ken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 15
september 1932. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har
besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Ös-
terbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. D.) och ritning
(Bil. E.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 1,5 kilometer
öster om Råby-Rekarne kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å
till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst
gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 16,41 har,
varav 15,97 har åker och 0,44 har betesmark. Jordmånen är av mycket god
beskaffenhet och består av lermylla på lera.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syne-

3.
förrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F.

Å sträckan B-C, där avloppet går fram genom högre belägen mark, hörande till egendomens trädgård, har rörledning av betongrör föreskrivits till utförande, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet dike.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med torrlägningsarbetets utförande skola två ågovägsbroar vid punkterna 8+9 och 12+70 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 10.652;80 kronor före torrläggningen, 16.045;- kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 5.392;20 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 4.500:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 295:19 kronor samt för detta betänkande med bilagor 79:43 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4.874:62 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.A.).

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola bestridas av ägaren till 79/100 mtl. Österby 2².

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,90, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 46,50 procent av den för företaget beräknade kostnaden 4.874:62 kronor, eller med i avrundat tal 2.260:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 2.610:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Kostnadsförslag.

- 5.
- Bil. B. Uppgift å fastighet, vartill lån sökes.
- Bil. C. Arvodesräkning.
- Bil. D. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. E. Ritningskopia.

Nyköping i oktober 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A-B-C-D-E-F med rörledning och brobyggnader	
enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kost-	
nadsförslag	4.500:--
Kostnad för laga syneförrättningen	295:19
" " betänkandet med bilagor	79:43
<u>Summa kronor 4.874:62</u>	

Nyköping i oktober 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 4.874 kronor 62 öre.

Stockholm den 7 oktober 1933.

Albert Smith

Avskriften bekräftar sig på tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

U P P G I F T

å fastighet inom torrlägningsföretaget Österby i Råby-Rekarne socken
av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslåne-
fond.

Råby-Rekarne socken.

79/100 mtl. Österby 2² ägare: Gottfr. Magnusson.

Nyköping i oktober 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Österby i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	9:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	16:50
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	21:62
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54 ..	22:31
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna (2 ex.)	2:--
Summa kronor	<u>79:43</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Väster och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 5 oktober 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

Ö S T E R B Y

i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1932 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Österby i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län.

Den 15 september 1932.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 1 e.m. hos godsägaren Gottfr. Magnuson, Österby.

Till sammanträdet hade tillstädeskommit såsom biträdande godemän, skiftesgodemännen

O.W. Larsson, Berga, och

Gust. Nilsson, St. Hult,

samt sakägaren

Gottfr. Magnuson, ägare av 79/100 mtl. Österby 2².

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna samt av avlop-

pet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda.

De upprättade plan-profil- och sektionsritningarna företeddes vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna, och uttalade sig för, att om möjligt rörledning skulle komma till utförande i den höga skärningen genom trädgården.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrlägningsförslaget, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för den verkställda jordvärderingen m.m.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska stationen i Västerås, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning (Bil. C.)

§ 6.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jömväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 3 $\frac{1}{2}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Österby pr. Folkesta den 15 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat:

Gust. Nilsson

O.W. Larsson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr. 34 D.R. 1931.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

N y k ö p i n g.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Österby i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län.

Annan jordägare beröres icke av företaget.

Österby pr. Folkesta den 17 oktober 1931.

Gottfr. Magnuson.

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

Nr 34 D.R. 1931.

Med anledning av en från godsägaren Gottfr. Magnusson, Österby, Folkesta, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Österby i Råby-Rekarne socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas;

skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansöknings i ärendet
tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit
inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 13 november 1931.

G. Sederholm.

S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C.

Statens Kemiska station
Västerås.

A N A L Y S B E V I S Nr. 67.

Å kemiska stationen i Västerås har på anmodan av Herr Gottfr.
Magnusson, Österby gård, Folkesta, undersökts prov av Vatten, inlämnat
den 10 aug. 1932, och har samma prov befunnits hålla:

Fria syror, beräknade som kolsyra (CO ₂)		13,6	milligram	pr 100
Aggressiv kolsyra (CO ₂)		12,0	"	"
Svavelväte		0		

Västerås den 15 aug. 1932.

K. Hågwall.
föreståndare.

Analysavgift kr. 4:- Kvitteras: K. Hågwall
gm. S.Y. Lodin.

15.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurs nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	79/100 n. Österby 2 ² .								
	Gottfr. Magnusson								
1	Åker, lermysa på lera		11.0						
2	År, d. " d.		119.0						
3	Ägving								
4	Åker, d. " d.		28.0						
5	Ävloppegrar								
6	Åker, lermysa " d.		44.0						
7	Backe								
8	Åker, d. " d.		92.0						
9	År, d. " d.		79.0						
10	År, d. " d.		11.0						
11	År, d. " d.		119.0						
12	År, d. " d.		15.0						
13	År, d. " d.		37.0						
14	År, d. " d.		72.0						
15	År, d. " d.		160.0						
16	År, d. " d.		09.0						
17	Ägving								
18	Åker, d. " d.		100.0						
19	År, d. " d.		57.0						
20	År, d. " d.		86.0						
21	År, d. " d.		45.0						
22	År, d. " d.		39.0						
23	År, d. " d.		115.0						
24	Beteomark, lera, buskbevuxt						4.0		
25	Åker, lermysa på lera		57.0						
	Transport		1295.0				40.0		

längd för torrlägningsföretaget

Österby

i Rely-Rekarn socken av Södermanlands län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget erhöjd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a		Repartitionstal
					i 10/100 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor	10/100 av värdet i fullt torr- lagt skick	kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
81.									13013 -	825540	475760						
				1000	75	750	250	1.	1400 -	1050 -	350 -						
05.																	
02.																	
				1000	85	850	150	1.	800 -	680 -	120 -						
				1000	80	800	200	1.	820 -	656 -	164 -						
				300	95	285	15	1.	12 -	1140	60						
88.	17	29.							16045 -	1065280	539220						

Åkerby Kr. Tokesta den 15 sept. 1932
i häusens vägnar:
Rudin Lungeholm
Stens Lantbruksgård.

Just. Nilsson O.W. Larsson
Bittidante godemorn.

Kostnadsförslag

För överläggningsföreläget Österby i Råby-Rekarne socken av Länsmannen län, upprättat vid laga synföreläggning år 1932.
(Timmerpris 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avslappet A-B-C-D-E-F</u>						
^A 1+50	^B 1+10	60 Schaktning av sten och grus med sprängsten	80	3.50	280	-	280	-
		<u>Rörledning a Stäcken 1+10 - 3+5</u>						
^B 1+10	^C 3+5	195 Inköp av 45 cm:s (18") rör, betong 1:3, 76 cm. långa	st. 456	4.25	1088	-		
		Frakt Eskilstuna - Österby, 16 km. och 30 ton	Karton	480	0.25	120	-	
		Schaktning av sten och grus	50	3.-	150	-		
		Av " lera med sten	30	1.25	37	50		
		Av " lera	30	0.90	27	-		
		Rustbård av 4" virke (2 st 2"x4") a Stäcken 2+40 - 2+90	0.5	40.-	20	-		
		Läggning av rören och fyllning lu.	195	1.-	195	-		
		Samlingöppningar av 80 cm:s rör, betong 1:3 med ^{lock} och Cementbotten vid punkterna 2+18 och 2+92	st. 2	50.-	100	-		
		Skyddemurar av betong 1:3:5 med avvagnad klinker lida försmurningar	st. 2	50.-	100	-		
		Stambredd, betong 1:3:5 med svär försmurningar med galler			50	-	1887	50
^C 3+5	^D 3+73	68 Schaktning av grus och sten	10	3.-	30	-		
		Av " lera m. ngt sten	80	1.-	80	-		
	323	Transport			110	-	2167	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	323	Transport			110 -		2167 50	
		Slukning av lera	80	0.80	64 -		174 -	
$\begin{smallmatrix} D \\ 3+73 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} E \\ 7+80 \end{smallmatrix}$	Ar " d.	1080	0.75	810 -		810 -	
$\begin{smallmatrix} 7+80 \\ -10 \end{smallmatrix}$	220	Ar " d.	400	0.75	300 -		300 -	
		Ombyggnad av äggröbbs vid 8+9 enligt specificerat kost- nadsskild					140 -	
$\begin{smallmatrix} 10-12+50 \\ F \end{smallmatrix}$	250	Slukning av mgt saurel. lera	250	0.80	200 -			
$\begin{smallmatrix} 12+50 \\ -14+90 \end{smallmatrix}$	240	Ar " d. d. d.	200	0.80	160 -			
		Ar " lera m. mgt sten	20	1.-	20 -		380 -	
		Ombyggnad av äggröbbs vid 12+7 enligt specificerat kost- nadsskild					140 -	
		För arbetskivaren och oförut- setta utgifter tilläggas c:a 10 procent av förklarade belopp					388 50	
Summa	1323	Summa kronor					4500 -	

<u>Rekognoscering kostnadsskild</u>								
<u>För upphagaude av gamla far- loppet a Sträckan S-E.</u>								
$\begin{smallmatrix} D \\ 3+73 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} E \\ 6 \end{smallmatrix}$	227	Slukning av lera m. rust. stenar	150	1.-	150 -		
			Ar " lera	360	0.75	270 -		
$\begin{smallmatrix} E \\ 6-7+80 \end{smallmatrix}$	180	Ar " d.	360	0.75	270 -			
			Ar " sten och grus med spränghen	80	3.50	280 -		
			Bersprängning	15	12.-	180 -	1150 -	
			För arbetskivaren och oförut- setta utgifter tilläggas c:a 10 procent av förklarade belopp				115 -	
Summa	407	Summa kronor					1265 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Specifiserat Koshackförslag								
För ågsvägsbroar med 8+9-12+70								
Inköp och frakt av 45 cui:s (18") rör,								
Betong 1:3, 76 cui. långa			st. 7	475	3325			
Ruckbäll av 10 cui:s virke					7-			
Avläggning av rören			st. 7	1-	7-			
Skyltstenmurar av betong 1:3:5 med								
armering kring både rör -								
mynningarna			st. 2	40-	80-			
Rivning av gamla bron, pla-								
nering av vägbanan m.m.								
					1275			
Summa Kronor					140-			

Österby pr. Tokesta den 15 sept. 1932.
 Martin Lungehorn
 Stånds länbörskontoret

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Österby i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1,5 kilometer öster om Råby-Rekarne kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 16,41 har, varav 15,97 har åker och 0,44 har betesmark. Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F.

Å sträckan B - C, där avloppet går fram genom högre belägen mark, hörande till egendomens trädgård, har rörledning av 45 cm:s (18") betongrör föreslagits till utförande, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet dike.

Enligt av Kemiska stationen i Västerås gjord undersökning av grundvatten från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits innehålla aggressiv kolsyra med en halt av 12 milligram pr. liter. Någon särskild bestrykning eller behandling av betongrören har emellertid icke ansetts erforderlig. Rören skola dock vara utförda med en

blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressentens egen risk, då någon hjälp av statsmedel härtill icke kan påräknas.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av $1,5 \text{ km}^2$. Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km^2 eller till 150 liter pr. sekund från området i dess helhet. Vid medelvattenföring har framrinnande vattenmängden beräknats till 1/10 av flodvattenmängden.

De öppna delarna av avloppet hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,30 meter, sidolutningen 1:1,25 och med en minsta bottenlutning av 0,5:1000. De framrinnande vattenmängderna komma härigenom att avbördas vid ett vattendjup, som beräknas icke överstiga 0,58 meter vid flöden och 0,20 meter vid medelvattenföring.

Dimensionen å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 44.

Vid rörledningens båda ändar skola anordnas skyddsmurar av armerad betong, varjämte skall anordnas en slambrunn av betong, storlek $1,0 \times 1,0$ meter vid övre rörmynningen samt två samlingsbrunnar av 80

24.
om:s betongrör vid punkterna 2+18 och 2+92. Samlingsbrunnarna skola vara försedda med lock och cementbotten samt vara omgivna med ett minst 0,5 meter tjockt lager av grovt grus och singel, varjämte brunnarna skola fördes med hål för dagvattnets insläppande. Vid brunnarna får däremot s.k. vattenlås icke anordnas genom sänkning av de närmast desamma belägna rören, och må täckdikessystem anknytas till rörledningen endast genom intag i brunnarna.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med torrlägningsarbetets utförande skola två ågovägsbroar vid punkterna 8+9 och 12+70 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskat-

tade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har höjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet samt markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 10.652:80 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 16.045:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.392:20 kronor.


Kostnadsberäkning och ekonomisk utredning.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnader till 4.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tilläyn och oförutsedda utgifter.

För avloppet D - E hava därjämte i kostnadsförslaget alternativa

Torrlägningsföretaget Österby.
i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län.

26.

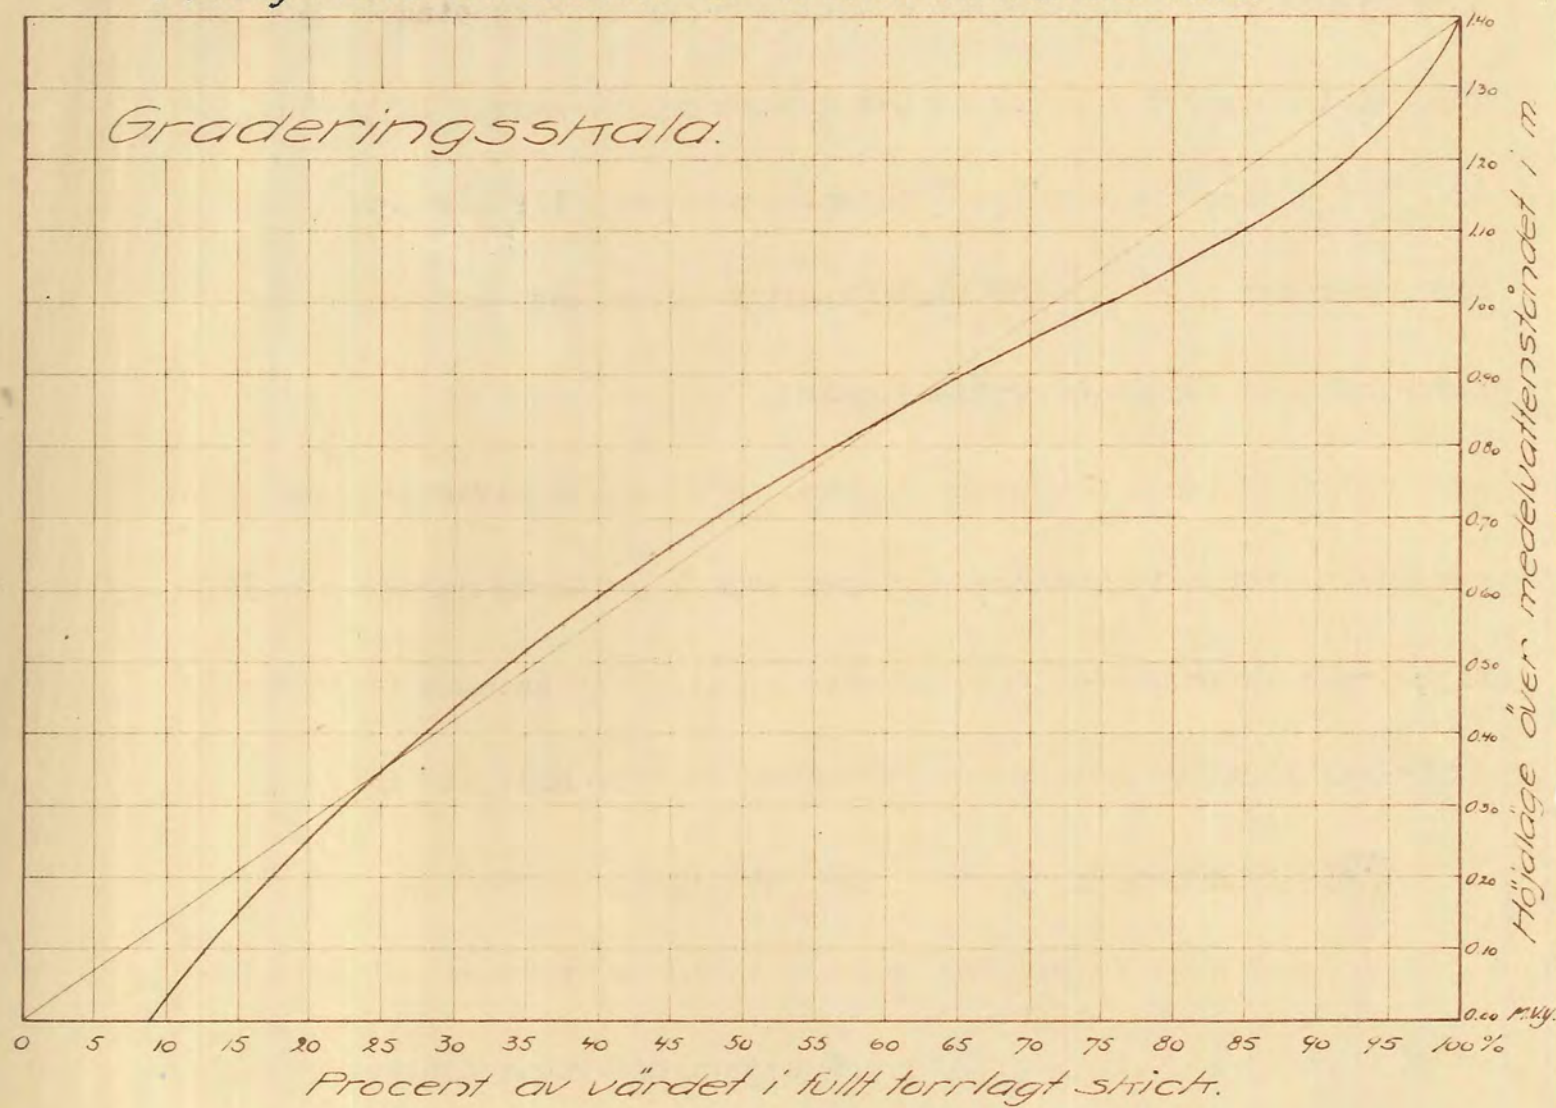

beräkningar verkställes för att i stället för den föreslagna rätningen upptaga det gamla avloppet därstädes. Beräkningarna hava emellertid givit vid handen, att avloppet med rätningen ställer sig 375:- kronor billigare än att följa det gamla avloppet, varför rätningen ansetts böra komma till utförande.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola utan särskild jämkning bestridas av ägaren till 79/100 mtl. Österby 2².

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande med rätning å sträckan D - E i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare fyra år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord-eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla

tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och och välgjutna rör få användas, att rören å sträckan 2+40 - 2+90 skola läggas på rustbädd av 2" virke, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, samt att vid återfyllning kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av 1,0 meter över desamma.

Å sträckan D-E, där jordmånen är av relativt lös beskaffenhet, bör avloppet för undvikande av eljest möjligen uppkommande ras och förskjutningar upptagas i två omgångar, och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar, så länge någons rätt kan vara därav beroende. Till rörledningen hörande slam- och samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst två gånger om året, det öppna avloppet skall gräskäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11

kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, åger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Österby i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län."

Österby pr. Folkesta den 15 september 1932.

A tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Gust. Nilson

O. W. Larsson

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 13
1931	13/16	Avvägning:				
	10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	1641	0,50	821	
		avvägda punkter	162	0,03	486	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,40	2,00	4,80	
		i annan mark	0,35	5,00	1,65	43 52
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 56 ar,	31	0,07	2 17	
			1729	0,06	104	3 21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minsta arvode		0,04	1,50	1 50
1931	12/11	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	14	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	25	0,12	3 -	13 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,29	3,-	87	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,49	3,50	522	609
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			3	0,22	66	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,25	7 -	766
			1	3,00	3 -	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1,5	0,02	03	
		dagrar		12,00		203
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,535	3,50	537	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,535	1,00	153	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 minsta arvode	1	10,00	10 -	1690
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	33	0,03	99	199
		Överföres				132 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				132 03
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0,29 2,50	72	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"	1,44	576	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			577	12 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	st. 2	3,-	6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	" 1	3,-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		9 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	162	0,01	162	162
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		— —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
1932	15/9	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	12/4	12,00	9 —	9 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
1932	29/8	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	" 1/2	12,00	6 —	6 —
		Lösen för:	Summa kronor			194 90
		Kopia av plankartan, § 51				10 50
		1 a) 1:sta regalarcket				
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 56 ar ägofigurer	st.	31 0,10	3 10	
			har	1729 0,08	138	
		Överföres			448	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 48	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 12	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 162	0,02	3 24	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	12 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0 29 5:-	1 45	
		ändring av befintligt avlopp	”	1 44 6:-	8 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 66	
		3) broar och trummor, ” ”			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		23 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar	12,00		
		” ”	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
		Summa kronor				69 69
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	24		2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				30 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				194 90
		Lösen för kopior och avskrifter				69 69
		Övriga förrättningskostnader				30 60
		Summa kronor				295 19

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Päster och Oskar Pettersson häradsrätt.

Oskarby fr. församling den 15 september 1932

Anders Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gust. Nilsson

O. W. Larsson

Kronor kvitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1 - 33, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 15 september 1932 avslutad syneförrättning, avseende "torrlägningsföretaget Österby i Råby - Rekarne socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 28 januari 1933.

Ex officio:

G. Hägglund

Stämpel: En krona 75 öre. Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

27
10

U P P G I F T

å fastighet inom torrlägningsföretaget Österby i Råby-Rekarne socken
av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslåne-
fond.

Råby-Rekarne socken.

79/100 mtl. Österby 2² ägare: Gottfr. Magnusson.

Nyköping i oktober 1932.

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

1933 den 8 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrilläggningsföretaget Österby" i Råby-Rekarne socken av Södermanlands län.

Lån 2.610 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Råby-Rekarne socken.</u>			
Österby	79/100	² 2	Gottfrid Magnussen

Stockholm den 8 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

289/32
Godkänt den 11 september 1935

Avskrift.

DIARIE NR 18285

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1935

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 februari 1935.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Österby i Råby - Rekarne socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 Oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.260;- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 2.610;- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 december 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ende intressent: Godsägaren Gottfr. Magnuson, Österby, Folkesta

Avsyningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 13 augusti 1935. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Österby i Råby -
Rekarne socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.260:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.610:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ende intressent: Godsägaren Gottfr. Magnusson, Österby,
Folkesta.



Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 3 juli
1933. Därvid hade sträckan A - B - C - D - E - 8⁺⁹ utförts. Enligt
det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbe-
tet beräknats motsvara 3.500:-

var till kommer:

förrättningskostnader o.d. 374:62

Summa kronor 3.874:62

utgörande omkring 80 procent av den vid arbetsplanens fastställan-
de beräknade kostnaden för företaget 4.874:62 kronor.

Nyköping den 28 november 1933.

Ä tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör
