


godk:

30/49

FÖRETAG: D 2\*0428



Arbetsplan upprättad av lantbrukskonsulenten  
~~lantbruksingenjören~~ Yngve Omberg  
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.  
Bidrag beviljat den 16 maj 1949

till företagets utförande ..... kr. 2.230✓  
» en första rensning ..... » - kr. 2.230✓

9/49

## KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till  
Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken,  
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusentvåhundra trettio  
(2.230) kronor, varav till företagets  
utförande kronor och till  
~~en första rensning av avloppen~~  
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan  
företagets ~~delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter~~  
~~båda intressenter~~ ende intressent.

### § 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,  
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats  
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-  
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar  
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i  
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller  
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den  
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

### § 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den  
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-  
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

### § 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

### § 4.


Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

### § 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återhäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

.....Tystberga..... den 9 augusti 1949.....



Att civiling. Stig Bredberg, Norrby säteri, Tystberga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

M. Eriksson  
Tystberga

Adress

David Eriksson  
Tystberga

**Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.**

Stockholm den 2 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser *EXIII b*  
776

28564

CH. RIE Nr  
K. LANTBRUKSTYRELSSEN  
24 NOV 1947

D \_\_\_\_\_ 2\*0428

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

*Ser 16  
349 kio*

H A N D L I N G A R

rörande dikningsföretaget

N O R R B Y Å R 1 9 4 7

i Bogsta socken, Södermanlands län  
upprättat vid laga syneförrättning  
år 1947 av

YNGVE OMBERG

Hush.sällskapets jordbrukskonsulent.

Svärtaåns nederbördsområde nr 64

H A N D L I N G A R

rörande dikningsföretaget

N O R R B Y Å R 1 9 4 7

i Bogsta socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1947 av

YNGVE OMBERG

Hush.sällskapets

jordbrukskonsulent.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Norrby 2<sup>1</sup> i Bogsta socken, Södermanlands län.

Den 29 augusti 1947.

Sedan undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, blivit på därom gjord ansökan (Bil.A) av torrläggningsnämnden i länet föreslagen (Bil.B) och av Länsstyrelsen i länet förordnad (Bil.C) att handlägga denna syneförrättning, hade genom brev (Bil.D) till sakägaren sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag kl. 11,00 å Norrby säteri, Tystberga.

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent och ende sakägaren Civilingenjör Stig Bredberg, ägare till Norrby 2<sup>1</sup>.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna verkstälts genom förrättningsmannens försorg.

§ 3.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm, och delgavs resultatet av denna undersökning (Bil.E).

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade att erforderligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av <sup>hans</sup> sina i företaget ingående marker till fullständiga<sup>t</sup> djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. Den sökande yrkade vidare att avloppen helst<sup>2</sup> borde igenläggas med rör.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom de härför beräknade kostnaderna.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från Statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenten önska komma i åtnjutande av endast bidrag. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 7.

Beslöts att <sup>rörarna</sup> akterna för företaget skulle förvaras vid Norrby säteri, Tystberga.

§ 8.

Förrättningsmannens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress, Stockholm.


§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade

förrättningsmannen att arvodesräkning senare skulle tillställas  
Civilingenjör Stig Bredberg, varefter förrättningen förklarades av-  
slutad.

Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar

  
Jordbrukskonsulent.

NORRBY SÄTERI  
TYSTBERGA

RIKSTELEFON:

Gårdskontoret: Svärdsbro 10 a

Privat: » 10 b

POSTGIRO 10817

*Prilaga A*  
Torrläggningsnämnden i Södermanlands län

Ink. d. 15/4 1946 Nr. 22

Behandl. i prot. d. 15/8 1946 § 6

Besv. d. 31/8 1946 Nr. 34

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande tjänsteman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande fastigheten Norrby 2<sup>1</sup> i Bogsta socken av Södermanlands län.

Företaget omfattar en areal av c:a 17 ha åker. Täckdikoplaner över en del av det berörda området hava tidigare upprättats av Hushållningssällskapet / T 68/1938-90, T 74/1945-90 / och ytterligare planer önskas på återstående omkringliggande mark. Företaget synes komma att beröra Ökna säteri i Bogsta socken.

Tystberga den 7 april 1946

*L. Bredberg*

38 47 - J.R. 1946  
4

Bilaga B

28.11.1946  
Södermanlands län  
Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Stig Bredbergs, Norrby säteri, Tystberga, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

./. Ansökan bifogas. Nyköping den 21 augusti 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

*Ronny Wänner*



LÄNSTYRELSEN  
SÖDERMANSKAS LÄN

N:o 47/4 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

På därom av Stig Bredberg, Norrby Säteri, Tystberga, gjord, av torrlägningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för vederbörande tjänsteman att enligt gällande vattenlag hålla syneför-<sup>1</sup> rättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Norrby 2 i Bogsta socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolan- de detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillstäl- las nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i länskansliet den 3 september 1946.

*[Signature]*  
(S. Ljungstedt.)

På Länsstyrelsens vägnar

*[Signature]*  
(B. Löfström.)

Utan avgift.


Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Herr Civilingenjör Stig Bredberg,

Norrby säteri, TYSTBERGA.

Sedan undertecknad blivit av Länsstyrelsen förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Norrby i Bogsta socken, Södermanlands län, får jag meddela att sammanträde kommer att hållas å Norrby säteri, fredagen den 29 augusti 1947 klockan 11 f.m., då Ni har att tillstädeskomma för utförande av Eder talan. Nyköping den 8 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar

  
Jordbrukskonsulent.

Bilaga E.  
9. SEP. 1947

# STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 36/1947-48

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av  
Södermanlands läns Hushållningssällskap, Nyköping,

undersökts prov av v a t t e n

ink. den 1/9 på 2 st 400 ml vichyfl.


avser prov från Norrby dikningsföretag i Bogsta skn.

Undersökningen har givit följande resultat

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Temporär hårdhet .....      | 2,0 tyska grader       |
| Aggressiv kolsyra .....     | 42 milligram per liter |
| Sulfat, $\text{SO}_3$ ..... | 14 " " "               |

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är stor.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 8 september 1947.



Föreståndare

Hugo Sebelius



1:ste kemist  
Nils Bengtsson


Avgift: 13:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 6:50.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge      | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                                         | Antal | å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|           |             |                                                               |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
| 1 2÷17 -  |             | <u>Avloppet A-B.</u>                                          |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 2 -5÷30   | 313         | Schaktning av lera lm                                         | 80✓   | 1:50   | 120     | -✓  |         |     |        |     |
| 3         |             | " " sand "                                                    | 204✓  | 1:50   | 306     | -✓  |         |     |        |     |
| 4         |             | " " mulljord "                                                | 29✓   | 1:50   | 43      | 50  |         |     |        |     |
| 5         |             | Inköp av 300 mm centrifugerade betongrör (1 m långa) st       | 313✓  | 5:50   | 1721    | 50  |         |     |        |     |
| 6         |             | Inköp av 60 cm centrifugerade betongrör (1 m långa, brunn) st | 4     | 15:-   | 60      | -✓  |         |     |        |     |
| 7         |             | Inköp av 60 cm brunnslock                                     | 2     | 8:50   | 17      | -✓  |         |     |        |     |
| 8         |             | Läggning och igenfylln. lm                                    | 313✓  | 1:50   | 469     | 50  |         |     |        |     |
| 9         |             | Arbete med brunnar st                                         | 2     | 30:-   | 60      | -✓  | 2797    | 50  |        |     |
| 10        |             | Arbetsledning och oförut-                                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 11        |             | sedda utgifter c:a 10 % av                                    |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 12        |             | förestående belopp                                            |       |        |         |     | 272     | 50  | 3070   | -✓  |
| 13        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 14        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 15 5÷30 - |             | <u>Avloppet B-C</u>                                           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 16 -6÷4   | 74          | Schaktning av mulljord lm                                     | 74    | 1:-    | 74      | -✓  |         |     |        |     |
| 17        |             | Inköp av 300 mm centrifugerade betongrör (1 m långa)          | 74    | 5:50   | 407     | -✓  |         |     |        |     |
| 18        |             | Inköp av 60 cm centrifugerade betongrör (1 m långa, brunn)    | 1     | 15:-   | 15      | -✓  |         |     |        |     |
| 19        |             | Inköp av 60 cm brunnslock                                     | 1     | 8:50   | 8       | 50  |         |     |        |     |
| 20        |             | Läggning och igenfylln. lm                                    | 74    | 1:-    | 74      | -✓  |         |     |        |     |
| 21        |             | Arbete med brunn st                                           | 1     | 30:-   | 30      | -✓  | 608     | 50  |        |     |
| 22        |             | Arbetsledning och oförut-                                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 23        |             | sedda utgifter c:a 10 % av                                    |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 24        |             | förestående belopp                                            |       |        |         |     | 61      | 50  | 670    | -✓  |
| 25        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 26        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 27 6÷4 -  |             | <u>Avloppet C-D</u>                                           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 28 -6÷52  | 48          | Schaktning av mulljord lm                                     | 48    | 1:-    | 48      | -✓  |         |     |        |     |
| 29        |             | Inköp av 300 mm centrifugerade betongrör (1 m långa) st       | 48    | 5:50   | 264     | -✓  |         |     |        |     |
| 30        |             | Inköp av 60 cm centrifugerade betongrör (1 m långa, brunn)    | 2     | 15:-   | 30      | -✓  |         |     |        |     |
| 31        |             | Inköp av 60 cm brunnslock st                                  | 1     | 8:50   | 8       | 50  |         |     |        |     |
| 32        |             | Läggning och igenfylln. lm                                    | 48    | 1:-    | 48      | -✓  |         |     |        |     |
| 33        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 34        |             |                                                               |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 35        | 435         | Transport                                                     |       |        | 398     | 50✓ |         |     | 3740   | -✓  |

| Läge   | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.           | Antal | å-pris            | Kostnad |                 | Kostnad |                 | Summa  |                |    |
|--------|-------------|---------------------------------|-------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|----------------|----|
|        |             |                                 |       |                   | kronor  | öre             | kronor  | öre             | kronor | öre            |    |
|        | 435         | Transport                       |       |                   | 398     | 50 <sup>✓</sup> |         |                 | 3740   | - <sup>✓</sup> | 1  |
|        |             | Arbete med brunn st             | 1     | 30:-              | 30      | - <sup>✓</sup>  | 428     | 50 <sup>✓</sup> |        |                | 2  |
|        |             | Arbetsledning och oförut-       |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 3  |
|        |             | sedda utgifter c:a 10 % av      |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 4  |
|        |             | förestående belopp              |       |                   |         |                 | 41      | 50 <sup>✓</sup> | 470    | - <sup>✓</sup> | 5  |
| 6+52 - |             | <u>Avloppet D-E</u>             |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 6  |
| -6+83  | 31          | Schaktning av mulljord lm       | 31    | 1:-               | 31      | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 7  |
|        |             | Inköp av 225 mm centrifugerade  |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 8  |
|        |             | betongrör(1 m långa) st         | 31    | 3:60 <sup>✓</sup> | 111     | 60 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 9  |
|        |             | Inköp av 45 cm centrifugera-    |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 10 |
|        |             | de betongrör (1mlånga,brunn) st | 1     | 10:50             | 10      | 50 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 11 |
|        |             | Inköp av 45 cm brunnslock       | 1     | 5:20              | 5       | 20 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 12 |
|        |             | Läggning och igenfylln. lm      | 31    | 1:-               | 31      | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 13 |
|        |             | Arbete med brunn st             | 1     | 25:-              | 25      | - <sup>✓</sup>  | 214     | 30 <sup>✓</sup> |        |                | 14 |
|        |             | Arbetsledning och oförut-       |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 15 |
|        |             | sedda utgifter c:a 10 % av      |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 16 |
|        |             | förestående belopp              |       |                   |         |                 | 25      | 70 <sup>✓</sup> | 240    | - <sup>✓</sup> | 17 |
| 6+83 - |             | <u>Avloppet E-F.</u>            |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 18 |
| -8+44  | 161         | Schaktning av mulljord lm       | 161   | 1:-               | 161     | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 19 |
|        |             | Inköp av 200 mm tegelrör st     | 50    | 776:-<br>/1000st  | 38      | 80 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 20 |
|        |             | " " 225 "centrifugera-          |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 21 |
|        |             | de betongrör(1 m långa)         | 148   | 3:60              | 532     | 80 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 22 |
|        |             | Inköp av 45 cm centrifugera-    |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 23 |
|        |             | de betongrör(1 mlånga,brunn)    | 1     | 10:50             | 10      | 50 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 24 |
|        |             | Inköp av 45 cm brunnslock       | 1     | 5:20              | 5       | 20 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 25 |
|        |             | Läggning och igenfylln. lm      | 161   | 1:-               | 161     | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 26 |
|        |             | Arbete med brunn st             | 1     | 25:-              | 25      | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 27 |
|        |             | Grus m <sup>3</sup>             | 0,5   | 10:-              | 5       | - <sup>✓</sup>  | 939     | 30 <sup>✓</sup> |        |                | 28 |
|        |             | Arbetsledning och oförut-       |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 29 |
|        |             | sedda utgifter c:a 10 % av      |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 30 |
|        |             | förestående belopp              |       |                   |         |                 | 90      | 70 <sup>✓</sup> | 1030   | - <sup>✓</sup> | 31 |
| 8+44 - |             | <u>Avloppet F-G</u>             |       |                   |         |                 |         |                 |        |                | 32 |
| -9+0   | 56          | Schaktning av mulljord lm       | 56    | 1:-               | 56      | - <sup>✓</sup>  |         |                 |        |                | 33 |
|        |             | Inköp av 150 mm tegelrör st     | 195   | 523:-<br>/1000st  | 101     | 99 <sup>✓</sup> |         |                 |        |                | 34 |
|        | 683         | Transport                       |       |                   | 157     | 99 <sup>✓</sup> |         |                 | 5480   | - <sup>✓</sup> | 35 |

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                                                                | Antal | å-pris          | Kostnad |      | Kostnad |      | Summa  |     |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|------|---------|------|--------|-----|
|      |             |                                                                                      |       |                 | kronor  | öre  | kronor  | öre  | kronor | öre |
| 1    | 683         | Transport                                                                            |       |                 | 157     | 99 ✓ |         |      | 5480   | - ✓ |
| 2    |             | Inköp av 150 mm centrifuge-                                                          |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 3    |             | rade betongrör (brunnskoppl.) st                                                     | 2     | 1:75            | 3       | 50 ✓ |         |      |        |     |
| 4    |             | Inköp av 37,5 cm centrifugerade                                                      |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 5    |             | betongrör (1 m långa, brunn) st                                                      | 2     | 8:-             | 16      | - ✓  |         |      |        |     |
| 6    |             | Inköp av 37,5 cm brunnslock                                                          | 1     | 4:-             | 4       | - ✓  |         |      |        |     |
| 7    |             | Läggning och igenfylln. lm                                                           | 56    | 1:-             | 56      | - ✓  |         |      |        |     |
| 8    |             | Arbete med brunn st                                                                  | 1     | 25:-            | 25      | - ✓  |         |      |        |     |
| 9    |             | Grus m <sup>3</sup>                                                                  | 0,5   | 10:-            | 5       | - ✓  | 267     | 49 ✓ |        |     |
| 10   |             | Arbetsledning och oförut-                                                            |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 11   |             | sedda utgifter c:a 10 % av                                                           |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 12   |             | förestående belopp                                                                   |       |                 |         |      | 22      | 51 ✓ | 290    | - ✓ |
| 13   | 10+0 -      | Avloppet F-H.                                                                        |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 14   | -11+12      | Schaktning av sand lm                                                                | 112   | 1:50            | 168     | - ✓  |         |      |        |     |
| 15   |             | Inköp av 200 mm tegelrör st                                                          | 390   | 776:- / 1000 st | 302     | 64 ✓ |         |      |        |     |
| 16   |             | " " 225 " centrifugerade                                                             |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 17   |             | betongrör (brunnskoppl.) st                                                          | 2     | 3:60            | 7       | 20 ✓ |         |      |        |     |
| 18   |             | Inköp av 45 cm centrifuge-                                                           |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 19   |             | rade betongrör (1 m långa, brunn) st                                                 | 2     | 10:50           | 21      | - ✓  |         |      |        |     |
| 20   |             | Inköp av 45 cm brunnslock                                                            | 1     | 5:20            | 5       | 20 ✓ |         |      |        |     |
| 21   |             | Läggning och igenfylln. lm                                                           | 112   | 1:-             | 112     | - ✓  |         |      |        |     |
| 22   |             | Arbete med brunn st                                                                  | 1     | 25:-            | 25      | - ✓  |         |      |        |     |
| 23   |             | Grus m <sup>3</sup>                                                                  | 1     | 10:-            | 10      | - ✓  | 651     | 04 ✓ |        |     |
| 24   |             | Arbetsledning och oförut-                                                            |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 25   |             | sedda utgifter c:a 10 % av                                                           |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 26   |             | förestående belopp                                                                   |       |                 |         |      | 68      | 96 ✓ | 720    | - ✓ |
| 27   | 795         | Summa                                                                                |       |                 |         |      |         |      | 6490   | ✓   |
| 28   |             |                                                                                      |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 29   |             | Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.                                             |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 30   |             | Å tjänstens vägnar                                                                   |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 31   |             |  |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 32   |             | Jordbrukskonsulent.                                                                  |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 33   |             |                                                                                      |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 34   |             |                                                                                      |       |                 |         |      |         |      |        |     |
| 35   |             |                                                                                      |       |                 |         |      |         |      |        |     |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                       | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|------|
|                                                                                                                             |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur | öre  |
|                                                                                                                             |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          |      |
| 1                                                                                                                           | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |      |
| Bogsta socken<br>4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> mtl. Norrby 2 <sup>1</sup><br>Stig Bredberg.<br>Åker,mullrik svagt lerg sand | 1                        | 0                  | 60 |               |    | 1.144                   | 1.300         | 156           | 93              | 60 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 2                        | 0                  | 21 |               |    | 689                     | 1.300         | 611           | 128             | 31 ✓ |
| " ,måttligt mullhaltigsand                                                                                                  | 3                        | 0                  | 01 |               |    | 960                     | 1.200         | 240           | 2               | 40 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 4                        | 0                  | 20 |               |    | 702                     | 1.200         | 498           | 99              | 60 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 5                        | 0                  | 19 |               |    | 564                     | 1.200         | 636           | 120             | 84 ✓ |
| " ,sandig mulljord                                                                                                          | 6                        | 0                  | 14 |               |    | 624                     | 1.300         | 676           | 94              | 64 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 7                        | 0                  | 49 |               |    | 676                     | 1.300         | 624           | 305             | 76 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 8                        | 0                  | 15 |               |    | 442                     | 1.300         | 858           | 128             | 70 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 9                        | 0                  | 40 |               |    | 442                     | 1.300         | 858           | 343             | 20 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 10                       | 0                  | 53 |               |    | 572                     | 1.300         | 728           | 385             | 84 ✓ |
| " ,mullrik svagtlerig sand                                                                                                  | 11                       | 0                  | 32 |               |    | 1.144                   | 1.300         | 156           | 49              | 92 ✓ |
| " ,sandig mulljord                                                                                                          | 12                       | 0                  | 35 |               |    | 1.144                   | 1.300         | 156           | 54              | 60 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 13                       | 0                  | 58 |               |    | 468                     | 1.300         | 832           | 482             | 56 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 14                       | 0                  | 01 |               |    | 559                     | 1.300         | 741           | 7               | 41 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 15                       | 0                  | 08 |               |    | 663                     | 1.300         | 637           | 50              | 96 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 16                       | 0                  | 18 |               |    | 975                     | 1.300         | 325           | 58              | 50 ✓ |
| " , " " "                                                                                                                   | 17                       | 0                  | 03 |               |    | 910                     | 1.300         | 390           | 11              | 70 ✓ |
| " ,måttligt mullhaltig sand                                                                                                 | 18                       | 0                  | 12 |               |    | 1.008                   | 1.200         | 192           | 23              | 04 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 19                       | 0                  | 05 |               |    | 1.188                   | 1.200         | 12            | 0               | 60 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 20                       | 0                  | 14 |               |    | 984                     | 1.200         | 216           | 30              | 24 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 21                       | 0                  | 45 |               |    | 204                     | 1.200         | 996           | 448             | 20 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 22                       | 0                  | 02 |               |    | 1.140                   | 1.200         | 60            | 1               | 20 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 23                       | 0                  | 30 |               |    | 480                     | 1.200         | 720           | 216             | - ✓  |
| " , " " " "                                                                                                                 | 24                       | 0                  | 10 |               |    | 924                     | 1.200         | 276           | 27              | 60 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 25                       | 0                  | 34 |               |    | 324                     | 1.200         | 876           | 297             | 84 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 26                       | 0                  | 66 |               |    | 492                     | 1.200         | 708           | 467             | 28 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 27                       | 0                  | 44 |               |    | 960                     | 1.200         | 240           | 105             | 60 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 28                       | 0                  | 06 |               |    | 1.176                   | 1.200         | 24            | 1               | 44 ✓ |
| " , " " " "                                                                                                                 | 29                       | 0                  | 09 |               |    | 900                     | 1.200         | 300           | 27              | - ✓  |
| Transport                                                                                                                   |                          | 7                  | 24 |               |    |                         |               |               | 4.064           | 58 ✓ |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                 | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |                       |    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|----|
|                                                       |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |                       |    |
|                                                       |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre                   |    |
| 1                                                     | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |                       |    |
| Transport                                             |                          | 7                  | 24 |               |    |                         |               |               | 4.064           | 58 <sup>v</sup>       | 1  |
| Åker, måttligt mulhaltig sand                         | 30                       | 0                  | 24 |               |    | 1.020                   | 1.200         | 180           | 43              | 20 <sup>v</sup>       | 2  |
| " " " "                                               | 31                       | 0                  | 03 |               |    | 1.176                   | 1.200         | 24            | 0               | 72 <sup>v</sup>       | 3  |
| Summa                                                 | 1-31                     | 7                  | 51 |               |    |                         |               |               | 4.108           | 50 <sup>v</sup>       | 4  |
| Härtill kommer brukningsbåtnad för 795 m. avloppsdike |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 5  |
| uppskattad till kr 5:- pr m.                          |                          |                    |    |               |    |                         |               |               | 3.975           | - <sup>v</sup>        | 6  |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               | Summa Kronor    | 8.083 50 <sup>v</sup> | 7  |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 8  |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 9  |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 10 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 11 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 12 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 13 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 14 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 15 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 16 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 17 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 18 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 19 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 20 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 21 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 22 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 23 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 24 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 25 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 26 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 27 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 28 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 29 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 30 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 31 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 32 |
|                                                       |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |                       | 33 |

Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar

*[Signature]*

jordbrukskonsulent

Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.  
Å tjänstens vägnar  
*[Signature]*  
jordbrukskonsulent


ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående dikningsföretaget Norrby i  
Bogsta socken, Södermanlands län, upprättat enligt § 1 av  
Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Plankostnad                          | 198:11 <sup>✓</sup>       |
| Grundvattenanalys                    | 6:50 <sup>✓</sup>         |
| Inbindning av förrättningshandlingar | 5:- <sup>✓</sup>          |
| Arbetskopior                         | <u>5:-<sup>✓</sup></u>    |
| Summa Kronor                         | <u>214:61<sup>✓</sup></u> |

Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar

  
Jordbrukskonsulent.

683  
112  
795

## U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Norrby 2<sup>1</sup> i Bogsta socken, Södermanlands län.

### Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdet är beläget inom Svärtaåns nederbördsområde nr 64 omkring 2 km nordost om Bogsta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 7,51 ha åker.

Jordarten utgöres å den högre belägna marken inom begränsningskurvan av måttligt mullhaltig sand på botten av mellanlera; å den lägre belägna marken utgöres jordarten av mullhaltig - mullrik svagt lerig sand på botten av styv lera. Jordarten är av mycket god beskaffenhet.

### Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F-G och F-H.

### Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 28 ha. Detsamma utgöres till omkring  $\frac{1}{2}$  av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och till 1,5 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,2 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställts enligt i följande tabell angivna data.


| Nederbörds-    Avrinning    Bottenlutning    Rördim.    Avbördnings- |        |         |       |         |                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|-----------------|
| Läge                                                                 | område | lit/sek | o/oo  | mm      | förmåga lit/sek |
| 9+0                                                                  | 6      | 11 ✓    | 6 ✓   | 150 6"  | 13 ↓            |
| 11+12                                                                | 13     | 15 ✓    | 2 ✓   | 200 8"  | 15 ↓            |
| 8+44                                                                 | 20,5   | 25 ✓    | 6 ✓   | 200 8"  | 25 ↓            |
| 8+30                                                                 | 20,5   | 25 ✓    | 2,5 ✓ | 225 9"  | 23 ↓            |
| 6+52                                                                 | 24,5   | 30 ✓    | 1 ✓   | 300 12" | 30 ✓            |
| 5+30                                                                 | 27,5   | 34 ✓    | 1 ✓   | 300 12" | 30 ✓            |
| 3+30                                                                 | 27,5   | 34 ✓    | 2,7 ✓ | 300 12" | 50 ↓            |

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 42 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 2,0 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har stor angreppsförmåga å betong, har centrifugerade betongrör föreslagits komma till användning.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

#### Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytt-  
avvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst  
en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande  
medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre av-  
stånd därifrån.

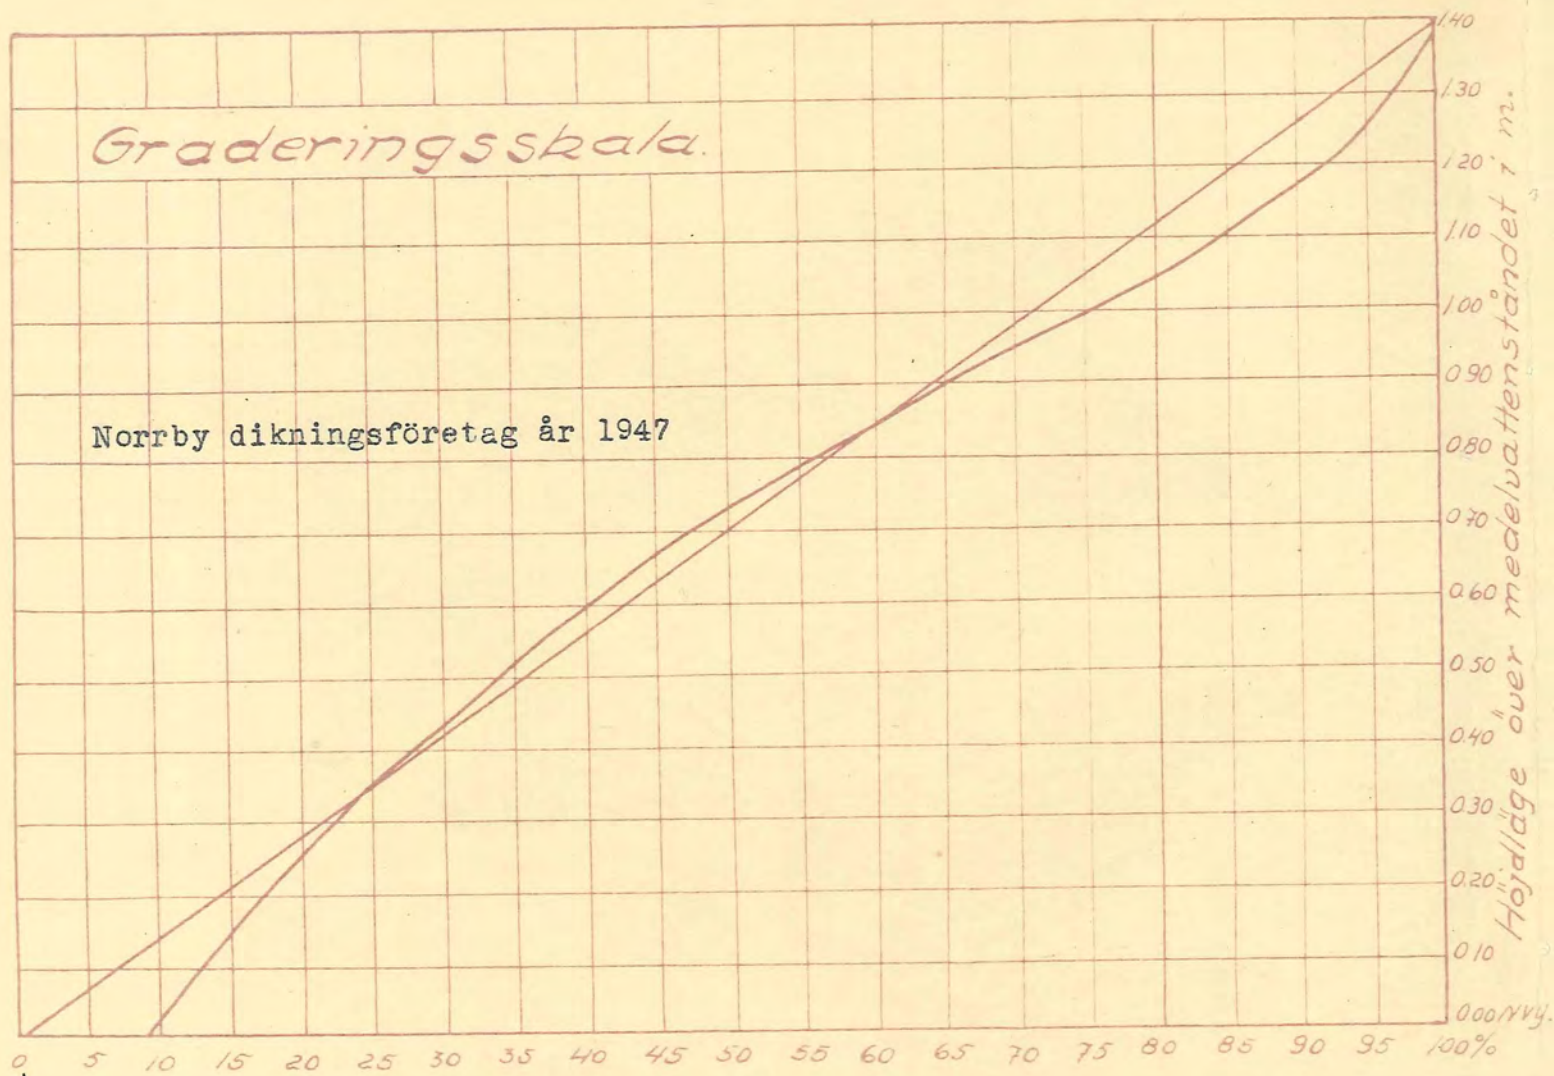

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplan upprättats över ell åkerjord tillhörig de i företaget ingående markerna.

De i företaget ingående markerna ha värderats av förrättningsmannen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att ~~kunna~~ bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 795 meter avlopp, vilket helt igenlägges. Kapitaliserat efter 5:00 kronor pr meter avlopp ger detta ett värde av 3975:- kronor.

Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör 8083:50 kronor.

#### Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 6490:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

#### Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

#### Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1953.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,  
att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,  
att endast hela och fullgoda rör få användas,  
att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsätts efter avvägning med utgång från fixpunkt,  
att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,  
att återfyllning sker till markytan samt  
att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

#### Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

#### Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp.+28,49 kors i sten 40 m <sup>nordost</sup> ~~norr~~ om punkt 1+37.
2. Fixp.+29,63 kors i sten 100 m <sup>Sydväst</sup> ~~väster~~ om punkt 7+47.

#### Besiktning och avsyning.

Besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig jordbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

#### Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet

skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift enligt i vattenlagen 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:-kronor.

Besvärshänvisning.


Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands län.

Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.

Å tjänstens vägnar

  
Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.

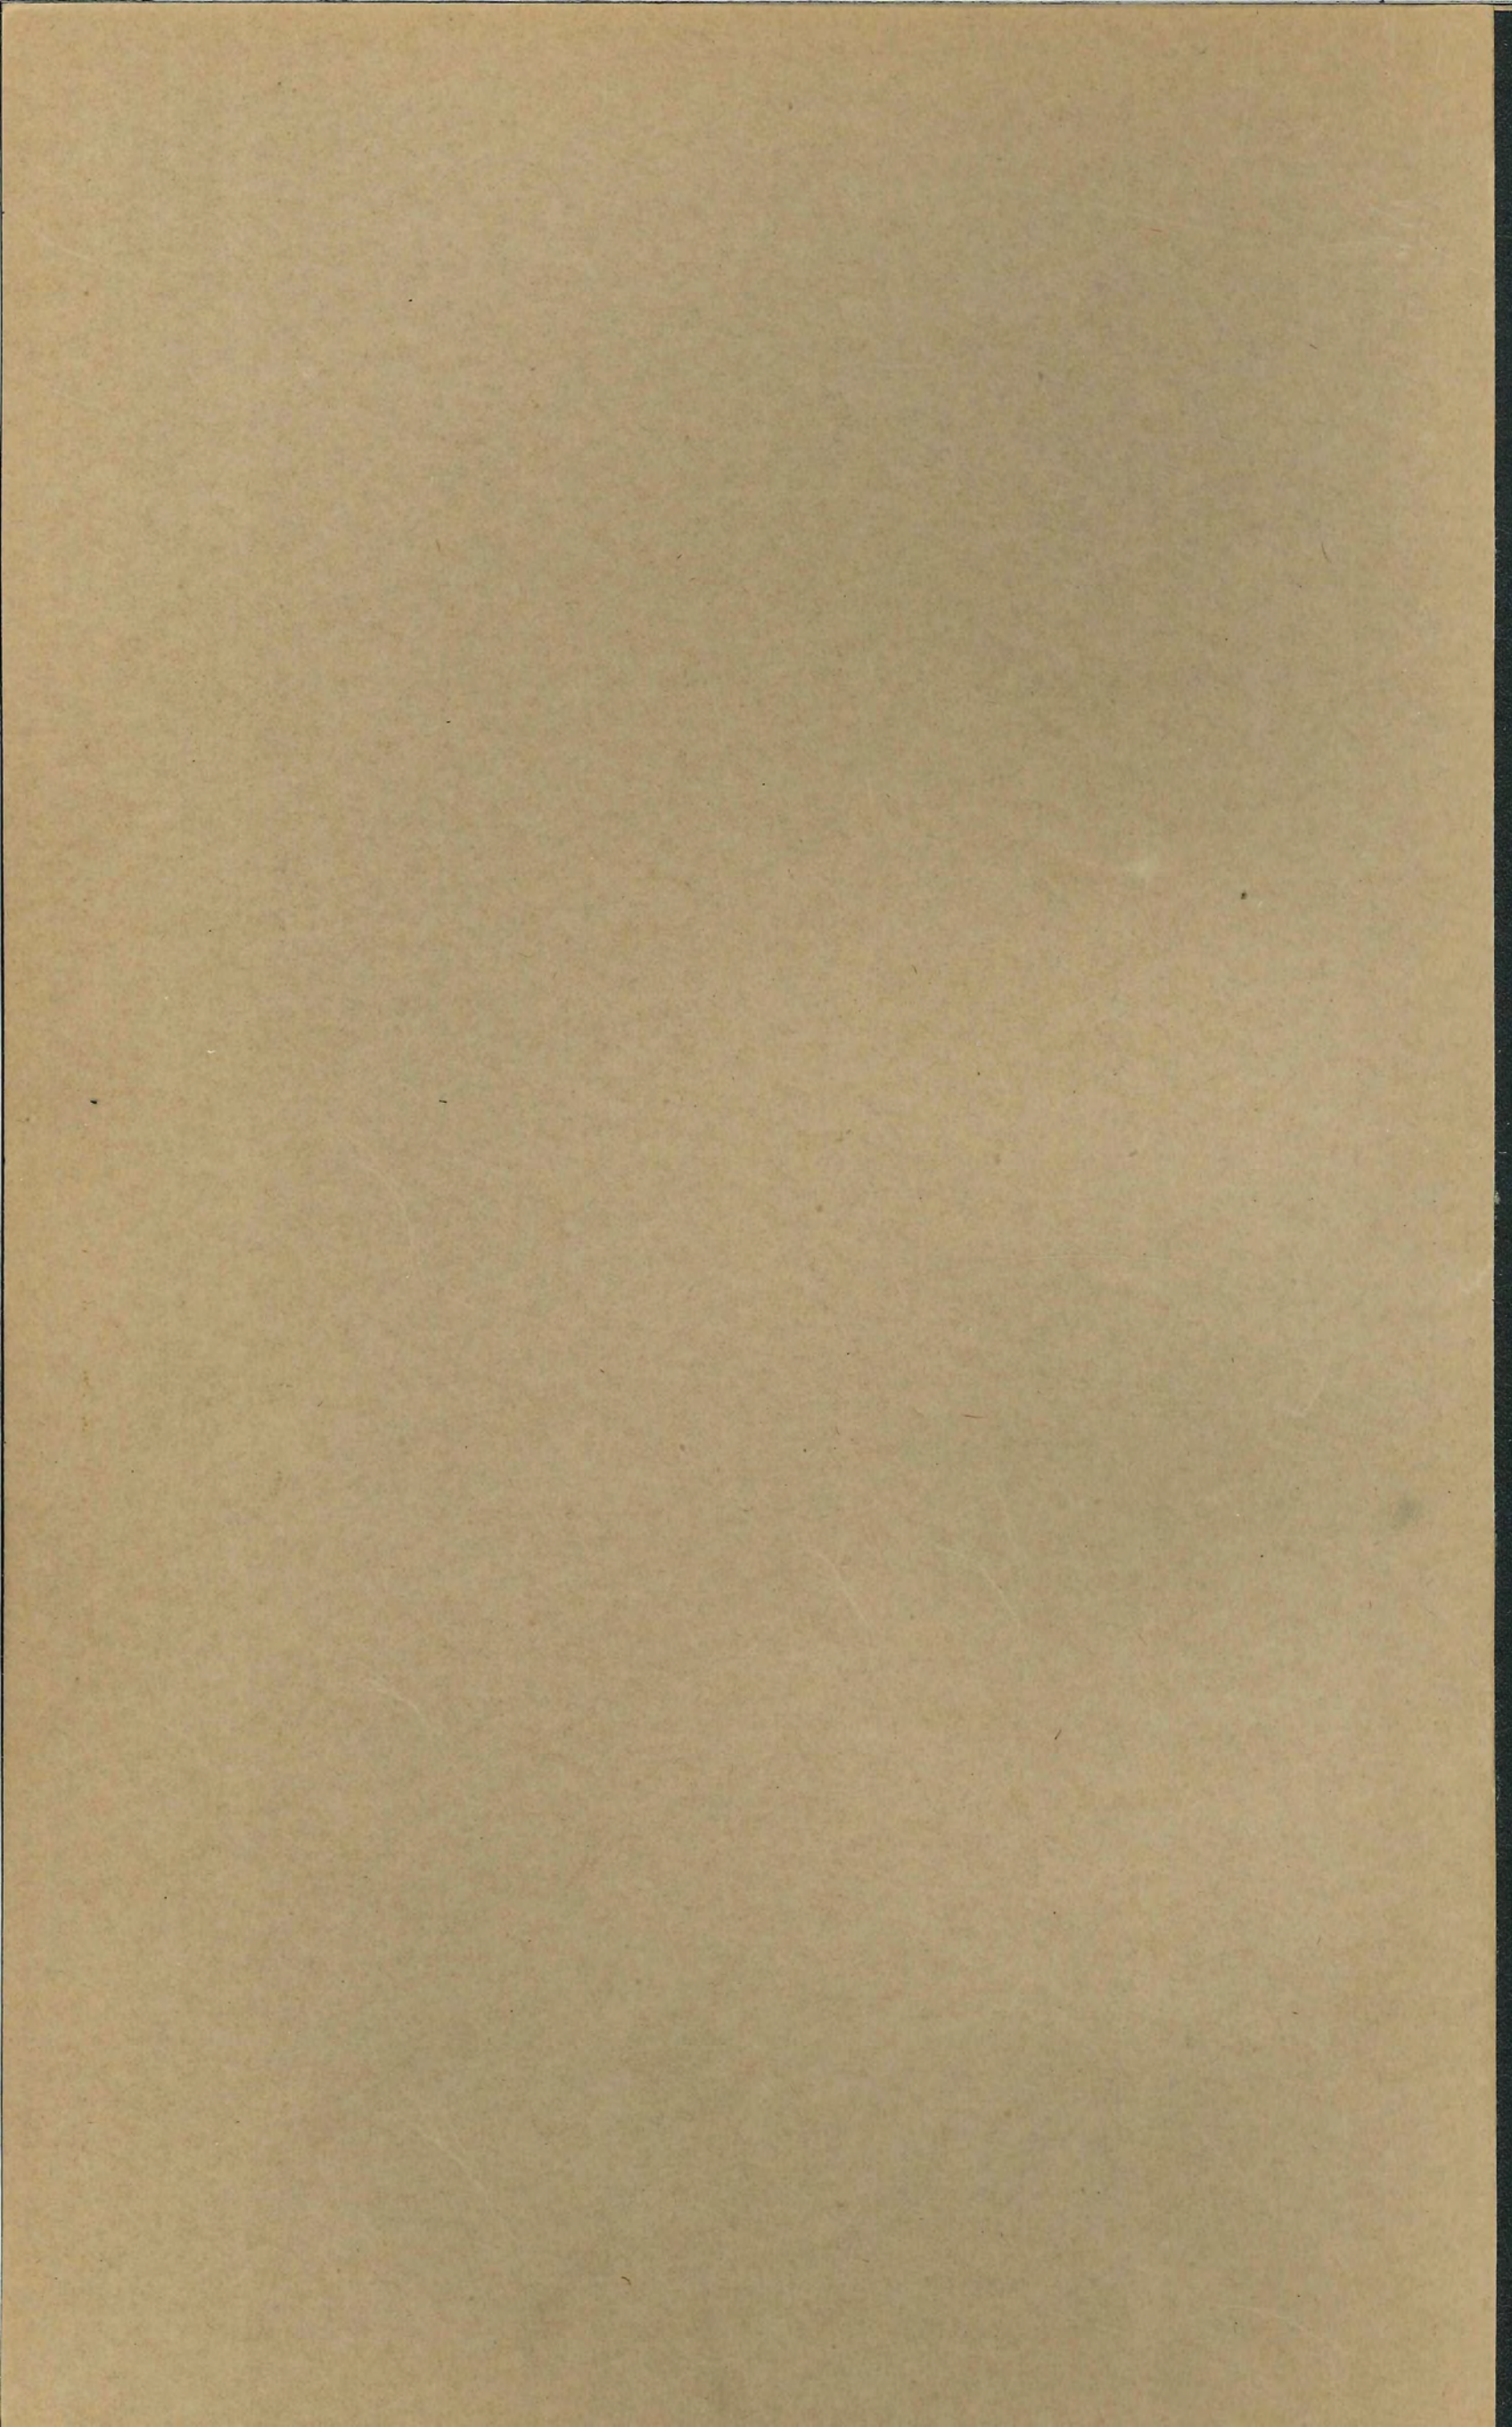

*Förvaras i arkivet*

*Ser EXIII b*  
776

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
arkiv

DIARIE Nr 32710

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1947

*lev 16 349 bid.* D-----2\*0428

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till  
utförande av NORREY dikningsföretag  
år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands  
län.

Förslaget upprättat av  
YNGVE ÖMBERG  
Jordbrukskonsulent.

Genom beslut den 16 maj 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 6 708:06 kr., till företaget beviljat bidrag med 2 230 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten Björn Grönvall

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands län (företagets namn samt socken och län)

Övervakare: Civilingenjör Stig Bredberg, Norrby säteri, Tystberga (titel, namn och adress)  
Förordnad: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg (titel och namn)  
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg (titel och namn)  
Förrättningsmannen förordnad den 3 sept. 1946 Förrättningen avslutad den 29 aug. 1947  
Förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid  
förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1953 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8083:50 kronor.  
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6708:06 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:  
Lera och sand 1:50/m<sup>3</sup>  
Betongrör: 15 cm 1:75/st; 22,5 cm 3:60/st; 30 cm 5:50/st; 37,5 cm 8:-/st; 45 cm 10:50/st; 60 cm 15:-/st.  
Tegelrör: 150 mm 523:-/1000 st; 200 mm 776:-/1000 st.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

| Samfällighet<br>(Delföretag) | Arbets- och<br>materialkostnad |     | Ersättningar |     | Förrättnings-<br>kostnader och<br>dylikt |     | Summa kostnad<br>för utförandet |     | Kostn. för<br>en första<br>rensning | Total kostnad |     |
|------------------------------|--------------------------------|-----|--------------|-----|------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------|-----|
|                              | kronor                         | öre | kronor       | öre | kronor                                   | öre | kronor                          | öre | kronor                              | kronor        | öre |
|                              | 6490                           | -   |              |     | 218                                      | 06  | 6708                            | 06  |                                     | 6708          | 06  |

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet<br>(Delföretag) | Förbättrad mark |    |               |    |       |    | Jord-<br>förbättring |     | Social<br>båtnad<br>) | Total<br>kostnad |     | Kostnad<br>per<br>hektar | Bidragskvot | Bidrag |
|------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-------|----|----------------------|-----|-----------------------|------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|
|                              | åker<br>tomt    |    | annan<br>mark |    | summa |    |                      |     |                       |                  |     |                          |             |        |
|                              | har             | ar | har           | ar | har   | ar | kronor               | öre |                       | kronor           | öre | kronor                   |             | kronor |
|                              | 7               | 51 |               |    | 7     | 51 | 8083                 | 50  | 0                     | 6708             | 06  | 900:-                    | 1/3         | 2230:- |

Torrlägningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker ~~ganska~~ välbelägna. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna brukas ekonomiskt.


Arbetet är påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, och att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 2230:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:  
Bilaga 1. Laga kraftbevis

- " 2. Ansökan om bidrag
- " 3. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping den 21 november 1947.  
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN  


\*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen angivna tid  
icke anförts över en enligt uppgift av jordbrukskonsulenten  
Yngve Omberg den 29 augusti 1947 avslutad syneförrättning  
angående torrläggning av mark tillhörande Norrby i Bogsta  
socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vat-  
tendomstols kansli den 4 november 1947.

Ex officio:

*Per Bergsten*



Stämpel: Två kronor.

DIARIE Nr 32710  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
27 DEC. 1947

Undertecknad, ende intressent i Norrby dikningsföretag  
år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands län, får härmed vörd-  
samt anhålla om bidrag utan återbetalningsskyldighet från  
statens avdikningsanslag till företagets utförande i enlig-  
het med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upp-  
rättat förslag. Norrby pr Tystberga den 29 augusti 1947.

*Yngve Omberg*


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands  
län.

1947

|            |                                                        |               |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| augusti 29 | Kostnad för syneförrättningen enligt<br>arvodesräkning | 214:61        |
| november 4 | Laga kraftbevis: Lösen och kommis-<br>sionärsarvode    | <u>3:45</u>   |
|            | Summa utgifter                                         | <u>218:06</u> |

Nyköping den 13 november 1947.


  
Jordbrukskonsulent.



## FÖREDRAGET

DEN 2 SEP. 1949

## RAPPORT



## LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyningFöretag: Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands län  
(namn, socken och län)

~~Omförordningen~~ } Civilingenjören Stig Bredberg, Norrby säteri, Tystberga  
~~Förordningen~~ }  
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 16/5 49

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

2.230

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1953


Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till  
VattendomstolenVid förrättningen, som verkställdes av Jordbrukskonsulent Yngve Ombergden 29 april 1948, har befunnits att

företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget

Nyköping den 12 maj 1948

å tjänstens vägnar




LANTBRUKSINGENJÖREN

I

SÖDERMANLANDS LÄN

NYKÖPING

Tel. 1049



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande  
Norrby dikningsföretag år 1947 i Bogsta socken, Södermanlands län.

- ✓ ./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- ✓ ./1 Rekvisition.
- ✓ ./1 Avsyningsrapport.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader överstigit  
de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 18 augusti 1949.

*Martin Ljungström*
