


4429 - 2



E

2★1376

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv


Kvästad dikningsföretag år 1952.

Norsholm kommun.

(Skärkind socken.)

Östergötlands län.

Synehandlingar.




Kvästad dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Kvästad i Nors-
holm kommun (Skärkind socken) av Öster-
götlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTA.

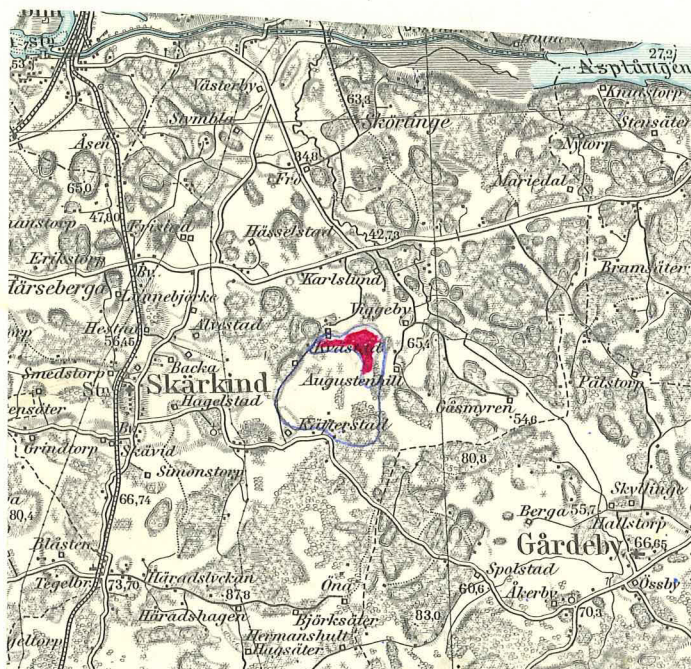

Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Kvästad i Norsholms kommun (Skärkind socken)
av Ostergötlands län.

År 1952, den 22 december, kl. 1.30 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Helge Andersson i Kvästad för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen, och hade
meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bifogade förteckning,
bil.2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Carl-Axel Svensson i Kätterstad och Sven Carlsson
i Halleby.

Sökande till förrättningen:

Helge Andersson,	1/2 mtl. Kvästad	5	och 1/2 mtl. Kvästad	5	3
Karl Svensson,	2/3 " "	8	genom sonen David Svensson.		

Övrig intressent:

Arne Henriksen, Karlslund.

Inga andra intressenter finnas inom företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 3 km. öster om Skärkinds kyrka. Den i före-
taget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år
uppmätts och avvägs, varjämte förslag till företagets utförande
upprättats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

2.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Avloppsdiket, sträckan C - D - E från gränsen mellan Kvästad och Karlslund till nedre ändpunkten av "Kätterstad dikningsföretag år 1951" med beredande av erforderligt fall på sträckan B - C på Karlslunds ägor.
2. Avloppsdiket, sträckan D - K - L - F genom Kvästad ² till gränsen mot Kvästad ³ 5 .
3. Enskilda diket G - I på Kvästad ² 8 .
4. Dike i rågången Kvästad - Karlslund, sträckan C - G - H.

§ 5.

Till företagets styrelse valdes Helge Andersson, Kvästad, Norsholm, Tel.Norrköping 550 19,
med David Svensson, Kvästad som ersättare.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 7.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 8767	712:-	kr.
Till förrättningsmannen: Ljuskopior av ritningar	4:35	"
Till godemannen Carl-Axel Svensson, Kätterstad	22:-	kr.
" " Sven Karlsson, Halleby	<u>23:60</u>	" 45:60 "
Hantlangningskostnad:		
Till Carl Svensson, Kvästad	62:50	kr.
" Helge Andersson, " ...	<u>20:-</u>	" 82:50 "
Vattendomstolsavgift	40:17	"
Summa		<u>884:62 kr.</u>

§ 8.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol. Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kvästad den 22 december 1952.

Jens Hedin

Lantbruksingeniör.


Såsom gode män:

Carl Axel Lammner Dan Carlsson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; skolande Helin hit insända bevis om mottagande av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 20 december 19 51.


Carl Hamilton


G.A. Wallén

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Utan avgift.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kvästad i Skärkind socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Helge Andersson, Kvästad Frälsegård, Norsholm.

Karl Svensson, " Norrgård, "

Hänvändelse till Helge Andersson, Tel. Norrköping 55 019


Linköping den 5 november 1951.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 6 december 1951.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(A. Norrgård)

(Gideon Johansson)



Bil. 1 48/51 4.

Östergötlands län
5 NOV 1951
ID:a 155

Ink. till Landskansliet
Linköping
18 DEC 1951
D. Nr 46 Dikn. 51/51

Förteckning

över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kvästad n:o 5 och 8 i Norsholms kommun (Skärkind socken) hos Helge Andersson i Kvästad måndagen den 22 december 1952 kl. 1,30 em.

Kallelse till godemannen Carl-Axel Svensson,	Kätterstad,	<u>Skärkind.</u>
" " " Sven Carlsson,	Halleby,	"
Meddelande till Helge Andersson,	Kvästad,	<u>Norsholm.</u>
" " Karl Svensson,	"	"
" " Arne Henriksson,	Karlslund,	N "

Linköping den 27 november 1952.

Near Helin.
Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
						<u>Bil. A.</u>	
<u>Norsholm kommun.</u>							
<u>(Skärkind socken)</u>							
<u>NORRA OMRÅDET.</u>							
<u>Kvästad 8²,</u>							
2/3 mtl. litt A							
<u>Karl Svensson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	1	0,36	2100	3000	900	324
"	"	2	0,77	"	"	"	693
"	"	3	0,82	2700	"	300	246
"	"	4	0,30	2500	"	500	150
"	"	5	0,25	"	"	"	125
"	"	6	0,13	"	"	"	65
"	"	7	0,48	1800	"	1200	576
"	"	8	1,99	"	"	"	2388
"	"	9	0,10	"	"	"	120
"	"	10	0,14	2100	"	900	126
"	"	11	0,97	1800	"	1200	1164
"	"	12	0,14	1200	"	1800	252
"	"	13	0,25	1500	"	1500	375
"	"	14	0,68	2100	"	900	612
"	"	15	0,41	2700	"	300	123
"	"	16	0,16	2400	"	600	96
"	"	17	0,21	"	"	"	126
Transport		8,16					7561

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		8,16					7561
Åker	mylla/lera	18	0,16		2400	3000	600	96
"	"	19	0,14		"	"	"	84
"	"	20	0,50		1800	"	1200	600
"	"	21	0,21		2100	"	900	189
A-summa			9,17					8530
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 13+69-D-17+50		= 381 m. á 8:- kr.						3048
"	30+23-K	= 37 m. á 8:- "						1896
B-summa								4944
Totalsumma								13474
Kvästad 5 ³ ,								
1/2 mtl. litt B								
Helge Andersson.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	37	1,11		2100	3000	900	999
"	"	38	1,26		"	"	"	1134
"	"	39	0,15		"	"	"	135
A-summa			2,52					2268
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 17+54-19+19		= 165 m. á 8:- kr.						1320
"	19+23-19+82	= 59 m. á 1:- "						59
B-summa								1379
Totalsumma								3647

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kvästad 5²,</u>							
1/2 mtl. litt C							
<u>Helge Andersson.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	mylla/lera	40	0,34	1800	3000	1200	408
"	"	41	0,26	2400	"	600	156
"	"	42	0,47	2200	"	800	376
A-summa			1,07				940
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan	19+82-19+90	= 8 m. å 1:-	kr.				8
"	19+90-21+40	= 150 m. å 8:-	"				1200
"	21+40-E	= 19 m. å 1:-	"				19
B-summa							1227
Totalsumma							2167
<u>S a m m a n d r a g för Norra Området.</u>							
	Fastig- hetns håll åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
<u>Norsholm kommun.</u>							
(Skärkind socken.)							
<u>Kvästad 8²,</u>							
2/3 mtl. litt A	35	9,17		8530	4944	13474	
Karl Svensson							
<u>Kvästad 5³,</u>							
1/2 mtl. litt B	}	35	2,52	2268	1379	3647	
Helge Andersson.							
<u>Kvästad 5²,</u>							
1/2 mtl. litt C			1,07	940	1227	2167	
Helge Andersson.							
S u m m a			12,76	11738	7550	19288	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norsholm kommun.</u> (Skärkind socken) <u>SÖDRA OMRÅDET.</u> <u>Kvästad 8²,</u> 2/3 mtl. litt A <u>Karl Svensson.</u> <u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	mylla/lera	22	0,16		2700	3000	300	48
"	"	23	0,10		"	"	"	30
"	"	24	0,14		2400	"	600	84
"	"	25	0,05		2700	"	300	15
"	"	26	0,06		"	"	"	18
"	"	27	0,15		2400	"	600	90
"	"	28	0,28		"	"	"	168
"	"	29	0,26		"	"	"	156
"	"	30	0,08		2700	"	300	24
"	"	31	0,09		"	"	"	27
"	"	32	0,36		2400	"	600	216
"	"	33	0,10		2700	"	300	30
"	"	34	0,60		2400	"	600	360
<u>A-summa</u>			2,43					1266
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan K-L		= 290 m.	å 8:-	kr.				2320
"	L-35+95	= 45 m.	å 8:-	"				360
"	35+95-36+34	= 39 m.	å 1:-	"				39
"	36+34-F	= 129 m.	å 8:-	"				1032
B-summa								3751
<u>Totalsumma</u>								5017

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kvästad 5³,</u> 1/2 mtl. litt B <u>Helge Andersson.</u>							
Åker mylla/lera	35	0,76		2400	3000	600	456
" "	36	0,86		2700	"	300	258
<u>S u m m a</u>		1,62					714
<u>S a m m a n d r a g f ö r S ö d r a O m r å d e t.</u>							
	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Norsholm kommun.</u> (Skärkind socken.)							
<u>Kvästad 8²,</u> 2/3 mtl. litt A <u>Karl Svensson.</u>	35	2,43		1266	3751		5017
<u>Kvästad 5³,</u> 1/2 mtl. litt B <u>Helge Andersson.</u>	35	1,62		714			714
<u>S u m m a</u>		4,05		1980	3751		5831
<u>Enskilda diket.</u>							
<u>Norsholm kommun.</u> (Skärkind socken)							
<u>Kvästad 8²,</u> 2/3 mtl. litt A <u>Karl Svensson.</u>							
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan G-I = 208 m. å 8:- kr.							1664
<u>S u m m a</u>							1664

[Faint handwritten text]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					<u>Bil.B.</u>	
		<u>NORRA OMRÅDET.</u>				
		<u>Huvudavloppet, sträckan B-C-D-E.</u>				
B-C	208	Rensning				200
C-D	209	Grävning, läggning, höljning				
		f.rörledning m	209	4:-	836	
		50 cm. betongrör "	209	16:-	3344	
C		Stödjemur st	1		150	
13+69,D		Brunnar 100 cm. "	2	175:-	350	
14+66		Kopplingsbrunn 100 cm. "	1		75	
15+12-15+17		Upptagande av ägobro			100	4855
D-17+54	237	Grävning m.m. m	237	3:50	830	
		40 cm. betongrör "	237	8:50	2014	
16,17+50,		Brunnar 90 cm. st	3	160:-	480	
17+54						
17+50-17+54		Upptagande av ägobro			100	3424
17+54-19+23	169	Grävning m.m. m	169	3:50	592	
		40 cm. betongrör "	169	8:50	1437	
17+90,19+23		Brunnar 90 cm. st	2	160:-	320	
19+19-19+23		Upptagande av ägobro			100	2449
19+23-20+70	147	Grävning m.m. m	135	4:-	540	
		Sprängning m.m. "	12	25:-	300	
		40 cm. betongrör "	147	8:50	1250	
20+70		Brunn 90 cm. st	1		160	2250
20+70-E	89	Grävning m.m. m	81	3:-	243	
		Sprängning m.m. "	8	25:-	200	
		40 cm. betongrör "	89	8:50	757	1200
						14378
		Tillägges för oförutsett m.m.				522
	<u>1059</u>	<u>S u m m a</u>				<u>14900</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Bidiket, sträckan D-K-L-F.</u>				
		<u>Delsträckan D-K.</u>				
D-31+94	194	Grävning m.m. D-30+23 m	23	6:-	138	
		" m.m. 30+23-31+94"	171	3:50	599	
		12" betongrör	194	5:50	1067	
30+23, 30+80, 31+94		Brunnar 75 cm.	3	140:-	420	
						2224
31+94-K	66	G rävning m.m. 31+94-32+15	21	4:50	95	
		" m.m. 32+15-K m	45	2:-	90	
		10" betongrör	66	4:-	264	
K		Brunn 60 cm.	1		120	569
						2793
		Tillägges för oförutsett m.m.				157
	260	<u>S u m m a</u>				2950
		<u>Bidiket, sträckan C-G-H</u>				
C-G	46	Grävning m.m. m	46	1:50	69	
		7" tegelrör	160	0:85	136	
G		Brunn 60 cm.	1		120	325
G-H	49	Grävning m.m. m	49	1:50	74	
		6" tegelrör	170	0:75	128	
H		Brunn 60 cm.	1		120	322
						647
		Tillägges för oförutsett m.m.				53
	95	<u>S u m m a</u>				700

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g för NORRA OMRÅDET.</u>				
	1059	Huvudavloppet, sträckan B-C-D-E.				14900
	260	Bidiket, " D-K				2950
	95	" " C-G-H				700
	1414	<u>S u m m a</u>				18550
		<u>SÖDRA OMRÅDET.</u>				
		<u>Bidiket, sträckan D-K-L-F.</u>				
		<u>Delsträckan K-L.</u>				
K-33+38	78	Grävning m.m. m	78	2:-	156	
		10" betongrör "	78	4:-	312	
33+38		Brunn 60 cm. st	1		120	588
33+38-L	212	Grävning m.m. m	212	2:-	424	
		10" betongrör "	212	4:-	848	
34+87		Brunn 60 cm. st	1		120	1392
						1980
		Tillägges för oförutsett m.m.				120
	290	<u>S u m m a</u>				2100
		<u>Delsträckan L-F.</u>				
I-36+34	84	Grävning m.m. m	84	2:-	168	
		10" betongrör "	84	4:-	336	
36+16		Upptagande av ägobro			100	
36+34		Brunn 60 cm. st	1		120	724
36+34-F	129	Grävning m.m. m	129	2:-	258	
		10" betongrör "	129	4:-	516	
F		Brunn 60 cm. st	1		120	894
						1618
		Tillägges för oförutsett m.m.				82
	213	<u>S u m m a</u>				1700

Per Hedin
Lantbruksingeniör.

SYNEMÄNNENS UTLÅTANDE

angående

KVÄSTAD DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Kvästad i Norsholms kommun (Skärkind socken) av Östergötlands län, avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansömlingen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av tre från varandra skiljda dikningsområden, nämligen:

Norra området, omfattande utförande av de på bifogade plan- och profilritningar upptagna dikem, nämligen

huvudavloppet, sträckan B - C - D - E,	med en längd av	1,059 m.
och bidiket, " D - K,	" " " "	260 "
samt rågångsdiket, " C - G - H,	" " " "	95 "
	<u>Summa</u>	<u>1,414 m.</u>

Södra området, omfattande utförande av dikessträckan

K - L - F,	med en längd av	503 m.
<u>Enskilda diket</u> , sträckan G - I,	" " " "	208 "

Dikessträckan B - C ingår även i "Bostorp - Viggeby och Kvästad dikningsföretag år 1902"

Vid punkt E ansluter företagets huvudavlopp till "Kätterstad dikningsföretag år 1954"

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över företagets jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan finnes utsatt med en blå linje, omfattar en areal av 161 ha.

På sträckan B - C skall utföras erforderlig rensning enligt på profilritningen utsatt bottenlinje.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Ha.	Q max sek1.	I	Rördimension.
<u>Huvudavloppet, sträckan C - D - E.</u>				
C - 13+69	154	154	2:1000	50 cm betongrör.
13+69 - 14+66	150	150	"	50 cm "
14+66 - D	"	"	"	50 cm "
D - 16	114	114	3:1000	40 cm "
16 - 17+50	110	110	"	40 cm "
17+50 - 17+54	"	"	"	40 cm "
17+54 - 17+90	107	107	"	40 cm "
17+90 - 19+23	104	104	"	40 cm "

Dikessträcka.	Neder- börds- område. Ha.	Q max sekl.	I	Rördimension.
19+23 - 20+70	102	102	3:1000	40 cm betongrör.
20+70 - E	96	96	5:1000	40 cm "
<u>Bidiktet, sträckan D - K - L - F.</u>				
D - 30+23	35	35	1,5:1000	12" betongrör.
30+23 - 30+80	"	"	"	12" "
30+80 - 31+94	33	33	"	12" "
31+94 - K	32	32	5:1000	10" "
K - 33+38	31	31	15:1000	10" "
33+38 - 34+87	26	26	12:1000	10" "
34+87 - L	20	20	17:1000	10" "
L - 36	"	"	7:1000	10" "
36 - 36+34	"	"	4:1000	10" "
36+34 - F	11	11	1:1000	10" "
<u>Räsningsdiktet, sträckan G - G - H.</u>				
G - G	7	7	2:1000	7" tegelrör.
G - H	5	5	"	6" "
<u>Bidiktet, sträckan G - I.</u>				
G - 60+89	1	1	3:1000	3" "
60+89 - I	--	--	"	3" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt G, brunnar av 100 cm betongrör vid punkterna 13+69, D och 14+66 (kopplingsbrunn), brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 16, 17+50, 17+54, 17+90, 19+23 och 20+70, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 30+23, 30+80 och 31+94, brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna K, G, H, 33+38, 34+87, 36+34, F

19.
och 60+89 samt stensil vid punkt I.

De föreslagna dikedimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Trummor.

Inga trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrätningskostnader o.dyl, beräknats till:

För Norra Området	18,550:-	kr.
" Södra Området	3,800:-	"
" Enskilda Diket	700:-	"
Summa		<u>23,050:-</u> kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Inom Norra området	19,288:-	kr.
" Södra området	5,831:-	"
" Enskilda Dikesområdet	1,664:-	"
Summa	26,783:-	kr.

Kostnadernas fördelning.

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom var och en av de tre dikeområdena.

Inom Norra området och Enskilda Dikningsområdet skola dylika kostnader fördelas mellan de i områdena ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet inom området uppskattade båtnaden.

På grund av fallbrottet vid punkt L inom Södra Området har detta område indelats i två avdelningar, nämligen avdelning KL, omfattande dikesträckan K - L och ägofigurerna 22 - 30, med en beräknad kostnad av 2,100 kr., en uppskattad båtnad av 2,953 och en relativ kostnad av 0,71114 samt avdelning IF, omfattande dikesträckan I - F och ägofigurerna 31 - 36, med en beräknad kostnad av 1,700 kr., en uppskattad båtnad av 2,778 kr. och en relativ kostnad av 0,61195.

Då ingen fallkostnad kan beräknas böra utgå för utförande av avdelning IF, skola ovanstående relativa kostnader tillämpas vid kostnadsfördelningen.

Förrättningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

 Fastigheter och ägare.

Norsholms kommun (Skärkind socken)

Norra Området.

Kvästad	² 8 , 2/3 mtl., litt.A.	Karl Svensson, <u>sökande</u>
"	³ 5 , 1/2 " " B.	Helge Andersson, <u>sökande</u>
"	² 5 , 1/2 " " C.	Helge Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Södra Området.

Kvästad	² 8 , 2/3 mtl. litt.A.	Karl Svensson, <u>sökande</u>
"	³ 5 , 1/2 " " B.	Helge Andersson, <u>sökande</u>

Summa

Enskilda Diket.

Kvästad	² 8 , 2/3 mtl. litt.A.	Karl Svensson, <u>sökande</u>
---------	--------------------------------------	-------------------------------------

Summa

Av-	Relativ	Summa		Deltagningskyl-	
del-		Båtnad.	Kostnad	dighet i procent.	
ning.	kostnad.	Kr.	Kr.	I arbets-I förrätt-	
				och ~~ante~~ -ningskost-	
				rialkost-nder.	
				nader o.dyl.	
				o.dyl.	
		Kr.	Kr.	%	%
---	-----	13,474:-	-----	12,959:03	69,86 56,22
---	-----	3,647:-	-----	3,507:81	18,91 15,22 <i>lv</i>
---	-----	2,167:-	-----	2,083:16	11,23 9,04 <i>lv</i>
		19,288:-		18,550:-	100,00
KL	0,71114	2,953:-	2,100:-		
IF	0,61195	2,064	<u>1,263:07</u>	3,363:07	88,50 14,59
IF	"	714:-	-----	436:93	11,50 1,89 <i>lv</i>
		5,731:-		3,800:-	100,00
---	-----	1,664:-	-----	700:-	100,00 3,04
		1,664:-		700:-	100,00 100,00

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Kvästad dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola, särskilt för varje område, av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1952.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara utförda i enlighet med gällande hållfasthets- och täthetsbestämmelser,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsugning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör och
att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnrören.

Firpunkter, till ledning vid arbeternas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i berg 10 m. stöder om punkt I, belägen på höjden + 9,85 m.
2. Kors i berg 10 m. sydost om punkt E, belägen på höjden + 11,55 m.
3. Kors i jordfast sten vid punkt 36+34 av dikesträckan L - F, belägen på höjden + 15,18 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 40 kronor 17 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (Se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kvästad den 22 december 1952.

Sven Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Axel Lennarsson *Sven Carlsson*

Kvästad dikningsföretag år 1952

Norsholms / Skärkinds socken /

Östergötlands

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukaren Helge Andersson, Kvästad pr Norsholm Tel Norrköping 55019

2 februari 1953

9.560:-

- - - -

1 november 1956

1:e assistenten B. Wallgren

8 september 1953

företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping den 20 oktober 1953

Lantbruksingenjör.

