

~~7089~~

7405

E_____2*6892

ANTB. J. E. HILSEN
18 APR 1944



Kund: Lantbrukare
Kundens namn: Lantbrukare

Yxefalls dikningsföretag år 1944.

Kisa socken.

Östergötlands län. 18 APR. 1944

Synehandlingar.

Buq. 544


2

Yxefalls dikningsföretag år 1944,

avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Yxefall och Ö
i Kisa socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Översiktskarta.

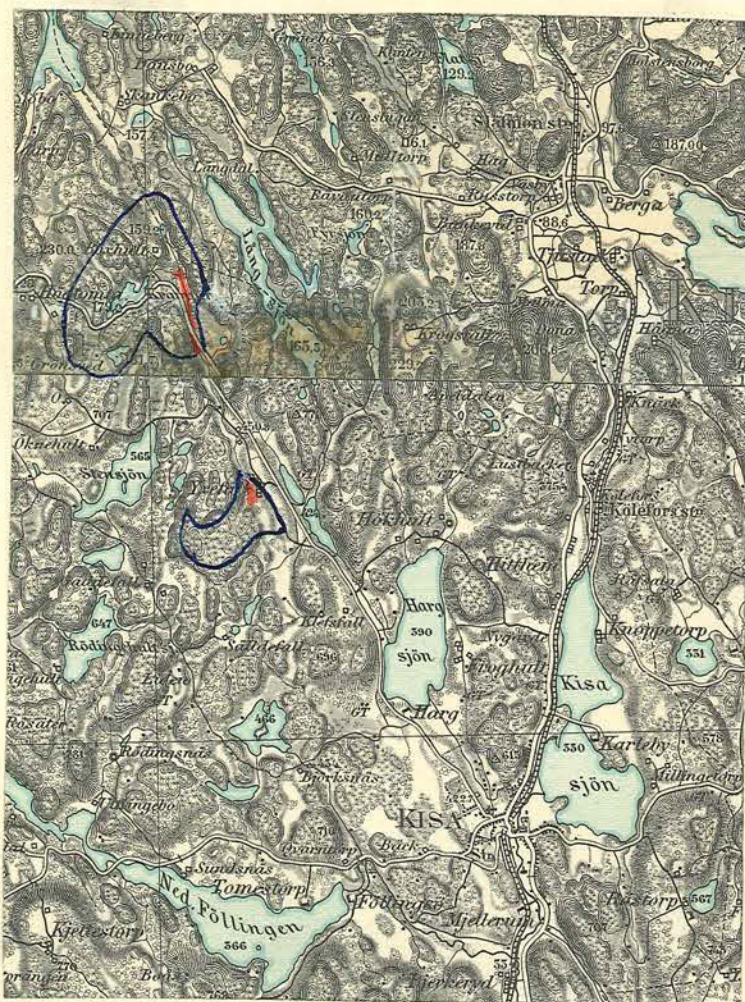

Skala 1: 100000.

1.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av av-
loppsdiken för torrläggning av mark inom
Yxefall och Ö i Kisa socken av Östergötlands
län.

År 1943, den 23 november, kl. 8 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningen hos Carl Larsson i Yxefall för att en-
ligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1. handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 och 3, hade införts i tid-
ningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits vid
Kisa kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bi-
fogade förteckning, bil. 4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män: Johansson i

Skiftesgodemännen Herman Korpklef och Tor Boberg i Kjettestorp,

Sökande till förrättningen:

Carl Larsson, ägare av hälften av 1/4 mtl. Yxefall Norrgård 1³

Övriga intressenter.

Ordföranden i styrelsen för Kinda vägdistrikt Ragnar Andersson,
Kisa,

Några andra hade ej infunnit sig:

1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länssty-
relsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrätt-
ningssmannen. bil. 1.

2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

3.

Företaget ~~är~~ torrläggning dels av ägoområdet Marstrand
med Gubbängskärret, beläget på båda sidor om allmänna vägen
Kisa- Ulrika och omkring 2.5 km. nordväst om Yxefall,
dels mark, belägen omedelbart väster om Yxefalls Södergård.

Sökand en påyrkade torrläggning av det förstnämnda om-
rådet genom uppgrävning av avloppsdiket, sträckan 11+10 - 18+94,
Nedanfö punkt 11+10 borde diket uppgrävas så långt som erfordras

2.

för torrläggning av sökanden tillhörig mark.

Torrläggningen av marken vid Södergården skulle utföras genom uppgrävning av avloppsdiket, sträckan 4+60 - 5+85 och vidare medåt så långt, som erfordras för torrläggning av sökanden till hörig mark.

Den djupa skärningen på sträckan 3 - 4 borde igenläggas med rör. Samtliga övriga dikessträckor skulle utföras som öppna avlopp.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i lika ordning.

4.

Innan sökandens i föregående antecknade yrkanden framställda hade följande delägare infunnit sig:

Axel Karlsson, ägare av 1/4 mtl. Yxefall	Norrgård	1 ²	
Ivar Andersson, " " 1/6 " "	Södergård	2 ⁵	och
	Norrgård	1 ⁵	
K.D.Persson, " " avst, Stubbstugan,	Ö	1 ²	

5.

Ivar Andersson påyrkade, att dikessträckan 7+22 - 10+82 skulle utföras i av honom på marken utstakad sträckning, Om Anderssons stakning skulle visa sig bliwa dyrare än den av förrättningsmannens biträde utstakade sträckningen ville Andersson dock ej uttala skillnaden i grävningsskostnad.

Sökanden påyrkade, att förrättningsmannens stakningssträcka skulle utföras, då den komme att ställa sig billigast.

6.

Samtliga intressenter med undantag av sökanden ansågo sig ej hava någon nytta av företagets utförande, varför de påyrkade att bliwa skiljda från företaget.

7.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen Kisa- Ulrika vid punkt 11+85 av dikessträckan 6-18+94. Trumman hade anlagts någon gång mellan åren 1920 - 1924. Ombyggnad av trumman ansågs ej erforderlig.

Inga enskilda broar skulle ingå i företagets arbeten.

I stället skulle ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörsel utgivas till Ivar Andersson med 20 kr. för överkörsel omkring punkt 8 och eventuellet med 30 kr. för överkörsel vid punkt 4+10, för det fall att rör ej kommer att nedläggas här.

8.

Sökanden anförde, att av Ivar Andersson vid punkterna 3+70 och 4+65 invid diket upplagd sten hade rasat ned i diket och måste upptagas i samband med företagets utförande. Sökanden yrkade, att kostnaden för upptagande av denna sten skulle påföras Andersson ensam. Andersson anförde, att stenen upplagts på samma ställe där förut en jordbank legat. Vid nedläggning av rörledning utgjorde stenen intet hinder.

9.

Meddelades, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe som dagens, och skulle tiden för sammanträdet på de närvarandes begäran endast meddelas genom brev till delägarna minst åtta dagar före sammanträdet,

10.

Sedan protokollet uplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Yxefall den 23 november 1943.

Ivar Selin
Statens lantbruksingeniör,

Såsom gode män:

Herman Johansson *Thor Bråberg*

År 1944, den 11 februari. kl. 9 fm, inställde sig åter undertecknad förrättningen hos Carl Larsson i Yxefall för att fortsätta förrättningens handläggning, och hade meddelanden om sammanträdet. enligt bestämmelse i § 9, utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig de vid föregående sammanträde närvarande godemännen och intressenterna, med undantag av till före Ragnar Andersson, Kisa. samt att det upprättade & förklarade med tillhörande handlingar och ritningar.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Carl Larsson, Yxefäll, Kisa, tel. Kisa 404, ordförande samt Ivar Andersson, Yxefäll, och vägbyggmästaren J.A.Rydell, Kisa.

§ 13.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning m.m. under förrättningen hade utbetalats 84:65 kr. av Carl Larsson.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.D.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Yxefäll den 11 februari 1944.

Ivar Helin

Statens äntbruksingeniör.

Såsom gode män:

Herman Johansson

Karl Robert

Ink. till Landskansliet
Linköping

-7.11.43

D. Nr 227

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen följande utförande av avloppsdike för torrläggning av mark inom Yxefall i Kisa socken. Av företaget väntas komma att beröras:

Karl Larsson, Yxefall, Kisa. Tel.: Kisa 404.

Ivar Andersson, " "

Yxefall den 3 december 1942.

Carl Larsson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av ovanstående framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 8 januari 1943.

Carl Hamilton
Carl Hamilton

Algot Rehardt
Algot Rehardt

Stämpel Fem kronor.
2 D.D.

Kol. av sol



6.
Bil. 2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tisdagen den 2 november 1943.

Sammanträde

vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Yxefall n:o
1 och 2 samt Ö n:o 1 i Kisa socken hål-
les hos Karl Larsson i Yxefall Tisdagen
den 23 November 1943 kl. 8 fm.

Linköping den 1 November 1943.

IVAR HELIN

Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Yxefall n:o 1 och 2 samt Ö n:o 1 i Kisa socken hålles hos
Karl Larsson i Yxefall tisdagen den 23 november 1943 kl. 8 fm.

Linköping den 1 november 1943.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

*Anslagen vid Kisa kyrka
den 2 & 14 nov. 1943. inläggs
Kisa den 19. 11. 43
J. Elmberg*

Bil. 4/.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Yxefall och Ö i Kisa socken hos Karl Larsson i Yxefall tisdagen den 23 november 1943 kl. 8 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Kisa, Kisa.
Kallelse till nämndemannen Herman Johansson, Korpklev, Kisa.

"	"	Karl Hermansson,	Bromhult,	"
Meddelande till Axel Karlsson,		Yxefall,		"
"	"	Ivar Andersson,	"	"
"	"	Karl Larsson,	"	"
"	"	K.D.Persson,	Stubbstugan, Ö,	"
"	"	ordföranden i styrelsen för Kinds vägdistrikt,	Ragnar Andersson	"

Linköping den 1 november 1943.

Ivar Klein.
Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av synförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Yxefall och Ö i Kisa socken hos Karl Larsson i Yxefall fredagen den 11 februari 1944 kl. 9 fm.

Kallelse till nämndemannen Herman Johansson, Korpklöv, Kisa.

"	"	Tor Boberg,	Kjettestorp,	"
Meddelande till		Axel Karlsson,	Yxefall,	"
"	"	Ivar Andersson,	"	"
"	"	Karl Larsson,	"	"
"	"	K.D. Persson,	Stubbstugan, Ö,	"

Linköping den 25 januari 1944.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$	1 ⁵	H	Risa socken. Ykefall Uvngård	<u>Område Ykefall</u> <u>Isak Andersson.</u> Åker fröjord / gms 1 " " 2 " " 3 Dike 4 Äng fröjord / gms 5 Åker " 6 <u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	1 ³	B	Ykefall Uvngård	<u>Rail och Maj Brilk Larsson</u> Åker fröjord / gms 7 " " 8 " " 9 Äng " 10 Dike 11 Äng fröjord / gms 12 Åker " 13 " " 14 " " 15 " " 16 <u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	1 ⁵	H	Ykefall Uvngård	<u>Sammandrag för Område Ykefall</u> Isak Andersson	
$\frac{1}{4}$	1 ³	B	" "	Rail och Maj - Brilk Larsson <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	6							850	51	-	1000	60	-	150	9	-
	11							400	44	-	"	110	-	600	66	-
	4							250	10	-	"	40	-	750	30	-
						3										
		3						130	3	90	300	9	-	170	5	10
	7							350	24	50	1000	70	-	650	45	50
	28	3				3			133	40		289	-		155	60
	14							450	63	-	1000	140	-	550	77	-
	44							"	198	-	"	440	-	"	242	-
	23							200	46	-	"	230	-	800	184	-
		13						50	6	50	500	65	-	450	58	50
						5										
		4						50	2	-	500	20	-	450	18	-
	49							200	98	-	1000	490	-	800	392	-
	4							350	14	-	"	40	-	650	26	-
	34							650	221	-	"	340	-	350	119	-
	17							"	110	50	"	170	-	"	59	50
	185	17				5			759	-		1935	-		1176	-
	28	3				3			133	40		289	-	11.69	155	60
	185	17				5			759	-		1.935	-	88.31	1.176	-
	213	20				8			892	40		2.224	-	100.00	1331	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				transpord	
				Storgård	35
				Åker mylla / grus	36
				Åker	37
				Åker mylla / grus	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				Äng	44
				Åker	45
				" "	46
				Äng	47
				" "	48
				" "	49
				Mark till arlogg	
				<u>Summa</u>	
ansl.	1 ²	E	6 (Stubbstugan)	<u>P. D. Persson</u>	
				Äng mylla / grus	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag för Område</u> <u>Marstrand med</u> <u>Lybbängskärr.</u>	
$\frac{1}{6}$	2 ⁵	C	Uxefall Södergård	Johan Andersson	
$\frac{1}{6}$	2 ³	D	" "	Karl och Maj-Britt Larsson	
$\frac{1}{4}$	1 ³	B	" " " " " " " "	" " "	
rest	1 ²	E	Lö (Skubbången)	R. D. Persson.	
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag för hela försameln.</u>	
			<u>Rösa socken</u>	Område Uxefall Område Marstrand med Lybbängskärr <u>Summa</u>	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ²	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Bit. B</u>										
<u>Kostnads förslag</u>										
<u>Område : Ytefall</u>										
<u>Poloppsdikesträckan A-B-C-D.</u>										
A-B	260	Grus, sand, sten, nyt bebl.	380	2.50			950	-		
B-C	140	Grävning för rördning m.	140	1.50	210	-				
		9" cementrör	"	3.70	518	-				
		Rörns läggning, fyllning	"	0.80	112	-				
B		Körjerna ent. ritning				100	-			
C		Intag med klemmsäck								
		ent. ritning				125	-	1065	-	
C-D	165	Torvjord med stubbar	390	1.-			390	-		
								2405	-	
		För arbetsledning, oförstörda								
		fall m. m. tilläggs					253 95		2 658 95	
		Jordvinnning ent. bit. C.							41 05	
	565	<u>Summa</u>							2 700	-
<u>Område : Marklund med Gubbängskärret</u>										
<u>Poloppsdikesträckan E-F</u>										
E-9	300	Grus, sten	40	1.50	60	-				
		Torvjord	120	0.80	96	-	156	-		
9-11	200	Grus, sten	30	2.50	75	-				
		Torvjord	270	0.80	216	-	291	-		
11-12+8	208	Pinnar	20	3.-	60	-				
		Grus, sten	350	2.50	875	-				
		Torvjord	160	1.-	160	-	1095	-		
12+8-15	192	Pinnar	40	3.-	120	-				
		Grus, sten	350	2.-	700	-				
	900	<u>Överskrift</u>			820	-	1 542	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	900	Överför			820	-	1542	-		
		Torvjord	10	1:-	10	-	830	-		
15-17	200	Pimms	20	3:-	60	-				
		Gruv, sten	290	2:-	580	-				
		Torvjord	20	1:-	20	-	660	-		
17-F	194	Pimms	20	3:-	60	-				
		Gruv, sten	260	2:-	520	-				
		Torvjord	70	1:-	70	-	650	-		
							3682	-		
		Tilläggs arbete 10 70					369 20		4051	20
		Jordensättning ut. bit C							368	80
		Erättning för förvärd								
		Överlämnat vid plat 8							20	-
	1294	Summa							4440	-
<u>Sammandrag</u>										
A-B-C-D	565	Omide: Grefsen							2700	-
E-F	1294	" : Markland med Gubbängskäret							4440	-
	1859	Summa							7140	-

Grafik den 11 januari 1944.
 Ivar Selin.
 Statens landsbruksingenjör.

Jordersättningslängd

Bil. C

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal ~~m²~~	Pris pr m ² ~~Kr~~	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Område: Yrefall</u>						
<u>Avloppsdikey, Sträcken A-B-C-D.</u>						
Yrefall 1 ⁵ , lott. A	Ivar Andersson	ar	0.2	2.50	50	
		Dikerwall m ³	120	0.10	12 -	12 50
" 1 ³ , " B	Karl och Maj-Brith Larsson	ar	0.6	2.-	1 20	
		"	0.7	0.50	35	
		Dikerwall m ³	270	0.10	27 -	28 55
		Summa				41 05
<u>Område: Martensud med Gullbängskärret</u>						
<u>Avloppsdikey, Sträcken E-F.</u>						
Yrefall 2 ⁵ , lott. C	Ivar Andersson	ar	9.6	0.50	4 80	
		"	0.6	0.30	20	
		Dikerwall m ³	60	0.20	12 -	
		"	390	0.10	39 -	56 -
" 1 ³ , " B	Karl och Maj-Brith Larsson	ar	0.2	7.20	1 45	
		"	0.5	4.20	2 10	
		"	0.2	3.60	70	
		"	0.6	3.-	1 80	
		"	1.3	2.40	3 10	
		"	2.7	2.-	5 40	
		"	1.2	1.-	1 20	
		"	7.5	0.50	3 75	
		"	1.-	0.30	20	
		Dikerwall m ³	1300	0.20	260 -	
		"	220	0.10	22 -	301 80
Ö 1 ² , " E	K. D. Persson	Dikerwall	40	0.20	8 -	
		"	30	0.10	3 -	11 -
		Summa				368 80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sammanslag</u>					
Område	Ytefall					41 05
"	Marstrand med Gullbäcks källar					368 80
	Summa					409 85
Ytefall den 11 februari 1944. Levar Selin. Status lantbruksingenjör. Såsom gode män: Herman Johansson Wm Bobberg						

Bil.D.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Yxefalls dikningsföretag år 1944, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Yxefall och Ö i Kisa socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsprotokollet § 3 intagna yrkanden ser detta företag torrläggning av de båda på bifogade översiktsskarta med röd färgläggning betecknade områdena, nämligen område Yxefall, beläget omedelbart väster om Yxefall och 6 km. nordväst om Kisa samt område Marstrand med Gubbängskärret, beläget 2-3 km. nordväst om Yxefallsområdet.

På grund av de båda områdenas belägenhet, har företaget indelats i två beträffande arbetenas utförande och underhåll skiljda områden, nämligen

1. Område Yxefall, omfattande utförande av avloppsdiket, sträckan A-B-C-D på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 565 m.
2. Område Marstrand med Gubbängskärret, omfattande utförande av avloppsdiket, sträckan E-F, med en längd av 1,294 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67

och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap. 7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anses synemånen icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synes lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammes brytpunkter.

De båda områdenas nederbördsområden, vilkas gränser på översiktskartan betecknats med blå linjer, äro av ringa omfattning.

Dikessträckorna A-B, C-D och E-F skola utföras som öppna diken med en bottenbredd av 0,30 m. på de båda förstnämnda och 0,50 m. på den sistnämnda sträckan. Sidolutningen skall vara 1:1,25 på sträckorna A-B och E-F samt 1:1 på sträckan C-D. Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning.

Nederbördsområdet för sträckan omfattar en areal av 70 har.

Med en beräknad maximavrinning av 0,8 sek1./har, erhålls

en maximivattenmängd av 56 sek.l. Med en föreslagen bottenlutning av 1:1000 åtgår 18" rör för avbördande av denna vattenmängd. Då kostnaden härför anses alltför hög, skall ledningen i stället utföras med 9" cementrör, som avbörda 13 sek.l., under det att den vattenmängd, som ej kan avledas genom 9"-ledningen fortfarande skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, vilket öppna dike sålunda skall bibehållas i sitt nuvarande skick.

Intag med slambassäng vid punkt C och kringmurning av rörmynningen vid punkt B skall utföras i enlighet med upprättade ritningar. Dikenas föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Även efter företagets utförande kommer den Ykefall 2⁵ tillhöriga marken att erhålla ofullständig torrläggning. Vid jordvärderingen har hänsyn tagits härtill, i det att den ej fullt torrlagda markens blivande värde nedsatts i förhållande till torrlägningsgraden till i ägobeskrivningen och värderingslängden med rätt antecknade jordvärden.

Ersättning skall av företaget utgivas för den mark,

som tages i anspråk för dikenas uppgrävning och uppläggning
av dikesbankar. med i jorderättningens längden, bil. C, beräknade
belopp. Ersättningarna hava beräknats efter markvärdet före
företagets utförande för mark till dike och efter visst pris
per m³ för dikesvallar.

Ersättningarna skola utbetalas genom avdrag från
ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxe-
rade penningebelopp.

Vid framtida rensningar skola ur diken upptagna
rensningsmassor få uppläggas vid sidan av diken utan ersättning
till markägaren.

För fastigheterna Yxefall 1² och 2⁵ inom område Yxe-
fall skall ingen ersättning utgivas, då markskadan genom dikets
utförande här ansetts motsvara den båtnad, som uppkommer för
dessa fastigheter genom företagets utförande.

Broar.

Dikessträckan E-F skär allmänna vägen Kisa - Ulrika
vid punkt 11:85. Någon förändring av trumman på platsen har ej
ansetts erforderlig.

I enlighet med bestämmelse i protokollet § 7 skola
inga enskilda broar ingå i företagets arbeten. I stället skall
ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad

Överkörsel vid punkt 8 av sträckan E-F utgivas till ägaren av Yxefall 2⁵ med 30 kr. För överkörsel vid punkt ~~4~~+10 av sträckan B-C skall ingen ersättning utgivas, då täckt ledning här skall utföras, men skall bron på platsen efter ledningens utförande återställas i nu befintligt skick på företagets bekostnad.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil. B, samt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil. A, hava nedanstående kostnader och våtnadsvärden beräknats för de båda dikningsområdena:

	Kostnad.	Båtnad.
	Kr.	Kr.
Område Yxefall	2,700:-	1,331:60
" Marstrand med Gubbängskärret	4,440:-	2,588:80
Summa	7,140:-	3,920:40

Kostnadernas fördelning.

På grund av de båda dikningsområdenas belägenhet bestämma synemännen, att samtliga kostnader, med undantag av förrättningskostnader och dylikt, skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda områdena. Inom varje område skola dessa kostnader fördelas mellan de i området ingående fastigheterna efter den på varje fastighet uppskattade båtnaden, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget

för varje område i ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Förrättningskostnader och dylikt skola fördelas ^{efter} de sammanlagda kostnaderna i hela företaget för varje fastighet.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Kisa socken.

Område Yxefall.

1/4 mtl. Yxefall Norrgård 1⁵, litt.A. Ivar Andersson, ej sökande

1/4 " " " 1³, " B. Karl och Maj-Britt Larsson, sökande

Summa.

Område Marstrand med Gubbungskärret.

1/6 mtl. Yxefall Södergård 2⁵, litt.C. Ivar Andersson, ej sökande

1/6 " " " 2³, " D. Karl och Maj-Britt Larsson, sökande

1/4 " " Norrgård 1³, " B. Karl och Maj-Britt Larsson, sökande

avst. 0 (Stubbstugan) 1², " E. K.D.Persson, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslags-

enligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas

Båtnad.	Kostnad.	Deltagningskyl- dighet i procent i	
		Arbets- kostna- der m.m. %	Förrättnings- kostna- der m.m. %
Kr.	Kr.		

155:60	315:63	11,69	4,42
<u>1,176:-</u>	<u>2,384:37</u>	<u>88,31</u>	<u>33,40</u>
<u>1,331:60</u>	<u>2,700:-</u>	<u>100,00</u>	

285:50	489:73	11,03	6,86
8:10	13:77	0,31	0,19
2,124:80	3,644:35	82,08	51,04
<u>170:40</u>	<u>292:15</u>	<u>6,58</u>	<u>4,09</u>
<u>2,588:80</u>	<u>4,440:-</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

första utförande. Det åligger företagets styrelse att låta verk-
ställa underhållsarbeten, så snart så visar sig erforderligt.

All dämning i diken vare förbjuden, och avlägsnas dämmande

hinder, av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Yxefalls dikningsföretag

år 1944. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts hos
Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på
entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört,
bestämma synemännen till den 1 september 1950.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade
handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de
öppna diken

att dikessträckan 18+42 - F skall helt uppgrävas på mark till-

hörig Yxefall 1³, men att dikesvallen på samma sträcka skall
uppläggas på båda sidor om diket,

att dikesvallarna, som skola uppläggas med omkring hälften på

vardera sidan om diket, ej få läggas närmare detsammes kanter

än 1 meter och

att dikesbankarna skola försees med öppningar på de ställen, där

så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock

minst på var 50:de meter.

Beträffande den tänkta ledningen iakttages
 att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunal-
 tekniska föreningens bestämmelser,
 att på profilritningen angivna bottenlägen avse rörens inre un-
 derkant och
 att den ur diket upptagna jorden skall återfyllas på rören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och
 underhåll, have inhuggits på följande ställen:

1. Ring i jordfast sten 8 m. väster om punkt 1:80 av dikessträckan
 A-B, belägen på höjden $\pm 7,21$ m.
2. Kors i jordfast sten 27 m. väster om punkt 7:96 av dikessträc-
 kan C-D, belägen på höjden $\pm 8,29$ m.
3. Kors i större lag sten 18 m. väster om punkt 7:22 av dikessträc-
 kan E-F, belägen på höjden $\pm 5,78$ m.
4. Kors i större jordfast sten 24 m. öster om punkt 10:75 av di-
 kessträckan E-F, belägen på höjden $\pm 7,48$ m.
5. Kors i större jordfast sten 35 m. väster om punkt 15:75 av
 dikessträckan E-F, belägen på höjden $\pm 8,62$ m.

I protokollet §§ 5, 6 och 8 framställda yrkanden

lämnas synemännen utan avseende.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vatten-
 lagen kap. 11 § 95 skall ej erläggas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för

framtiden förvaras hos ordföranden i företgets styrelse.

(Se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen

i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Yxefall den 11 februari 1944.

Ivar Selin

Statens lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Herman Johansson

Karl Robert

Yxefall dikningsföretag
år 1944 i Kisa socken

Uppgifter saknas angående företags utförande.

BGR/1973

