

3627-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUL. 1951

D 2*0488

KLARIS NR

KLARIS NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H a n d l i n g a r

rörande Nurssa dikningsföretag år 1950
i Överselö socken, Södermanlands län
upprättade år 1950 av

Yngve Omberg
agronom

Mälaren-Norrströms nederbördsområde
nr. 61

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ den / 19....

KOMMUNEN ☒

LANTBRUKS- ☒ den 30/10 1953

STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 26/2 1954 / den

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts i de gamla ritningarna
med förbättring)

H A N D L I N G A R

rörande

N U R S S A D I K N I N G S F Ö R E T A G Å R 1950

i Överselö socken, Södermanlands län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1950 av

YNGVE OMBERG

agronom

Härtill två blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning med avseende å
företag för torrläggning av vattensju-
ka marker tillhörande Nurssa 1 och 2
i Överselö socken, Södermanlands län.

Den 30 oktober 1950.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökan
(bilaga A) av lantbruksnämnden i länet föreslagen (bilaga A) och av
länsstyrelsen i länet förordnad (bilaga B) att handlägga denna syne-
förrättning, hade genom brev (bilaga C) till sakägaren sammanträde i
ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 11,00 å Nurssa Gård,
Överselö.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen och länsstyrelsens i
anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade
undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna verkställt genom
förrättningsmannens försorg.

§ 3.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av
grundvatten från markerna undersökts av statens lantbrukskemiska kon-
trollanstalt, Stockholm och delgavs resultatet av denna undersökning
(bilaga D).

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade att erforderligt
avlopp måtte få upptagas för torrläggning av sina i företaget ingående
marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara
med ekonomisk fördel förenat. Den sökande yrkade vidare att avloppet
helst borde igenläggas med rör från punkt 2+50.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom de härför beräknade kostnaderna.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder och förklarade sig intressenten önska komma i åtnjutande av endast bidrag. För så vitt de närvarande hade sig bekant hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 7.

Beslöts att aketerna för företaget skulle förvaras å Nurssa Gård, Överselö.

§ 8.

Förrättningsmannens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning senare skulle tillställas intressenten, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Nurssa pr. Överselö den 30 oktober 1950


förrättningsman.

28 38 18 D.R. 1949

Insändes till *Lantbruksnämnden*
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Arkiv dnr
31 AUG 1949
Lantbruksnämnden
Nyköping

LANTBRUKSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN	
Ink. d. 2 - AUG. 1949	
D.n:r	Arkiv n:r
Centralreg.	

Till

Länsstyrelsen i *Södermanlands* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av *mig* tillhörig mark inom *Overselö* socken(-nar) av *Södermanlands*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *torrläggning av ca 10*

km åter uppgrävning eller igenläggning av omkring
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets bestämhet (dikning, åreglering, sjöanläggning, invallning e. d.), vidare företagets
1.0 km. avlopp och berör Skurssn gård.
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Malmby

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *undertecknad, fabrikör*
Helge L. Petersson, Skindbergsgatan 32, Stockholm, tel 623041,
eller Skurssn gård, Overselö, tel. Overselö 55
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skurssn m Overselö

den

1 augusti

1949

Ant. 623037
7335

Helge L. Petersson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

1/2 mil. Sturson 1'0 2'

Helge L. Petersson

Lantbruks-

~~Torrläggnings~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Yngve Omberg, Nyköping



Nyköping

den 19 augusti

19 49

Lantbruks-

På Torrläggningsnämndens vägnar:



LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN


N:o 28/18 D.R. 1949.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av fabrikören Helge L. Pettersson, Strindbergsgatan 32, Stockholm, gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande 1/2 mantal Nurssa 1^l och 2^l i Överselö socken, förordnas, på förslag av lantbruksnämnden i länet, lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolan- de detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Ant Nyköping i landskansliet den 31 augusti 1949.

På länsstyrelsens vägnar:



(Åke Lindeberg)



(Inga Ljungberg)

Utan avgift.

Lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Herr Fabrikör

Helge L. Pettersson

Strindbergsgatan 32, S t o c k h o l m.

Sedan undertecknad blivit av länsstyrelsen förordnad att hålla syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande 1/2 mtl Nurssa 1¹ och 2¹ i Överselö socken av Södermanlands län, får jag meddela att sammanträde kommer att hållas å Nurssa Gård, Överselö måndagen den 30 oktober 1950 klockan 11,00, då Ni har att tillstädeskomma för utförande av Eder talan.

Nyköping den 20 oktober 1950


förrättningsman.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50Analysbevis N:r D 118/1950-51

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Agronom Yngve Omberg, Nyköping,

undersökts prov av v a t t e n
ink. på 2 st. 800 ml vichyflaskor den 18/10.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet 16 tyska grader
Aggressiv kolsyra 17 milligram per liter
Sulfat, SO_3 37 " " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 20 oktober 1950.

Hugo Sebelius

Föreståndare

Hugo Sebelius

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+0-		<u>Avloppet A-B.</u>				
2+50	250	Schaktning av kærtrorvmull och lera ³ m	400	2:-	800:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10%			100:-	900:-
2+50-		<u>Avloppet B-C.</u>				
4+42	192	Schaktning av lera lm	192	1:50	288:-	
		Inköp av 150 mm(6") tegelrör "	67	1:82	121:94	
		" " 22,5 cm(9") betongrör (1 m långa) lm	125	3:60	450:-	
		Inköp av 15 cm broöga st	1	5:50	5:50	
		Inköp av 45 cm(18") betong- rör(1 m långa, brunn) st	2	10:50	21:-	
		Inköp av 45 cm brunnslock "	1	5:20	5:20	
		Läggning och igenfyllning lm	192	1:50	288:-	
		Arbete med brunn st	1	30:-	30:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			120:36	1.330:-
4+42-		<u>Avloppet C-D.</u>				
5+42	100	Schaktning av lera lm	100	1:-	100:-	
		Inköp av 22,5 cm(9") betong- rör (1 m långa) "	100	3:60	360:-	
		Inköp av 45 cm(18") betong- rör (1 m långa, brunn) st	1	10:50	10:50	
		Inköp av 45 cm brunnslock "	1	5:20	5:20	
		Läggning och igenfyllning lm	100	1:-	100:-	
		Arbete med brunn st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			54:30	650:-
	542	Transport				2.880:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	542	Transport				2.880:-
5+42-		<u>Avloppet D-E.</u>				
6+90	148	Schaktning av lera lm	148	1:-	148:-	
		Inköp av 150 mm(6") tegelrör	50	1:82	91:-	
		" " 200 " (8") " "	98	2:73	267:54	
		" " 15 cm(6") betongrör (75 cm långa, brunnskoppl.) st	1	1:75	1:75	
		Inköp av 22,5 cm(9") betong- rör(1 m långa, brunnskoppl.) "	1	3:60	3:60	
		Inköp av 37,5 cm(15") betong- rör (1 m långa, brunn) st	1	8:-	8:-	
		Inköp av 37,5 cm brunnslock "	1	4:-	4:-	
		Läggning och igenfyllning lm	148	1:-	148:-	
		Arbete med brunn st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			68:11	760:-
6+90-		<u>Avloppet E-F.</u>				
8+18	128	Schaktning av lera lm	128	1:-	128:-	
		Inköp av 150 mm(6") tegelrör	128	1:82	232:96	
		" " 15 cm(6") betongrör (75 cm långa, brunnskoppl.) st	1	1:75	1:75	
		Läggning och igenfyllning lm	128	1:-	128:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			49:29	540:-
8+18-		<u>Avloppet F-G.</u>				
9+60	142	Schaktning av lera lm	142	2:-	284:-	
		Inköp av 22,5 cm(9") betong- rör (1 m långa) "	142	3:60	511:20	
	960	Transport			795:20	4.180:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	960	Transport			795:20	4.180:-
		Inköp av 45 cm(18")betong- rör (1 m långa,brunn) st	3	10:50	31:50	
		Inköp av 45 cm brunnslock "	1	5:20	5:20	
		Läggning och igenfyllning lm	142	1:50	213:-	
		Arbete med brunn st	1	30:-	30:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			105:10	1.180:-
9+60- 11+78		<u>Avloppet G-H.</u>				
	218	Schaktning av lera lm	158	2:50	395:-	
		" " morän "	60	7:-	420:-	
		Inköp av 22,5 cm(9")betong- rör (1 m långa) "	218	3:60	784:80	
		Inköp av 45 cm (18")betong- rör (1 m långa,brunn) st	2	10:50	21:-	
		Inköp av 45 cm brunnslock "	1	5:20	5:20	
		Läggning och igenfyllning lm	218	2:-	436:-	
		Arbete med brunn st	1	30:-	30:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			208:-	2.300:-
11+78- 12+93		<u>Avloppet H-I.</u>				
	115	Schaktning av lera lm	115	1:-	115:-	
		Inköp av 100 mm(4")tegelrör "	115	1:03	118:45	
		" " 10 cm(4")betongrör (75 cm långa,brunnskoppl.) st	2	1:25	2:50	
		Inköp av 37,5 cm(15")betong- rör (1 m långa,brunn) st	1	8:-	8:-	
		Inköp av 37,5 cm brunnslock "	1	4:-	4:-	
	1293	Transport			247:95	7.660:4

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1293	Transport			247:95	7.660:-
		Läggning och igenfyllning lm	115	1:-	115:-	
		Arbete med brunn st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			<u>37:05</u>	420:-
12+93-		<u>Avloppet I-J.</u>				
13+70	77	Schaktning av lera lm	77	0:75	57:75	
		Inköp av 75 mm(3 ^m) tegelrör "	77	0:62	47:74	
		" " 10 cm(4 ^m) betongrör				
		(75 cm långa, brunnsköpl.) st	2	1:25	2:50	
		Inköp av 37,5 cm(15 ^m) betong- rör (1 m långa, brunn) st	2	8:-	16:-	
		Inköp av 37,5 cm brunnslock ^m	1	4:-	4:-	
		Läggning och igenfyllning lm	77	1:-	77:-	
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			<u>30:01</u>	260:-
1370		Summa				8.340:-


Nurssa pr. Överselö den 30 oktober 1950



förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Överselö socken</u>							
<u>1/2 mtl Nurssa 1 och 2</u>							
Helge L. Pettersson							
åker, kärrtorvmull på gytt-							
lera	1	0,15		900	900	-	-
" " "	2	0,31		900	1400	500	155:-
" " "	3	0,38		900	1400	500	190:-
" mullhaltig mellanlera	4	0,23		1400	1500	100	23:-
" kärrtorvm. på gyttjel.	5	0,05		1000	1400	400	20:-
" " " "	6	0,03		1000	1400	400	12:-
" mullhaltig mellanlera	7	0,05		1440	1500	60	3:-
" " "	8	0,11		1280	1500	220	24:20
" " "	9	0,07		1440	1500	60	4:20
" " "	10	0,05		1440	1500	60	3:-
" mullh. styvare	11	0,58		1000	1700	700	406:-
" " "	12	0,94		1000	1700	700	658:-
" mellanlera	13	0,66		1520	1600	80	52:80
" styvare mellanlera	14	0,05		680	1700	1020	51:-
" mellanlera	15	0,28		1520	1600	80	22:40
" " "	16	0,18		1200	1600	400	72:-
" " "	17	0,04		1520	1600	80	3:20
" " "	18	0,04		950	1600	650	26:-
" " "	19	0,19		1400	1600	200	38:-
" " "	20	0,21		1200	1600	400	84:-
" " "	21	0,10		1360	1600	240	24:-
" " "	22	0,11		1520	1600	80	8:80
" " "	23	0,32		1440	1500	160	19:20
" " "	24	0,25		1200	1600	400	100:-
" " "	25	0,25		900	1600	700	175:-
Transport	1-25	5,63					2.174:80


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	1-25	5,63					2.174:80
åker, mullhaltig mellanlera	26	0,01		1520	1600	80	-:80
" " "	27	0,09		1470	1600	130	11:70
" " "	28	0,09		1360	1600	240	21:60
" " "	29	0,09		600	1600	1000	90:-
" " "	30	0,29		1500	1600	100	29:-
" " "	31	0,27		1360	1600	240	64:80
" " "	32	0,03		1580	1600	20	-:60
" mullhalt.styvare "	33	1,01		1270	1700	430	434:30
" mullrik styv lera	34	0,27		300	1800	1500	405:-
" " " "	35	0,11		360	1800	1440	158:40
" mullh.styvare mellanlera	36	0,29		1530	1700	170	49:30
" " " "	37	0,21		1360	1700	340	71:40
" " " "	38	0,17		1360	1700	340	57:80
" " mellanlera	39	0,17		900	1500	600	102:-
" " styvare mellanlera	40	0,23		500	1700	1200	276:-
" " mellanlera	41	0,09		750	1600	850	76:50
" " " "	42	0,21		900	1600	700	147:-
" " " "	43	0,33		1550	1600	50	16:50
odlingsmark, mullh.mellanl.	44	0,01		400	700	300	3:-
Summa	1-44	9,60					4.190:50
Härtill kommer brukningsbåtnad för sträckorna 2+50-10+46							
och 10+80-13+70 = 1086 meter å 5:-kronor							
Summa kronor							5.430:-
							9.620:50
Nurssa pr. Överselö den 30 oktober 1950							
 förrättningsman.							


ARVODESRÄKNING.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Nurssa diknings-
företag år 1950 i Överselö socken av Södermanlands län upprättad
enligt § 1 av Kungl.Maj:ts kungörelse nr.353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	236:93
Ljuskopiering	8:-
Inbindning av förrättningshandl.	4:-
Grundvattenanalys	<u>8:45</u>
Summa kronor	<u><u>257:38</u></u>

Nurssa pr.Överselö den 30 oktober 1950


förrättningsman.

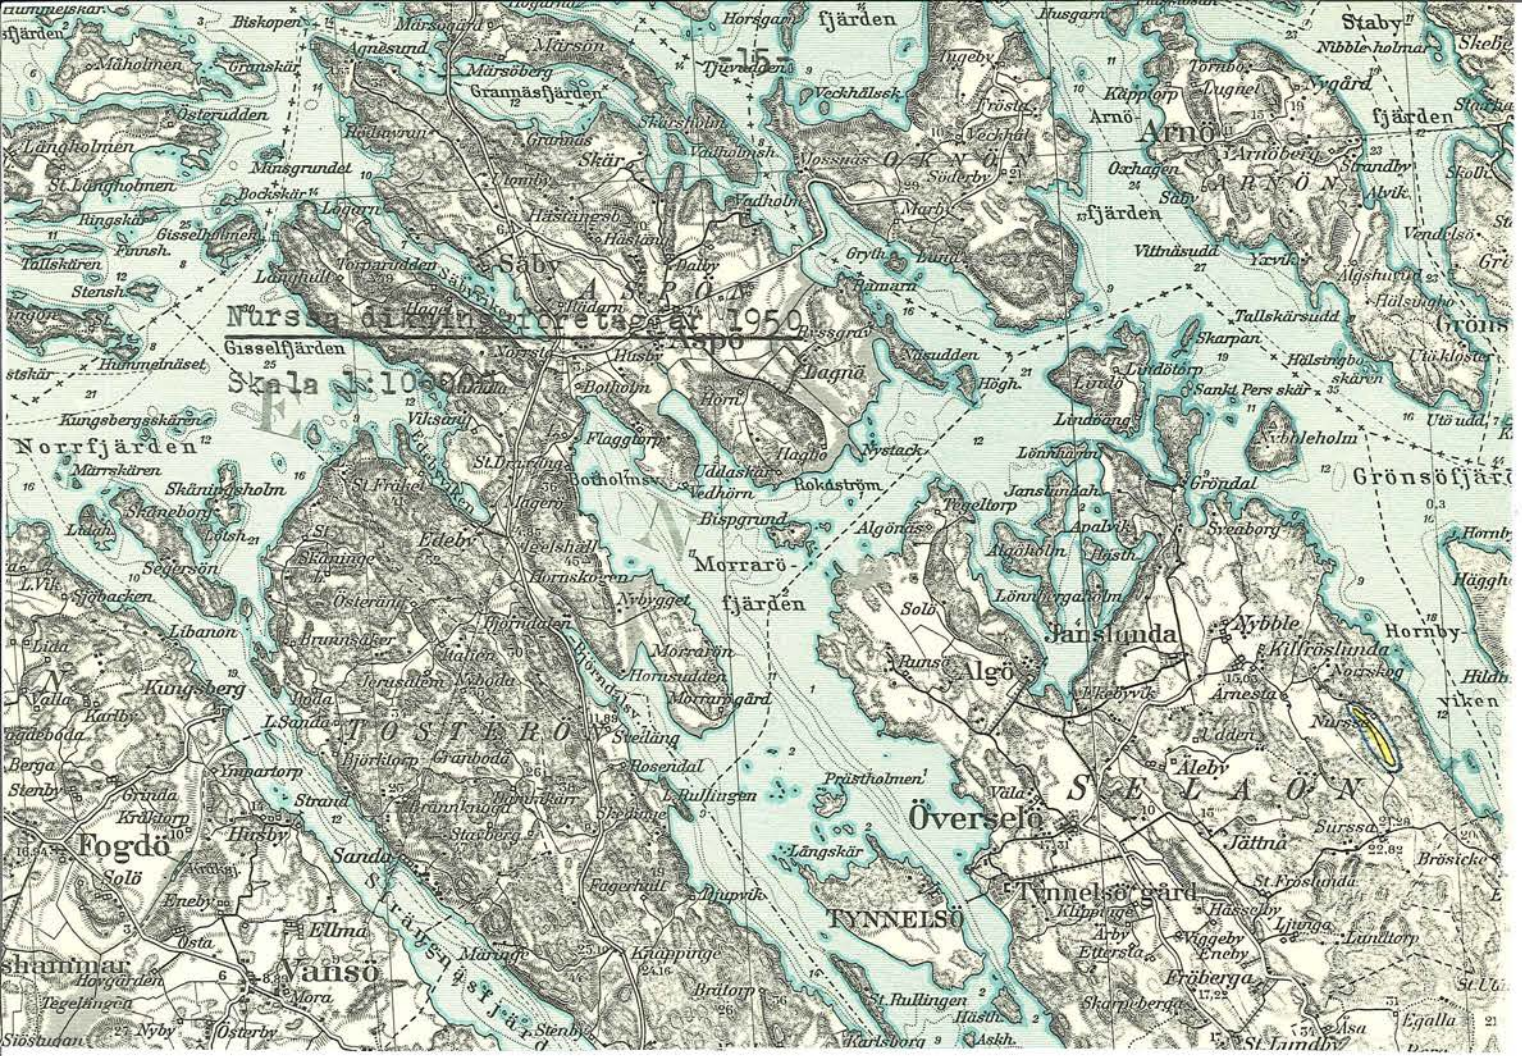

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avssende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande 1/2 mantal Nurssa 1 och 2 i Överselö socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsföretaget är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr 61 omkring 4 km ostnordost om Överselö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 9,60 ha åker.

Jordarten utgöres huvudsakligen av mullhaltig mellanlera -styvare mellanlera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet B-C-D-E-F-G-H-I-J medan sträckan A-B föreslagits öppen med en släntlutning av 1:1,25 och en bottenbredd av 0,3 meter.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och utgör c:a 25 ha, vilket till c:a hälften utgöres odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och till 1 liter pr sekund och hektar från skogsmark.

Dimensionering av det täckta avloppet har verkställts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbörds- område i ha	Avrinning lit/sek	Bottenlutn. o/oo	Rördim. mm	Avbördn.förm. lit/sek.
13+70	0,75	1	18	75	3
12+93	2	3	7,5	100	4
11+7	8	10,5	1	225	14

9+60	10	13,5	1	225	14
8+18	10	13,5	14	150	17,5
6+90	11	14,5	14	150	17,5
6+40	11	14,5	2,8	200	17,5
5+42	12	15,5	2	225	20
4+42	18	23	5	225	31
3+17	18	23	20	150	22
2+50	25	31,5	3	öppet dike	

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt, Stockholm. Vattnet har därvid befunnits innehålla 17 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 16 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig har någon särskild preparering av de till användning föreslagna betongrören ej ansetts erforderlig.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressentens egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.


De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma från marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med syneförrättningen har täckdikningsplan upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående markerna

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av förrättningsmannen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestäm-

Graderingsskala.

Nurssa dikningsföretag år 1950

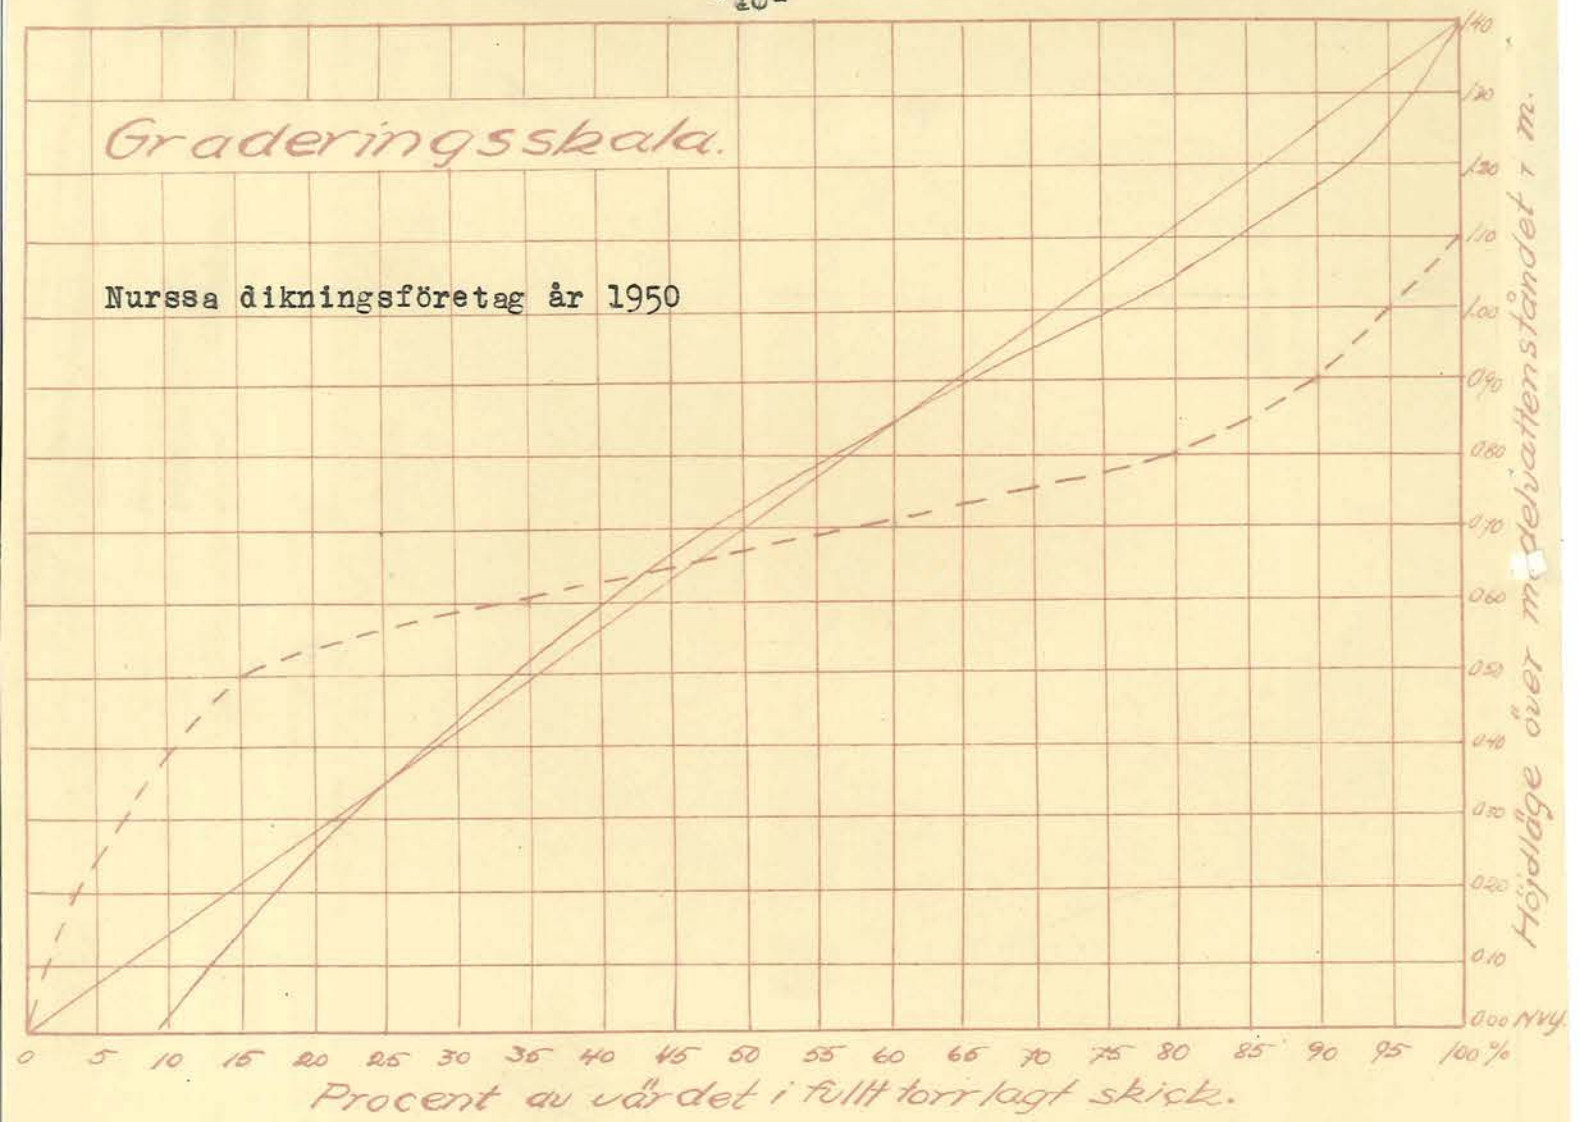

mandet av sistnämnda värde har hänsyn tagits uteslutande till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och har uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Beträffande ägofigurerna 1, 2, 3, 5 och 6 har de nuvarande värdet pr ha angivits till detsamma, som uppskattats som värde i fullt torrlagt skick för ovanstående ägofigurer i värderingslängden för Ärnesta-Nurssa torrlägningsföretag av år 1941. Beträffande värdet pr ha efter torrläggningen för ägofigur 1 har detta uppskattats till samma som före torrläggningen emedan nämnda ägofigur skall överföras till skogsmark.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att kunna bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 1086 meter igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 5.430:- kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör 9.620:50 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag (bilaga E) uppgå kostnaderna för avloppets utförande, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter, till 8.340:- kronor.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade föreskrifter och bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat för den
31 december 1956.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas,

att de upptagna jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter,

att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25 samt,

att öppning lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,

att arbetet utföres vid en sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas

att endast hela och fullgoda rör få användas,

att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsätts efter avvägning med utgång från fixpunkt,

att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,

att återfyllning sker till markytan eller till minst 1,0 meters höjd över rörledningen, samt

att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar; dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan-och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt. Jämförelseplanet är detsamma som gäller för Ärnesta-Nurssa torrlägningsföretag av år 1941.

1. Fixp. + 8,16 kors i berg 10 meter söder om punkt 2+68
2. Fixp. + 13,69 kors i berg 20 meter västsydväst om punkt 9+25
3. Fixp. + 13,75 kors i sten 18 meter västsydväst om punkt 10+80

Besiktning och avsyning.

Besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig förrättningsman eller av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:-kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Nurssa dikningsföretag år 1950 i Överselö socken av Södermanlands län.

Nurssa pr Överselö den 30 oktober 1950

Yngve Aulberg
förrättningsman.

Verkställighet och härstamning?

