

2819-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

D _____ 2*6481

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

U

Torrlägningsföretaget
Kilfröslunda-Kvarntorp
i Överselö socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 61 Mälaren-Norrström

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Ingkopping
19/10 1951

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 19/10 1951.
NÄMNDEN
LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt
den 27/11 1953. ☐ utan
☒ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
..... förbeteckning)

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Hilfröslunda-Kvarntorp
i Överselö socken, Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1948-1949 av
Martin Långström,
Statens lantbruksingenjör.

Har till två ritningar.

Protokoll fört vid sammanködet
under laga synförsamling med associerade
i förtid för tilläggning av värdepappers
mark, tillhörande Kiefröslunda och
Ämsta i Överselö socken, Södermanlands län.

Den 13 december 1948.

Sedan undertecknad, statens länsbanksingenjör, blivit på
därom gjord ansökning / Bil. A. / av Konungens Befallningshände
i länets förordnad / Bil. B. / att handläggas denna synförsam-
ling, hade sammanködet i ärendet utsatts att hållas förestående
dag klockan 3 e.m. hos nämndemannen Ragnar Karlson,
Kiefröslunda, till vilket sammanködet sakägarna blivit in-
skickade.

Å pålunda utsatta tid och plats för sammanködet
inställes sig undertecknad, statens länsbanksingenjör,
de för förädlungen tillkallade godemännen

P. Löfstedt, St. Lundby, och

H. Esterling, Våhls,

samt sakägarna

Ragnar Karlson, ägare av 5/16 msk Kiefröslunda 2^a och

5/32 " " 2³

Anna Kristina Karlson, " " 5/32 " 2^a och

5/16 " " 3^a

Arn Olofson, " " avst. Ämsta 5^a

skt.

Ansökningen om förädlungen samt Konungens Befall-

ringhvarvet i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§2.

Jär anmältes inte mot förvätningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt föreskriven godmansed.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vätevisjaka markerna verkställt genom förvätningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företogs i koncept och sammanhållet.

§4.

Näringsmännen Ragnar Karlsson och fru Anna Kristina Karlsson yrkade, att erforderligt avlopp skulle ges i upptagesfri om möjligt fullständig tilläggning av deras i företaget ingående marker, och att därvid påföljande skulle användas i största möjliga utsträckning över deras marker.

Kipmannen Kim Olofson yrkade, att avloppet över hans område även skulle igenläggas med rör ned till botten vid punkt 2⁺³⁵, samt förklara, att han inte hade ansökt om ersättning för skada och intrång genom uppremsning av avloppet redan för denna punkt.

§5.

Förvätningsmannen reträderade för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens ardegningsfonder,

4.
och förklarade intendenterna, att de önskar komma i åtnjutan
ande av sådant statsunderstöd. För så vitt de nämnda hade
sig bekant, hade statsunderstödet inte tidigare utgjut för tom-
läggning av den: företaget ingående marken.

§ 6.

Förvaltningsmannen meddelade, att sedan erforderlig ut-
redning verkställdt, nytt sammanträde i ärendet komma att
hållas i tid af plats, varför intendenterna skulle särskilt
kallas.

§ 7.

Ärendets protokoll upplästes och sammantriset avslutades.
Riksförslunda pr. Överskrift den 13 december 1948.

P. Händens signatur:

Karlén Lingsjö.

Statens landbruksingenjör.

P. Löfström K. Esterling

Biträdande godemän.

Den 23 februari 1949.

Försländas dag klockan 2 e.m. inställdes sig underståndet,
statens landbruksingenjör, och godemännen K. Esterling, Fåhr, hos
nämndemännen Ragnar Karlsson, Riksförslunda, för att fortsätta
denne nyreförvaltnings. För att såsom godemän biträda vid förvaltningen
hade därjämte införmit sig skiftesgodemännen K. R. Sten, Pann,
i stället för godemannen P. Löfström. S. Lundberg, som på grund av
sjukdom var förhindrad närvara vid förvaltningen.

Vid sammanträdet hade därjämte på kallade införmit sig

saligerna:

Ragnar Karlson, ägre av 5/16 mil. Riefriöslunda 2² al
5/32 " 5² 2³

Anna Kirstina Karlson, ägre av 5/32 " 5² 2⁴ al
5/16 " 5² 3²

Aron Olofson, " " and. Skresh 5.⁷

§ 8.

För anmälles ike med godemannen R. R. Steen, som hade
arlagt frierkiuren godemansen.

§ 9.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan förin sammankom-
det upprättade förslaget till förslagning av de i förslaget
ingående markerna, för de tillhörande beräknade kostnaderna, bit-
matsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Mr värde-
ringsslagens uppläses det för varje fastighet beräknade bitmats-
virket och mr kostnadsfördelningsslagens den för varje fastig-
het beräknade andelen: kostnaderna för förslaget.

§ 10.

Körmannen Aron Olofson ingick förklaring med påståendet om
förslagets riktiga enligt förklaringsskivorna / Bil. C. / som visade-
des genom nyremännens påskrift.

§ 11.

På grund av påskiftade frierkiurernas hade prov av grundvatten från
märkena undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de
närvarande resultatet av denna undersökning / Bil. D. /.

§ 12.

Den styrelse för förlaget utsågs nämndemannen Ragnar Karlsson, Kilfrishanda på Överselö, med uppdrag därtill att mottaga och förvara till förlaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskar granska eller taga avskrift av desamma.

§ 13.

Tryckmännens utlåtande upplästes, varefter herrns hänvisning lämnades under meddelande, att talen mot förvärdningen finna inom sex till dagar härpå anföras vid Österlundsens värdens hus i Stockholm.

§ 14.

Förvärdningens avlämnade Räkning för förvärdningen. Förvärdningsavskriften 279:- skulle inom tre till dagar härpå insättas i Kungl. Landtanksstyrelsens postgirokonton n. 1036.

Öriga förvärdningskostnader antecknas efter räkningen.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter styreförvärdningen förklarades avslutad.

Kilfrishanda på Överselö den 23 februari 1949.

Styrelsens ordförande:

Arvid Lindeholm.

Styrelsens landtanksingenjör.

R. Esterling

R. R. Pheen

Biträdande godemän.

2/2 125
92 J. R. 1944

Bil. A.

Ankom den
24 MAJ 1944
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Nyköping.

Fördesamt anhålls om förordnande för vederbörlig
statens landbruksinspektor, så enligt gällande bestämmelser
härav syne förvärdning för förvärdning av värdstjuka
marken till förordnad Kieprästlund nr. 2-3 i Överselå socken
Södermanlands län.

Fördraget, som omfattas av areal av c:a 15 ha
kommer således förordnad fastighet.

5/8 & 15/34 mtl. Kieprästlund nr. 2-3 Ögren Ragn. Karlsson.

Meddelande om förordnande ställs till under tecken.

Kieprästlund, Överselå den 28/5-1944
Fördesamt
Ragn. Karlsson.


LÄNSSTYRELSEN


I
SÖDERMANLANDS LÄN.N:o 12/92 D.R.1944.F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från Ragn.Karlsson,Kilfröslunda,Överselö,
hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lant-
bruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning
för torrläggning av vattensjuka marker,tillhörande Kilfröslunda
nr. 2 - 3 uti Överselö socken,förordnas statens lantbruksingenjör i
Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder,
som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansök-
ningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör,som har att om
mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 24 maj 1944.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S.Ljungstedt.)


(B.Löfström.)
Utan avgift.

F Ö R E N I N G

Undertecknad, ägare av avst. Ärnesta 5⁷, förklarar sig härmed göra gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kilfröslunda och Ärnesta i Överselö socken, Södermanlands län, med yrkande, att avloppet över mina marker även igenlägges med rör ned till bäcken vid punkt 2+35.

Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 1949.

H. Olofsson

Förestående förening vitsordas:

Sten Långström
Sten Långström

H. Olofsson

H. R. Lenn

Östlands godsmän

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis Nr. 2691.

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Ragnar Karlsson, Kilfröslunda, Överselö,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 22/12 1948.

Märkt: Kilfröslunda - Kvarntorp dikningsföretag.

Undersökningen har givet följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	19,6				
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	107,8	milligram	per	liter	
Aggr. " " " " "	2,2	"	"	"	"

Inlämnat enligt angivna anvisningar

Örebro den 28 dec. 1948

Analysavgift Kr. 5:20



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Avst. Ärnesta 5⁷.</u>										
2 Aron Olofson										
3 Åker, lermylla på lera	1		09			560	(1600) 800	240	21	60
4 " " " "	2		27			720	(1800) 990	270	72	90
5 " " " "	3		33			1620	1800	180	59	40
6 " " " "	4		20			1120	1600	480	96	--
7 " " " "	5		12			1120	1600	480	57	60
8 Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet B-3+4 =										
9 =67 m. à 4:-kr.									268	--
10 Summa	1-5	1	01						575	50
11 <u>5/16 mtl Kilfröslunda 2².</u>										
12 Ragnar Karlsson										
13 Äng, lera, något buskbeväxt	6			06		900	1000	100	6	--
14 Åker, lermylla på lera	7		23			1440	1800	360	82	80
15 " " " "	8		35			1440	1800	360	126	--
16 " " " "	9		20			900	1800	900	180	--
17 " " " "	10		48			990	1800	810	388	80
18 " " " "	11		12			990	1800	810	97	20
19 " " " "	12		32			1350	1800	450	144	--
20 " " " "	13		26			1440	1800	360	93	60
21 " " " "	14	1	00			1530	1800	270	270	--
22 " " " "	36		01			1620	1800	180	1	80
23 " " " "	37		35			630	1800	1170	409	50
24 " " " "	38		38			1440	1800	360	136	80
25 Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet 3+22-										
26 5+52 = 230 m. à 5:- kr.									1150	--
27 Summa	6-14,36-38	3	70	06					3086	50
28 <u>5/16 mtl Kilfröslunda 3².</u>										
29 Anna Kristina Karlsson										
30 Åker, lermylla på lera	15		64			1260	1800	540	345	60
31 " " " "	16		70			540	1800	1260	882	--
32 " " " "	17		45			540	1800	1260	567	--
33 Transport	15-17	1	79						1794	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	15-17	1	79						1794	60
Åker, lermylla på lera	18		29			1440	1800	360	104	40
" " " "	39		11			1710	1800	90	9	90
" " " "	40		09			1710	1800	90	8	10
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet 5+57- 6+76 = 119 m. à 5:- kr.									595	--
Summa	15-18,39,40	2	28						2512	--
5/32 mtl Kilfröslunda 2 ³ .										
Ragnar Karlsson										
Åker, lermylla på lera	19		09			1530	1800	270	24	30
" " " "	20		55			540	1800	1260	693	--
" " " "	21		27			450	1800	1350	364	50
" " " "	22		86			630	1800	1170	1006	20
" " " "	23		65			1440	1800	360	234	--
Äng, lera, något buskbeväxt	24			03		850	1000	150	4	50
" " " "	25			06		850	1000	150	9	--
Brukningsbåtnad genom rör- ledningen F-G.										
Sträckan 6+76-7+53=77 m à 5:-									385	--
" 7+53-8+53=100 m à 2:50									250	--
Summa	19-25	2	42		09				2970	50
5/32 mtl Kilfröslunda 2 ⁴ .										
Anna Kristina Karlsson										
Äng, lera, buskbeväxt	26			01		850	1000	150	1	50
Åker, lermylla på lera	27		36			450	1800	1350	486	--
" " " "	28		12			630	1800	1170	140	40
" " " "	29		05			720	1800	1080	54	--
" " " "	30		44			900	1800	900	396	--
" " " "	31		52			1620	1800	180	93	60
" " " "	32		08			630	1800	1170	93	60
" " " "	33		20			630	1800	1170	234	--
" " " "	34		60			630	1800	1170	702	--
" " " "	35		16			1620	1800	180	28	80
Transport	26-35	2	53		01				2229	90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport	26-35	2	53		01				2229	90
2	Brukningsbåtnad genom rör- ledningen F-G-H.										
3	Sträckan 7+53-8+53=100 m. à 2:50									250	--
4	" 8+53-H=80 m. à 4:-									320	--
5	Summa	26-35	2	53		01				2799	90
6	S a m m a n d r a g.										
7	Total										
8	Avst. Årnesta 5 ⁷ 18 har										
9	Aron Olofson	1-5	1	01						575	50
10	5/16 mtl Kilfröslunda 2 ²										
11	Ragnar Karlsson	6-14, 36-38	3	70		06				3086	50
12	5/16 mtl Kilfröslunda 3 ²										
13	Anna Kristina Karlsson	15-18, 39,40	2	28						2512	--
14	5/32 mtl Kilfröslunda 2 ³										
15	Ragnar Karlsson	19-25	2	42		09				2970	50
16	5/32 mtl Kilfröslunda 2 ⁴										
17	Anna Kristina Karlsson	26-35	2	53		01				2799	90
18	Summa	1-40	11	94		16				11944	40
19											
20	Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 1949.										
21	Å tjänstens vägnar:										
22	<i>Martin Ljunggren</i>										
23	Statens lantbruksingenjör.										
24	<i>W. Osterling</i> <i>K. R. Sjöström</i>										
25	Biträdande godemän.										
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Kilfröslunda-Kvarntorp i Överselö socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning åren 1948-1949.

(Timpenning 2:25 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
A 0+50-1+50	100	Rensning av slam, vattenväxter; buskar och rötter	100	1:-	100	--		
B 1+50-2+35	85	Schaktning av lera	10	2:50	25	--	125	--
B 2+35-6+76	441	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör. Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör av tät betong, blandning 1:3	440	5:50	2420	--		+ 84 --
		Schaktning av lera med något rötter	240	2:75	660	--		
		" " sten och grus med ensta- ka sprängstenar	15	6:-	90	--		
		Läggning av rören och återfyllning	440	1:25	550	--		
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring samt torvsättning vid punkt B	1	30:-	30	--		+ 10 --
		Kopplingsbrunn av 80 cm:s betongrör, blandning 1:3 med botten och lock av betong vid punkt C	1	60:-	60	--		+ 30 --
		Samlingsbrunnar av 60 cm:s rör av tät betong med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid punkterna D och E	2	90:-	180	--		+ 100 --
		Samlingsbrunn av 80 cm:s rör med konisk överdel av tät betong med botten och						
	626	Transport			3990	--	125	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	626	Transport			3990	--	125	--
		lock av betong samt stenfyllning kring			210			
		rören vid punkt F			120	--	4110	--
F H 10-12+15 -6+76	215	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör						
		av tät betong, blandning 1:3 lm.	209	4.00 820	27 689	752	50	
		Schaktning av lera	200	250	500	--		
		" " " , sten och grus genom						
		vägen vid punkt G	5	5:-	25	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	215	1:-	215	--		
		Samlingsbrunnar av 60 cm:s rör av tät						
		betong med botten och lock av betong						
		jämte stenfyllning kring rören vid						
		punkterna G och H st.	2	90:-	180	--		
		Stensil vid punkt 11+70			15	--	1687	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående belopp					577	50
Summa	841	Summa kronor					6500	--

Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 1949.

Anders Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för burläggningsförelaget Kilfröslunda - Kvarnby i Överselö socken,
Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1948-1949.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S-såskande till företaget	Jordförbättringsvärde		Repartitionstal	Kostnad för				Summa kostnad
					torrläggningen		syneförrättningen		
		Kr.	ö. öre		%	Kronor och öre			
1.	2.	3.		4.	5.		6.		7.
Avst. Årnesta 5 ⁷									
Arne Olofsson	S	575	50	4.8181	313	18	18	38	331 56
5/16 mbl Kilfröslunda 2 ²									
Ragnar Karlsson	S	3086	50	25.8406	1679	64	98	58	1778 22
5/16 mbl Kilfröslunda 3 ²									
Anna Kristina Karlsson	S	2512	-	21.0308	1367	-	80	23	1447 23
5/32 mbl Kilfröslunda 2 ³									
Ragnar Karlsson	S	2970	50	24.8694	1616	51	94	88	1711 39
5/32 mbl Kilfröslunda 2 ⁴									
Anna Kristina Karlsson	S	2799	90	23.4411	1523	67	89	43	1613 10
Summa		11944	40	100.0000	6500	-	381	50	6881 50

Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 1949.

Å hänsens vägnar:
Karin Ringström

Stadens landbruksingenjör.

W. Osterling

H. R. Steen

Behörande godemän.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kilfröslunda och Ärnesta i Överselö socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr 61 omkring 4 kilometer nordost om Överselö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 12,10 har, varav 11,94 har åker och 0,16 har ängsmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet A-B samt utförande av rörledningen B-C-D-E-F-G-H.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar för det öppna avloppet en areal av 7,2 km². För rörledningen utgör nederbördsområdet 45 har, och har dess storlek vid olika punkter angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har för det öppna avloppet A-B beräknats efter

80 sekundliter pr km^2 till $0,58 \text{ m}^3/\text{sek}$. För rörledningen har avrinningen vid flöden beräknats efter 1,2 - 1,5 sekundliter pr har.

Det öppna avloppet A-B skall utföras med en bottenbredd av 0,5 meter, en sidolutning av 1:1,25 och en bottenlutning av 3:1000.

Rörledningen skall utföras av 30 cm:s (12") betongrör å sträckan B-C-D-E-F och av 22,5 cm:s (9") betongrör å sträckan F-G-H. Minsta bottenlutningen är 2:1000. Vid rörledningen skall anordnas trumöga av betong vid punkt B, kopplingsbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkt C, samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkt F och av 60 cm:s betongrör vid punkterna D, E, G och H och en stensil vid punkt 11+70 i enlighet med härför upprättade ritningar. I brunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla 2,2 milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 19,6 grader. Då vid sådant förhållande vattnet praktiskt taget icke har någon angreppsförmåga på betong, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola vara utförda med en blandning 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Genom anordnandet av rörledning bliva några brobyggnader icke erforderliga.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats ^{såväl} i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i för-

hållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna och möjligheten att lägga igen motsvarande öppna avlopp inom den odlade jorden har beräknats brukningsbåtnad efter 4:- kronor pr meter avlopp för sträckorna B-3+4 och 8+53-H, och efter 5:- kronor pr meter för sträckan 3+22-8+53. De till Kilfröslunda hörande fastigheterna ligga i sambruk och ägarna äro äkta makar.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 11,944:40 kronor, varav alstringsbåtnad 8.726:40 och brukningsbåtnad 3.218:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 6.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

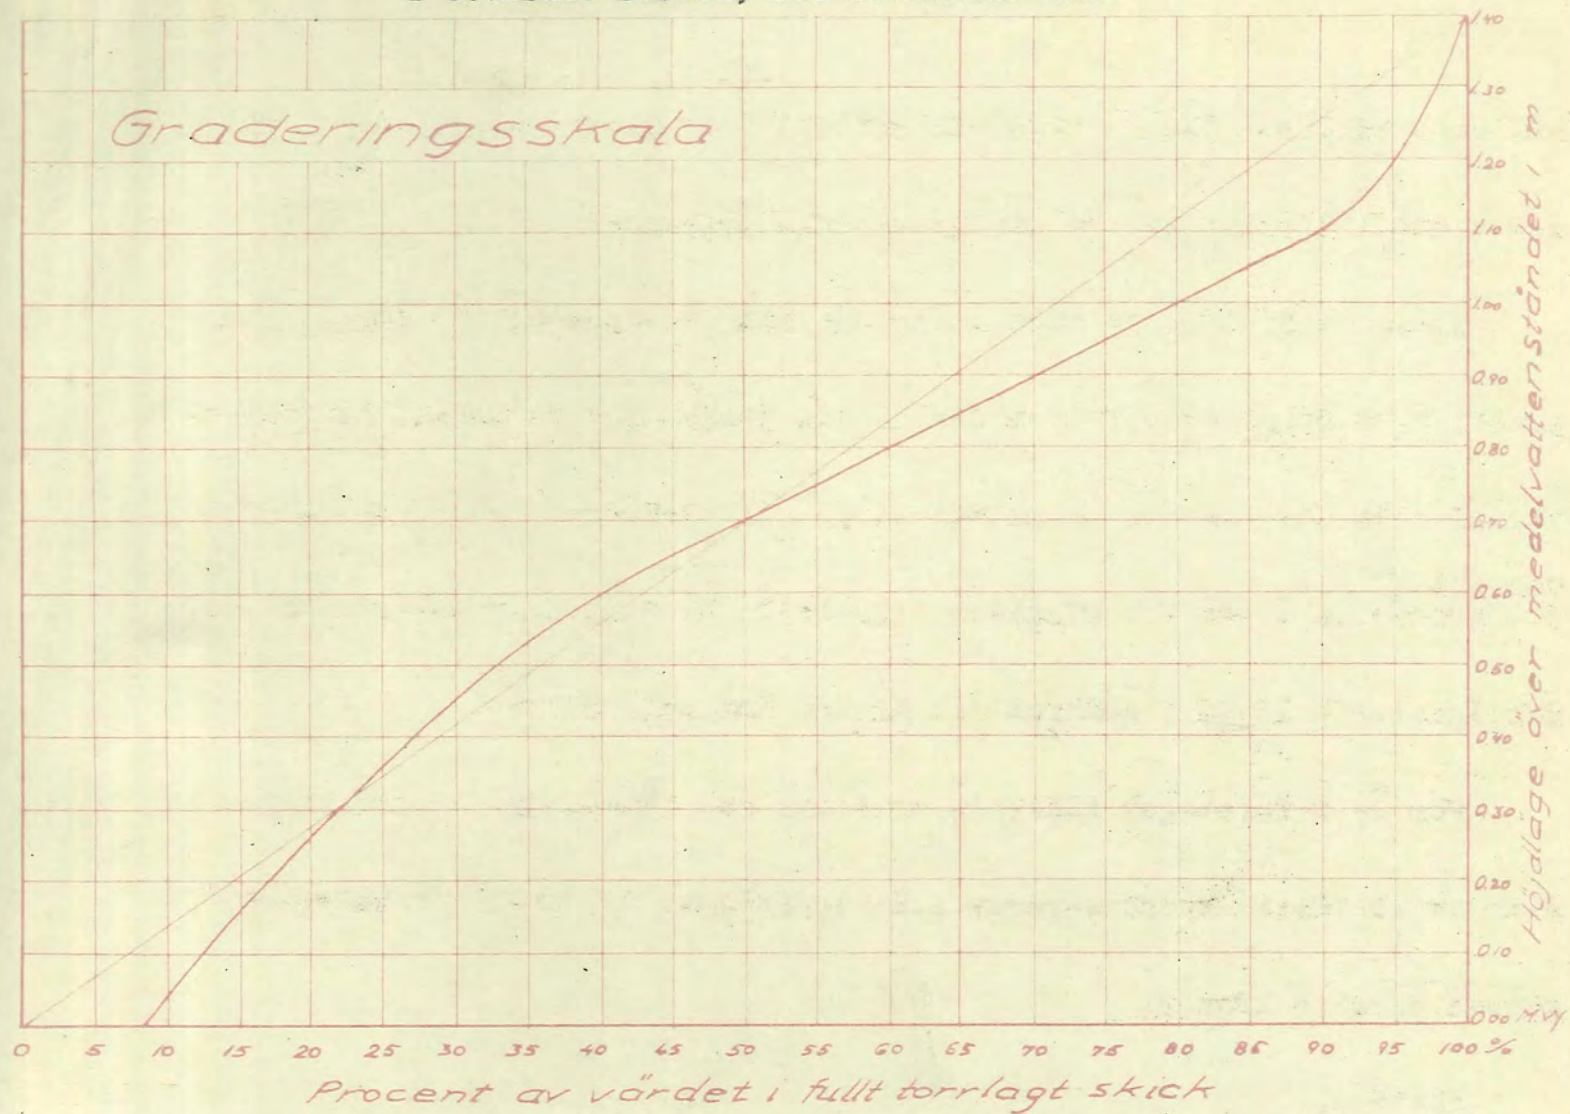
Ersättningar.

Ägaren av Ärnesta 5⁷ har under syneförrättningen förklarat, att han icke hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom eventuell breddning och uppläggning av jordsträngar vid rensning av det öppna avloppet. Någon ersättning skall sålunda icke utgå härför och skall ej heller ifrågakomma vid framtida rensningsarbeten vid företaget.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse så-

Torrlägningsföretaget Kilfröslunda-Kvarntorp
i Överselö socken, Södermanlands län.



som en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet beräknade båtnadsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade föreskrifter.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1958.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden till-

27.
stampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till 1,0 meters höjd över rören, att sten icke får placeras ovanpå rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst 5 meter från rörledningen.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfast sten såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar, nämligen

Fixp. 1. + 8,54 m., ring i berg, 17 meter söder om punkt C.

Fixp. 2. +10,68 m., ring i sten, 75 meter nordost om punkt H.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året, det öppna avloppet skall grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna

islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 17 kronor och 92 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

26.
Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Kilfröslunda-Kvarntorp i Överselö socken, Södermanlands län.

Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 1949.

Å tjänstens vägnar:

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör.

Westerling

H. R. Åker

Biträdande godemän.

Nr. i resplan 3:8/49.

Torrläggningsföretaget Kilfröslunda - Kvarntorp i Överselö socken, Söderman-
(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)
lands län.

Åtgärden omfattar tiden 21/11 1945 - 23/2 1949.

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			27.9	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			27.9	--

Anmärkningar:.....

.....

.....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Kilfröslunda pr Överselö den 23 februari 19 49.

Arvid Långström
lantbruksingenjör

Övriga förräkningskostnader.

Inbindning av handlingarna	4:-	4:-
Försälkning till godsevännen		40 -
Handläggning o. d.		50 -
Kostnad för vallanalys		8.50
Summa kronor		102.50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Torrlägningsföretaget Kilfröslunda - Kvarntorp i Överselö socken, Söderman-lands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 21/11 1945 - 23/2 1949.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	123	--		
2,4 % av 6.500:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	156	--		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	279	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			279	--
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			279	--

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			279	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			279	--

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 23 februari 1949 överlämnats till
~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~
nämndemannen Ragnar Karlsson, Kilfröslunda, Överselö,
(titel, namn och adress)
i egenskap av styrelse för företaget.
Nyköping den 26 februari 1949.
Anten Hingstam
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.~~
Granskad den 17/51 av

