

3 629 - 2

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

D _____ 2*6490

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H a n d l i n g a r

rörande

ÅRHAMMARS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 (Tegel-
bruksskiftet) i Nykyrka socken, Söderman-
lands län, upprättade vid laga syneför-
rättning år 1950 av

YNGVE OMBERG
agronom.

And. K. S. arkiv 28/53

H A N D L I N G A R

rörande

Å R H A M M A R S D I K N I N G S F Ö R E T A G Å R 1950

(Tegelbruksskiftet)

i Nykyrka socken, Södermanlands län

upprättad vid laga syneförrättning år 1950 av

YNGVE OMBERG

agronom

Härtill två blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning med avseende å före-
tag för torrläggning av vattensjuka marker
tillhörande Århammar i Nykyrka socken av
Södermanlands län.

Den 29 december 1950.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord
ansökan (bilaga A) av torrlägningsnämnden i länet föreslagen (bila-
ga B) och av länsstyrelsen i länet förordnad (bilaga C) att handlägga
denna syneförrättning, hade genom brev till sakägaren (bilaga D) sam-
manträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 11,00
å Århammars Gård, Stigtomta.

Å sålunda utsatt tid och plats för samman-
trädet inställde sig undertecknad och kapten E. von Heland, ägare till
Århammar 2¹.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen, länsstyrel-
sens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnan-
det hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna verk-
stälts genom förrättningsmannens försorg.

§ 3.

På grund av särskilda föreskrifter hade
prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens lantbrukske-
miska kontrollanstalt, Stockholm, och delgavs resultatet av denna un-
dersökning (bilaga E).

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade att erfor

derligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av sina i företaget ingående marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. Den sökande yrkade vidare att avloppet helst borde igenläggas med rör.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom de härför beräknade kostnaderna.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder och förklarade sig intressenten önska komma i åtnjutande av endast bidrag. För så vitt de närvarande hade sig bekant hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken

§ 7.

Beslöts att akterna för företaget skulle förvaras vid Århammars Gård, Stigtomta.


§ 8.

Förrättningsmannens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning senare skulle tillställas kapten E. von Heland, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Århammar pr Stigtomta den 29 december 1950


förrättningsman.

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
ink.d.18/7 1946 Nr 71
Behandl.i prot.d.15/8 1946 § 6.
Besv.d.21/8 1946 Nr 48.

Ankom den 26 aug.1946 till
Landskansliet i Nyköping

Till Länsstyrelsen

NYKÖPING

Härmed har jag äran anhålla om förordnande för behörig hushållningssällskapets tjänsteman att enligt gällande vattenlag för torrläggning av vattensjuka marker och i och för erhållande av statsbidrag verkställa förrättning å mig tillhöriga fastigheten Århammar i Nykyrka socken, Södermanlands län.

Förrättningen avser bättre torrläggning och igenläggning av öppna avloppsdiken å nedan angivna av varandra oberoende områden:

- 1) Sundsängen, c:a 1000 m avlopp och berörande c:a 10 ha åker
- 2) Hemskiftet, c:a 700 m avlopp och berörande c:a 8 ha åker
- 3) Tegelbruksskiftet, c:a 800 m avlopp och berörande c:a 12 ha åker.

Samtliga ovan nämnda företag beröra endast Århammar


En del berörd mark är redan planlagd för täckdikning genom Hushållningssällskapets försorg och övrig mark önskas planlagd för täckdikning i samband med planläggningen för avloppens igenläggning.

Planläggningen önskas utförd i den ordning de olika områdena upptagits härövan och om möjligt så, att första området (Sundsängen) kan dikas redan innevarande höst.

Århammar, Stigtomta den 16 juli 1946

ERIK VON HELAND

Rätt avskrivet intygar:



Södermanlands läns K.
Hushållningssällskap
Nyköping

Ankom den 26 aug. 1946 till
Landskansliet i Nyköping

Nr 46/4 D.R. 1946

Till Länsstyrelsen i Södermanlands län

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s nr 344/1945. § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Erik von Helands, Århammar, Stigtomta, rörande Sundsängen, Hemsiftet och Tegelbruksskiftet, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Ansökan bifogas

Nyköping den 21 augusti 1946

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län

ROBERT V. WENNBERG

Rätt avskrivet intyga:



Länsstyrelsen
i Södermanlands län

SIGILL

N:o 46/4 D.R. 1946

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av godsägaren Erik von Heland, Århammar, Stigtomta, gjord, av torrlägningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för behörig hushållningssällskapets tjänsteman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Århammar i Nykyrka socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, bitädande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 3 september 1946

På Länsstyrelsens vägnar:

S. LJUNGSTEDT

B. LÖFSTRÖM

Utan avgift.

Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Rätt avskrivet intyga:




Kapten E.von Heland

Århammar, S t i g t o m t a.

Sedan undertecknad blivit av Länsstyrelsen förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Århammar i Nykyrka socken, Södermanlands län, får jag meddela att sammanträde kommer att hållas å Århammar fredagen den 29 december 1950 klockan 11.00, då Ni har att tillstädeskomma för utförande av Eder talan

Nyköping den 14 december 1950


förrättningsman.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 36/1950-51

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
 agronom Yngve Omberg, Nyköping,
för räkning Århammar i Nykyrka socken, Södermanlands län,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. på 1 st 800 ml och 1 st 400 ml vichyflaskor den 24/7.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet	13 tyska grader
Aggressiv kolsyra	24 milligram per liter
Sulfat, SO ₃	13 " " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 1 augusti 1950.

Nils Bengtsson

.....
Föreståndarens ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+0-		<u>Avloppet A - B.</u>				
0+33	33	Schaktning av lera ³ m	20	2:50	50:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			10:-	60:-
0+33-		<u>Avloppet B - C.</u>				
0+38	5	Schaktning av lera lm	5	1:-	5:-	
		Inköp av 30 cm(12")betong- rör (1 m långa)	5	5:50	27:50	
		Inköp av 30 cm(12")broöga st	1	9:80	9:80	
		Inköp av 60 cm(24")betong- rör (1 m långa, brunn) st	2	18:50	37:-	
		Inköp av 60 cm brunnslock "	1	8:50	8:50	
		Läggning och igenfyllning lm	5	1:-	5:-	
		Arbete med brunn st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			17:20	150:-
0+38-		<u>Avloppet C - D.</u>				
2+21	183	Schaktning av lera lm	183	0:75	137:25	
		Inköp av 22,5 cm(9")betong- rör (1m långa)	183	3:60	658:80	
		Inköp av 45 cm(18")betong- rör (1 m långa, brunn) st	1	12:40	12:40	
		Inköp av 45 cm brunnslock "	1	5:75	5:75	
		Läggning och igenfyllning lm	183	1:50	274:50	
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			106:30	1.220:-
2+21-		<u>Avloppet D - E.</u>				
2+86	65	Schaktning av lera lm	65	1:-	65:-	
	286	Transport			65:-	1.430:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	286	Transport			65:-	1.430:-
		Inköp av 30 cm(12")betong- rör (1 m långa)	lm 65	5:50	357:50	
		Inköp av 60 cm(24")betong- rör(1 m långa,brunn)	st 1	18:50	18:50	
		Inköp av 60 cm brunnslock	" 1	8:50	8:50	
		Läggning och igenfyllning	lm 65	1:50	97:50	
		Arbete med brunn	st 1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			58:-	630:-
2+86-		<u>Avloppet E - F.</u>				
3+72	86	Schaktning av lera	lm 86	1:-	86:-	
		Inköp av 30 cm(12")betong- rör (1 m långa)	" 86	5:50	473:-	
		Inköp av 60 cm(24")betong- rör (1 m långa,brunn)	st 2	18:50	37:-	
		Inköp av 60 cm brunnslock	" 1	8:50	8:50	
		Läggning och igenfyllning	lm 86	1:-	86:-	
		Arbete med brunn	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			69:50	800:-
3+72-		<u>Avloppet F - G.</u>				
4+24	52	Schaktning av lera	lm 52	1:-	52:-	
		Inköp av 30 cm(12")betong- rör (1 m långa)	" 52	5:50	286:-	
		Inköp av 60 cm(24")betong- rör (1 m långa,brunn)	st 1	18:50	18:50	
		Inköp av 60 cm brunnslock	" 1	8:50	8:50	
	424	Transport			365:-	2.860:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	424	Transport			365:-	2.860:-
		Läggning och igenfyllning lm	52	1:-	52:-	
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			48:-	490:-
4+24-		<u>Avloppet G - H.</u>				
5+74	150	Schaktning av lera lm	150	0:75	112:50	
		Inköp av 175 mm(7") tegelrör "	150	2:31	346:50	
		Inköp av 22,5 cm(9") betong- rör(1 m långa, brunnskoppl) st	2	3:60	7:20	
		Inköp av 45 cm(18") betong- rör (1 m långa, brunn) "	1	12:40	12:40	
		Inköp av 45 cm brunnslöck "	1	5:75	5:75	
		Läggning och igenfyllning lm	150	1:50	225:-	
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			75:65	810:-
5+74-		<u>Avloppet H - I.</u>				
6+21	47	Schaktning av lera lm	47	1:-	47:-	
		Inköp av 22,5 cm(9") betong- rör(1 m långa) "	47	3:60	169:20	
		Inköp av 45 cm(18") betong- rör (1 m långa, brunn) st	2	12:40	24:80	
		Inköp av 45 cm brunnslöck "	1	5:75	5:75	
		Läggning och igenfyllning lm	47	1:50	70:50	
		Arbete med brunn st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			32:75	390:-
	621	Transport				4.550:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	621	Transport				4.550:-
6+21-		<u>Avloppet I - J.</u>				
6+90	69	Schaktning av lera	lm 69	1:-	69:-	
		Inköp av 22,5 cm(9")betong- rör (1 m långa)	" 69	3:60	248:40	
		Inköp av 45 cm(18")betong- rör (1 m långa,brunn)	st 1	12:40	12:40	
		Inköp av 45 cm brunnslock	" 1	5:75	5:75	
		Läggning och igenfyllning	lm 69	1:-	69:-	
		Arbete med brunn	st 1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			40:45	470:-
6+90-		<u>Avloppet J - K.</u>				
8+15	125	Schaktning av lera	lm 125	0:75	93:75	
		Inköp av 175 mm(7")tegelrör	" 125	2:31	288:75	
		Inköp av 22,5 cm(9")betong- rör (1 m långa,brunnskoppl)	" 2	3:60	7:20	
		Inköp av 45 cm(18")betong- rör (1 m långa,brunn)	" 2	12:40	24:80	
		Inköp av 45 cm brunnslock	" 1	5:75	5:75	
		Läggning och igenfyllning	lm 125	1:-	125:-	
		Arbete med brunn	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %			64:75	650:-
	815	Summa				5.670:-

Århammar pr Stigtomta den 29 december 1950

Göran Andersson
förrättningsman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nykyrka socken.</u>							
<u>1 mtl Århammar 2</u>							
E.von Heland							
åker, mullhaltig mellanlera	1	0,32		1360	1600	240	76:80
" "	2	0,24		1440	1600	160	38:40
" "	3	0,07		1560	1600	40	2:80
" "	4	0,04		1560	1600	40	1:60
" "	5	1,23		800	1600	800	984:-
" "	6	1,14		720	1600	880	1.003:20
" "	7	0,69		880	1600	720	496:80
" "	8	0,25		1360	1600	240	60:-
" mullhalt.lättare "	9	0,07		1560	1600	40	2:80
" "	10	0,10		1560	1600	40	4:-
" mullhaltig mellanlera	11	0,70		1360	1600	240	168:-
" "	12	0,57		720	1600	880	501:60
" "	13	0,95		720	1600	880	836:-
" "	14	0,47		1440	1600	160	75:20
" "	15	0,35		1440	1600	160	56:-
Summa	1-15	7,19					4.307:20
Härtill kommer bruksbåtnad för							
sträckan 0+38-2+36 = 198 meter á 3:- = 594:-							
sträckan 2+36-8+15 = 579 meter á 5:- = 2.895:-							
Summa kronor						7.796:20	
Århammar pr Stigtomta den 29 december 1950							
<i>Gunnar Axelberg</i> förrättningsman.							


ARVODESRÄKNING.

för laga syneförrättning angående Århammars dikningsföretag år 1950
(Tegelbruksskiftet) i Nykyrka socken av Södermanlands län, upprättad
enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	171:26
Grundvattenanalys	8:45
Ljuskopiering	8:-
Inbindning av förrättningshandlingar	<u>4:-</u>
Summa kronor	<u>191:71</u>

Århammar per Stigtomta den 29 december 1950


förrättningsman.

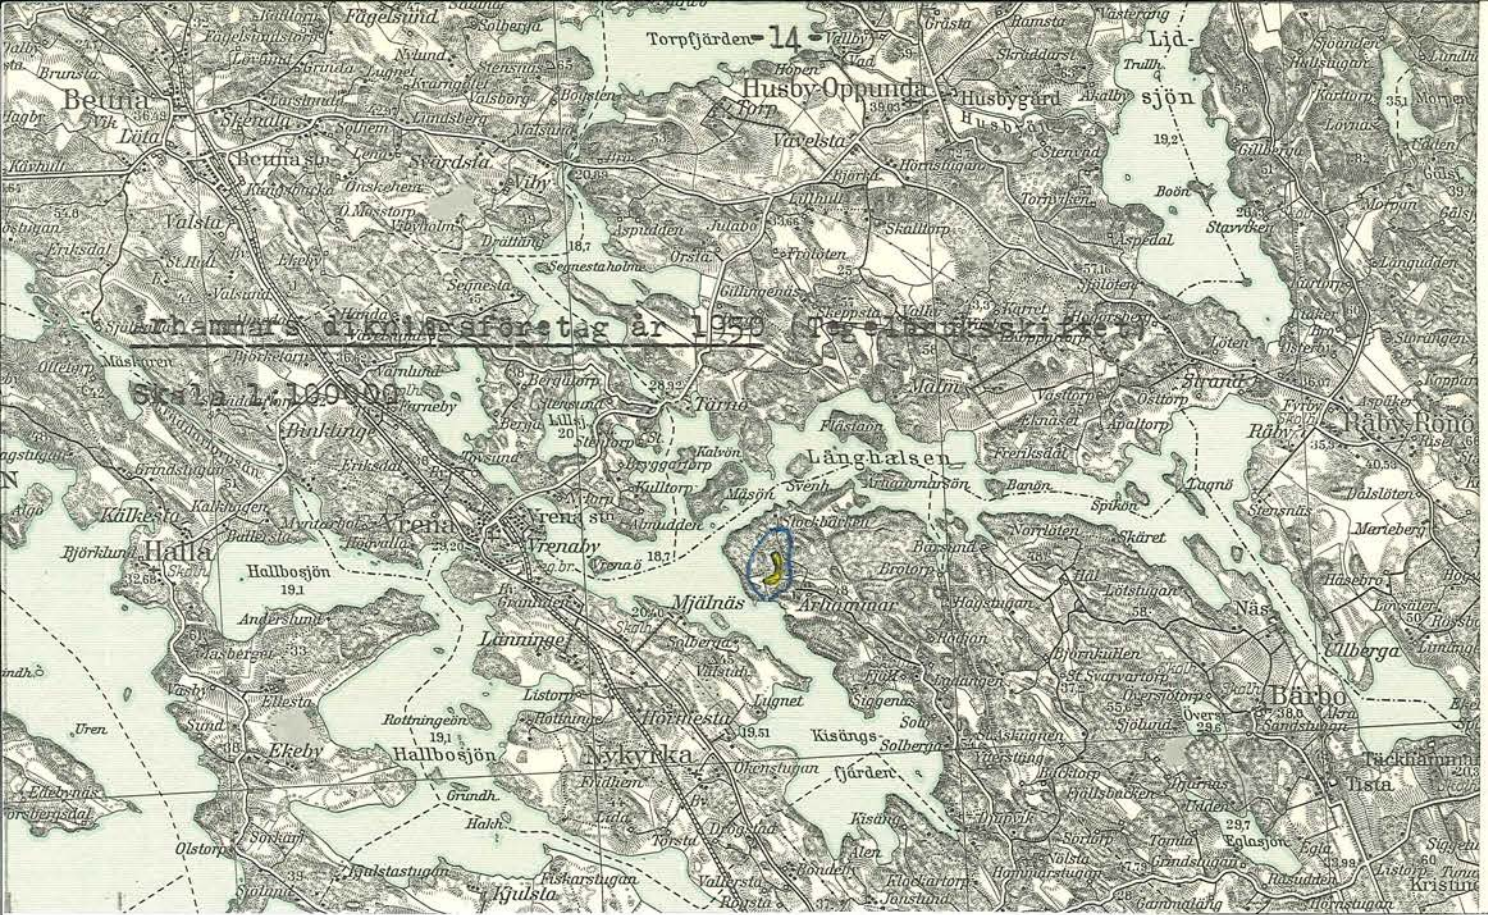

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande 1 mtl Ärhammar 2¹ i Nykyrka socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsföretaget är beläget inom Nyköpings-åns nederbördsområde nr 65 omkring 3 km nordost om Nykyrka kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 7,19 ha åker.

Jordarten utgöres inom begränsningskurvan av huvudsakligen mullhaltig mellanlera på botten av mellanlera-styv lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan-och profilritningar angivna avloppet B-C-D-E-F-G-H-I-J-K medan avloppet A-B föreslagits öppet med en släntlutning av 1:1,25 och en bottenbredd av 0,3 meter.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 50 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/3 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar från åker och till 1 liter per sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,1 liter per sekund och hektar.

Dimensionering av det täckta avloppet har verkställts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbörds- område i ha	Avrinning lit/sek	Bottenlut- ning i o/oo	Rördim. i mm.	Avbördn.förm. lit/sek.
8+15	12	12	6	175	16

6+90	22	22	2,5	225	22
6+21	28	30,5	5	225	30
5+74	28	30,5	19	175	30
4+24	33	35,5	1,5	300	37
3+72	38	44	2,1	300	44
2+86	39	45	2,1	300	44
2+21	45	51	14,5	225	52
0+38	50	58,5	4	300	60

Undersökning av grundvatten från markerna

har verkställt av Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 24 milligram aggressiva syror per liter och har en karbonathårdhet av 13 tyska grader. Då vid sådant förhållande har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild preparering av de till användning föreslagna betongrören ej ansetts erforderlig.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressentens egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.


Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma från de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med syneförrättningen har täckdikningsplaner upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående markerna i den mån detta ej gjorts tidigare.

Graderingsskala.

Århammars dikningsföretag år 1950 (Tegelbruksskiftet)

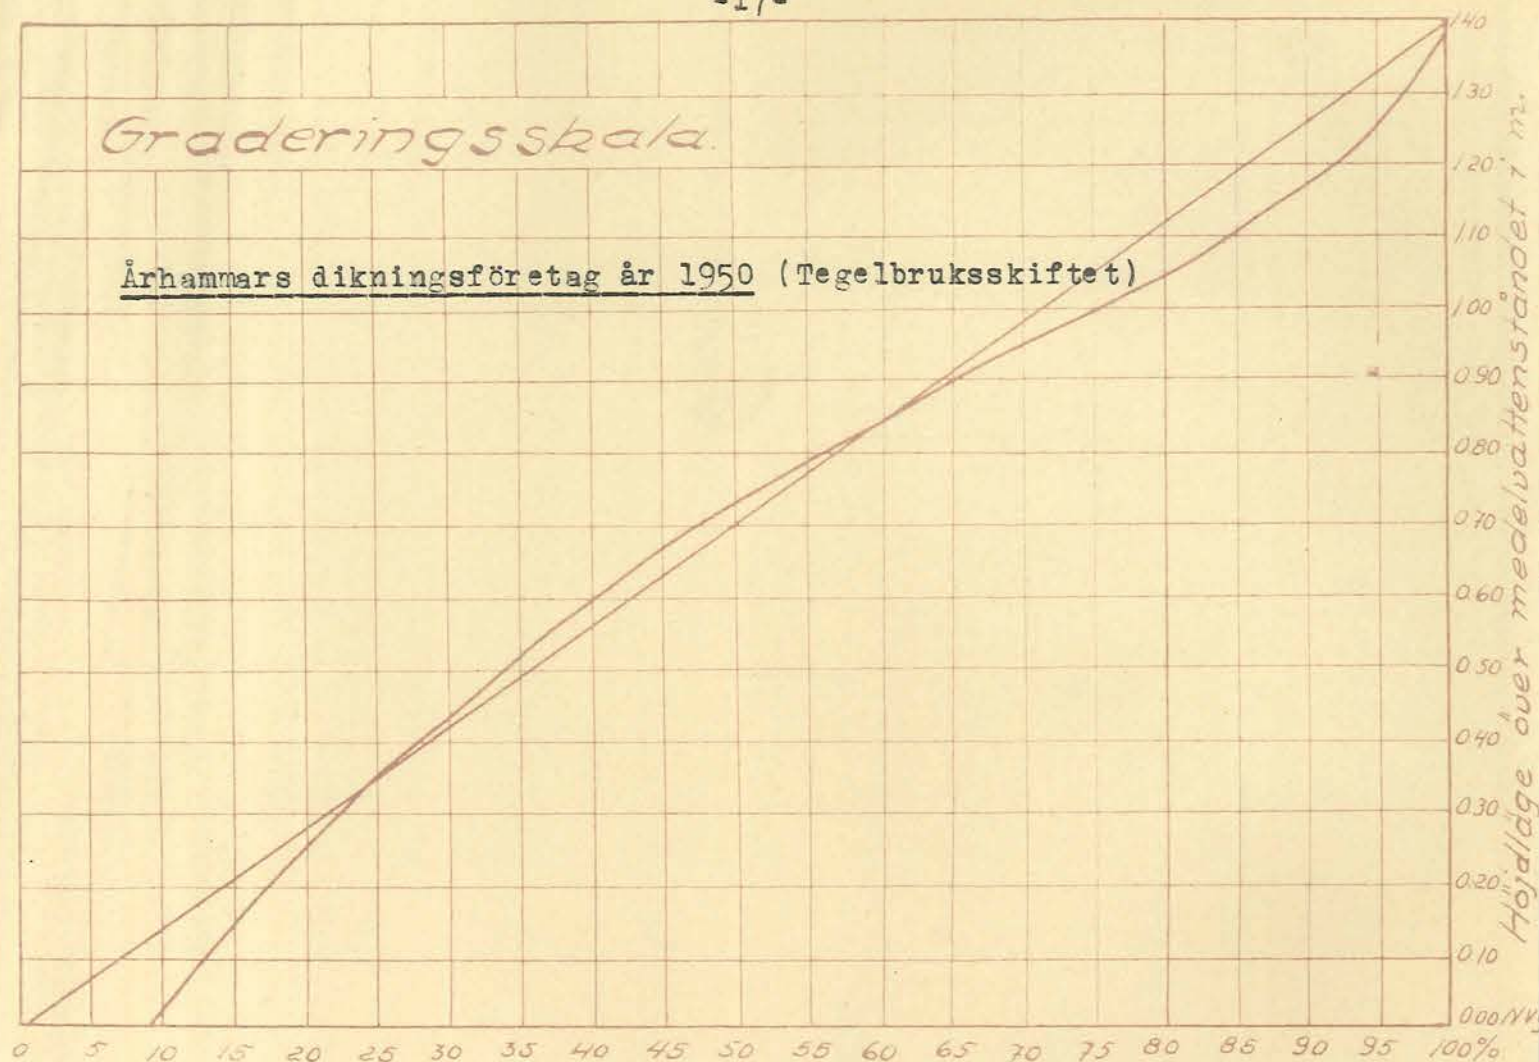

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av förrättningsmannen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattas med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och har uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att kunna bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 777 meter igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 3.489:- kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör kronor 7.796:20

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets utförande till 5.670:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställtts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1956.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,
att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,
att endast hela och fullgoda rör få användas,
att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta

riktmallar. Dessa riktmallar utsättas efter avvägning med utgång från fixpunkt.

att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,

att återfyllning sker till markytan, samt

att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Vid utförandet av öppna avloppet skall iakttagas

att de upptagna jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter,

att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25,

att öppning lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje höglöde.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna från avloppets mitt. Fixpunkterna hänföra sig till Sveriges normalnollplan.

1. Fixp. + 23,43 kors i berg 38 meter öster om punkt 1+38
2. -Fixp. + 24,32 kors i berg 26 meter sydost om punkt 2+36
3. Fixp. + 25,17 kors i berg 40 meter västnordväst om punkt 4+74

Besiktning och avsyning.

Besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig förrättningsman eller av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör

Avgift till vattendomstol+

Avgift till vattendostolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:- kronor.


Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill eljest någon föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattenämstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företagets har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Ärhammars dikningsföretag år 1950 (Tegelbruksskiftet) i Nykyrka socken av Södermanlands län.

Ärhammar per Stigtomta den 29 december 1950


förrättningsman.

