

157 53

3805-3

E

3*1133
Ser. E XIII komb
3805
Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
22. 10. 1952
22. 10.

Varje Lantbrukare skall ha
sin

E 3*1133
Alsäters dikningsföretag år 1951,
Norrköpings stad,
Östergötlands län .
Synehandlingar.


län
1952

med län 29/6 53
bete 23 53

Alsäters dikningsföretag år 1951,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Alsäter,
Krogstorp och Väsentorp i Norrköpings
stad, Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.

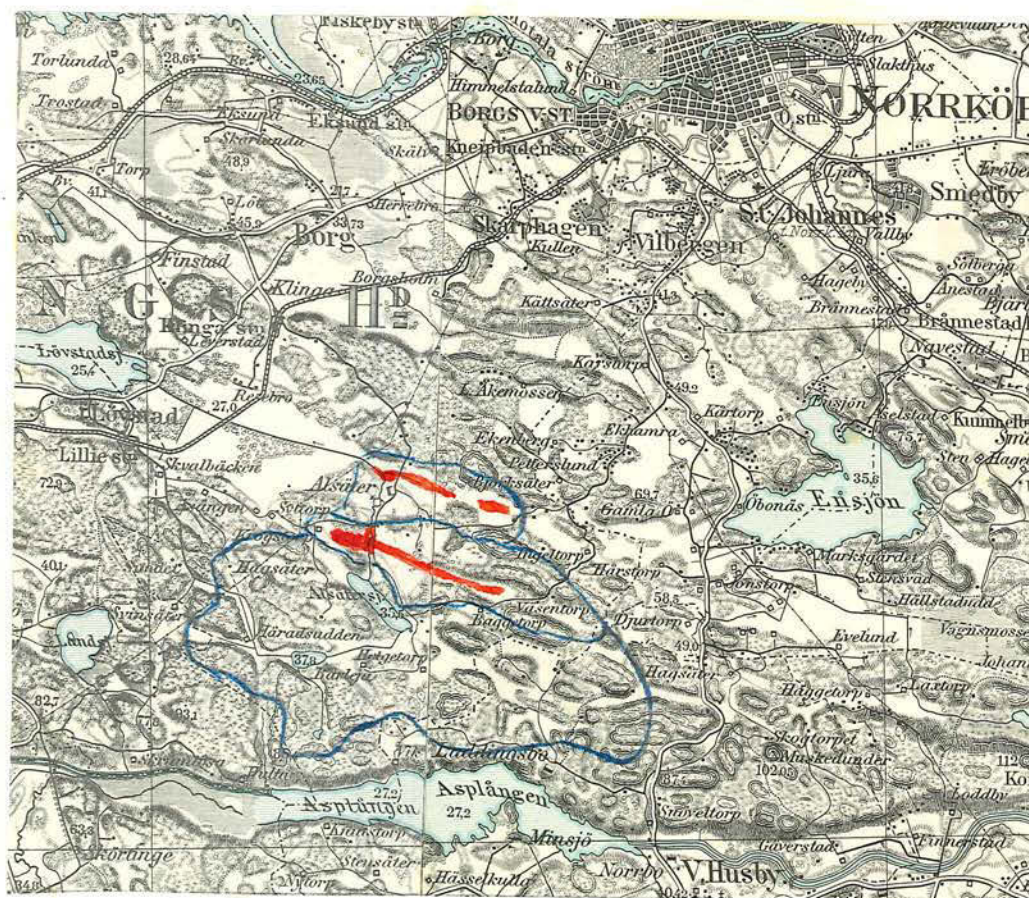

Skala 1:100 000.

Protokoll, fört vid spånförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utföran-
de av avloppsdiken för torrläggning av
mark inom Alsäter, Krogstorp och
Väsentorp i Norrköpings stad, Östergöt-
lands län.

År 1950, den 6 november, kl. 4 em. inställde sig underteck-
nad förrättningsman hos Karl Törnquist i Alsäter för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Borgs kyrka,
varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade för-
teckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ernst Nilsson i Aspa och Carl Erik Eriksson i
Lundby.

Sökande till förrättningen:

Karl Törnquist, stadsägorna 634 samt 635 och 665 i Norrköpings
stad. (Alsäter) ordförande i styrelsen för Heljetorps vägsam-
fällighet.

Övriga sakägare:

G.E.Lööv, stadsäga 635 (Krogstorp)

Skogvaktaren T.Thalén för Memmings häradsallmanning tillhöriga
stadsäga 643 (Väsentorp) samt som ordförande i styrelsen för
Lillie vägsamfällighet.

§ 1.

Upplästes ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Alsätersgård ligger 6 km. sydväst om Norrköpings stad. Företaget omfattar torrläggning av två från varandra skilda dikningsområden, nämligen Norra området omedelbart norr om gården och Södra området 500 m. söder om gården. Den i de båda områdena ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Sökanden påyrkade utförande av följande avlopp:

Inom Norra området:

1. Alsätersbäcken, sträckan 0-50 - 4+15 från övre delen av "Lövestad - Resebro vattenavledningsföretag" österut.
2. Avloppsdiket, sträckan 4+15 - 21+42.

Inom Södra området:

1. Alsätersbäcken, sträckan 0 - 5+40.
2. Bidiket, sträckan 20 - 40+36 från Alsätersbäcken österut till rågången mot Väsentorp.
3. Bidiket, sträckan 10 - 15+76 från Alsätersbäcken västerut till rågången mot Krogstorp.

Avloppen borde så långt ske kan med hänsyn till företagets ekonomi, utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för Alsäters utfartsväg vid punkt 6+40 av diket inom Norra området. Underhållsskyldigheten av vägen åligger Norrköpings stad. Trumman har anlagts omkring år 1944.

2. Trumma för vägen Alsäters skola - Lillie vid punkt 0+80 av Alsätersbäcken inom Södra området. Vägen tillhör Lillie vägsamfällighet. Trumman har anlagts år 1950.
3. Trumma för vägen Alsäters skola - Heljetorp vid punkt 20+20 av bidike till Alsätersbäcken. Vägen tillhör Heljetorps vägsamfällighet. Trumman har anlagts före år 1920.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Alsäter den 6 november 1950.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Emil Nilsson

Carl Erik Larsson

År 1951, den 29 mars, kl. 9 fm. inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Karl Törnquist i Alsäter för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om samman-
trädet, bil. 5 och 6, hade införts i tidningen Östergötlands
Dagblad, Norrköping, och anslagits i Borgs kyrka, varjämte
meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 7.

4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Ernst Nilsson i Aspa och Carl Erik Eriksson i Lundby.

Delägare:

Karl Törnquist, Alsäter.
G.E.Löf, Krogstorp.
Lars Rydberg, Ekesund, ordförande i styrelsen för Memmings häradsallmänning.
Norrköpings stad genom ingenjör Torvald Lindblad.
Skogvaktaren T.Thalén, Norrköping.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.D.

§ 10.

Till företagets styrelse valdes Karl Törnquist, Alsäter, Klinga, tel. Norrköping 450 70, med Lars Rydberg, Ekesund, ^{och} G.E.Löf, Krogstorp, som ersättare.

§ 11.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning nr 809	1,747:-	kr.
Till förrättningsmannen;		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annonser om sammanträden	12:80	"
Ljuskopior av ritningar	14:40	"
Lagakraftbevis	3:50	"
	<u>34:70</u>	"
Transp.	1,781:70	kr.

	Transp.	1,781:70 kr.
Till godemannen Ernst Nilsson, Aspa .	35:70 kr.	
" " Carl Erik Eriksson,		
Lundby	<u>36:60 "</u>	72:30 "
H antlangningskostnad till Karl Törnquist, Alsäter	<u>210:- "</u>	
	Summa	2,064:- kr.
Tillkommer vattendomstolsavgift	<u>129:50 "</u>	
	Summa	<u>2,193:50 kr.</u>

§ 12

Meddelades att, missnämndsförrättningen anfördes genom ut-
ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens
vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare
fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Alsäter den 29 mars 1951.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Ernst Nilsson Carl Erik Eriksson

Bil. 1.

Ink. till Länstämman i Östergötlands län

17 DEC. 1948

1493

79/48

Ink. till Landskansliet
Linköping

18 JAN 1949

Nr. 7 Khv. 14/49

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Alsäter, Väsentopp och Krogstorp i Norrköpings stad.

Dikenas ungefärliga längd: 4,5 km.

Berörd åkerareal omkring 70 har.

Av företaget väntas komma att beröras:

Karl Törnquist, Alsäter, Klinga, Tel.: Norrköping 450 70.

(Axel Johansson, Väsentorp, Norrköping 2.)

G.E.Löf, Krogstorp, Klinga.

Lillie väg ~~Hä~~mfällighet. Ordf.: skogvaktaren Titus Talén,

Rågatan 22, Norrköping 5.

Hänvändelse till Karl Törnquist.

Alsäter den 15/12 1948


Karl Törnquist

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ivar Helin

Linköping den 20 december 1948

På Lantbruksnämndens vägnar:


(A. Norrgård)

Gideon Johansson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i lagordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 18 januari 1949.


Carl Hamilton


E. Hintze

Stämpel Fyra kronor.



Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, måndagen den 16 oktober 1950.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 6 november 1950 kl. 12 midd. hos Karl Törnquist i Alsätter. Av företaget beröres Alsätter och Krogstorp i Norrköpings stad.

Tisdagen den 7 november 1950 kl. 8 f. m. på Kåreholms gårdskontor. Företaget avser invallning mot Östersjön och berör Mörje n:o 3 och 4, Lervik n:o 1, Baggetorp n:o 1-3, Fårtoorp n:o 1, Rönö n:o 1 och Knutebo n:o 1 i Rönö socken samt Dyhult n:o 1 i Östra Ny socken.

Tisdagen den 7 november 1950 kl. 1.30 e. m. hos Gunnar Carlsson i Gräsbrink. Av företaget beröres Gräsbrink n:o 1 i Rönö socken samt Merum n:o 1 och 2 i Östra Ny socken.

Onsdagen den 8 november 1950 kl. 8 f. m. hos Torgny Tergil i Gnestad. Av företaget beröres Tåstad n:o 1, Gnestad n:o 1, Häljestad n:o 1, 2 och 5 och Hjärterum n:o 3 i Kuddby socken samt Tåstad n:o 1 och Brestad n:o 1 i Tåby socken.

Onsdagen den 8 november 1950 kl. 2 e. m. hos Torsten Söderström i Långserum. Av företaget beröres mark inom Häggetorp n:o 1, Flämmestad n:o 1, Långserum n:o 1 och Köp n:o 3 i Mogata socken samt slaskledningar från Mogata kyrkskola, Minnet, Loviselund, Katrineberg, Ekebo och Långtorp.

Torsdagen den 9 november 1950 kl. 9 f. m. på Gusums Bruks skogskontor. Av företaget beröres Gusum n:o 5 och Aby n:o 2 i Ringarums socken.

Fredagen den 10 november 1950 kl. 9 f. m. på Krokeks gård. Av företaget beröres Strömsfors n:o 1, Källsätter n:o 1, Rotnäs, Krokek n:o 3, Källåsen n:o 1, Lindhem n:o 1, Källdalen n:o 1, Asplund n:o 1 samt Sägstugan med Kolsveden och Sumpbyggekärret n:o 1 i Krokeks socken.

Linköping den 13 okt. 1950.

Ivar Helin.
Lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för terrällgning av mark inom Alsäter och Krogsterp i Norrköpings stad hålles hos Karl Törnquist i Alsäter måndagen den 6 november 1950 kl. 12 middagen.

Linköping den 13 oktober 1950.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Norrköpings Borgs förs.

den 15. 10 1950

Gunnar Lindfors

Kyrkoherde v. Pastor Kyrkostyrelsen

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförläggning av mark inom Alsäter och Krogstorp i Norrköpings stad hos Karl Törnquist i Alsäter måndagen den 6 november 1950 kl 1/2 m.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Borg,		"
Kallelse till Ernst Nilsson,	Aspa,	<u>Kimstad.</u>
" " John Elgenstierna,	Forsby,	"
Meddelande till Karl Törnquist,	Alsäter,	<u>Klinga.</u>
" " G.E. Löf,	Krogstorp,	"
" " skogvaktaren Titus Talén,	Rågatan 22,	<u>Norrköping 5.</u>

Linköping den 13 oktober 1950.

Joak Hessin.
 Len tbruksingeniör.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, onsdagen den 7 mars 1951.

Kungörelse

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående torrläggning av mark hållas torsdagen den 29 mars 1951 på nedanstående tider och ställen:

Kl. 9 f. m. hos Karl Törnquist i Alsäter. Av företaget beröres Alsäter, Krogstorp och Väsentorp i Norrköpings stad.

Kl. 12,30 e. m. hos Torsten Söderström i Långerum. Av företaget beröres Håggetorp, Flåmmestad, Långerum och Köp i Mogata socken.

Kl. 5 e. m. hos Hans Lindahl i Tåstebo. Företaget avser uppgrävning av avloppet mellan Tåstebo kvarn och Tåstebosjön, med bidiken, samt berör Sätterbo, Tåstebo och Svinsbo i Ringarums socken.

Linköping den 5 mars 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Alsäter, Krogstorp och Väsentorp i Norrköpings stad hålles hos Karl Törnquist i Alsäter torsdagen den 29 mars 1951 kl. 9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 5 mars 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Andlagat i lags ordning

i Norrköpings Borgs förs.

den 11. 3 1951

Gunnar Lindgren
Kyrkoherde v. Pastor Kyrkoadjunkt

Bil. 7

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Alsäters dikningsföretag år 1951" i Norrköpings stad hos Karl Törnqvist i Alsäter torsdagen den 29 mars 1951 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Borg,	"
Kallelse till Ernst Nilsson, Aspa,	<u>Kimstad.</u>
" " Carl Erik Eriksson, Lundby,	<u>Okna.</u>
Meddelande till Norrköpings stads Drätselkammare,	<u>Norrköping.</u>
" " Karl Törnqvist, Alsäter,	<u>Klinga.</u>

Linköping den 5 mars 1951.

Leas Selin

Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad		
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur	
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor	
								<u>Bil. A.</u>	
<u>Norra området.</u>									
<u>Norrköpings stad.</u>									
Alsäter, stadsäga 634,									
litt. A.									
<u>Karl Törnqvist.</u>									
Åker	mylla/lera	1	0,26		1800	3000	1200		312
"	"	2	0,68		1500	"	1500		1020
<u>Summa</u>			0,94						1332
<u>Alsäter, stadsäga 635, 665.</u>									
litt. B.									
<u>Karl Törnqvist.</u>									
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>									
Åker	mylla/lera	3	0,33		1800	3000	1200		396
"	"	4	0,13		"	"	"		156
"	"	5	0,40		1600	"	1400		560
"	"	6	0,53		2100	"	900		477
"	"	7	0,21		"	"	"		189
"	"	8	0,13		1900	"	1100		143
			1,73						1921

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		1,73					1921
Åker	mylla/lera	9	0,14		2400	3000	600	84
"	"	10	0,20		"	"	"	120
"	"	11	0,35		"	"	"	210
"	"	12	0,20		"	"	"	120
"	"	13	0,36		2200	"	800	288
"	"	14	0,32		2100	"	900	288
"	"	15	1,40		"	"	"	1260
"	"	16	0,31		2400	"	600	186
"	"	17	0,16		"	"	"	96
"	"	18	1,90		1900	"	1100	2090
"	"	19	0,91		2100	"	900	819
"	"	20	0,63		2200	"	800	504
"	"	21	0,59		2400	"	600	354
"	"	22	1,15		2100	"	900	1035
"	"	23	1,85		1900	"	1100	2035
"	"	24	0,46		2100	"	900	414
"	"	25	0,04		2400	"	600	24
"	"	26	0,09		"	"	"	54
"	"	27	0,15		1900	"	1100	165
"	"	28	0,35		2100	"	900	315
"	"	29	0,82		1800	"	1200	984
"	"	30	0,29		1500	"	1500	435
A-Summa			14,40					13801

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transprt A-Summa							13801
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Sträckan B-6+32=126 m. å 8:--							1728
" 6+40-15+22= 882 m. å 8:--							7056
" 17+60-C= 382 m. å 8:--							3056
B-Summa							11840
<u>Totalsumma</u>							25641
<u>Sammandrag för norra området.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal.						
<u>Norrköpings stad.</u>							
Alsäter, Stadsäga 634 ,							
litt. A.	203	0,94		1332	--		1332
Karl Törnqvist.							
Alsäter, Stadsäga 635,665,							
litt. B.	203	14,40		13801	11840		25641
Karl Törnqvist.							
<u>Summa</u>		15,34		15133	11840		26973
<u>Södra området.</u>							
<u>Norrköpings stad.</u>							
<u>Alsäter, stadsäga 634,</u>							
litt. A.							
<u>Karl Törnqvist.</u>							
Åker mylla/lera	32	0,56		2100	3000	900	504
" "	33	2,01		1800	"	1200	2412
Transport		2,57					2916

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		2,57					2916
Åker	mylla/lera	34	0,81		1800	3000	1200	972
"	"	35	2,30		"	"	"	2760
"	"	36	0,40		2400	"	600	240
"	"	41	3,09		1800	"	1200	3708
"	"	42	0,30		"	"	"	960
"	"	43	1,94		"	"	"	2328
A- Summa			11,91					13884
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan F-I = 576 m. å 6:--								3456
B-Summa								3456
<u>Totalsumma</u>								17340
<u>Krogstorp, Stadsäga 633,</u>								
litt. C.								
<u>G.E. Lööv,</u>								
Åker	mylla/lera	37	0,06		2700	3000	300	18
"	"	38	0,54		2400	"	600	324
"	"	39	0,63		2700	"	300	189
"	"	40	0,09		1500	"	1500	135
Summa			1,32					666

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alsäter, Stadsäga 635,665.</u>								
litt. E.								
<u>Karl Törnqvist.</u>								
Åker	mylla/lera	44	0,29		2400	3000	600	174
"	"	45	0,23		1500	"	1500	345
"	"	46	0,80		1800	"	1200	960
"	"	47	1,44		"	"	"	1728
"	"	48	1,35		2100	"	900	1215
"	"	49	1,22		"	"	"	1098
"	"	50	0,50		2400	"	600	300
"	"	51	1,14		1800	"	1200	1368
"	"	52	0,65		"	"	"	780
"	"	53	0,81		2100	"	900	729
"	"	54	0,26		"	"	"	234
"	"	55	0,60		1800	"	1200	720
"	"	56	1,19		2100	"	900	1071
"	"	57	1,63		1800	"	1200	1956
"	"	58	2,16		"	"	"	2592
"	"	61	0,93		"	"	"	1116
"	"	62	1,08		"	"	"	1296
"	"	63	0,73		2100	"	900	657
"	"	64	0,70		2400	"	600	420
"	"	65	0,91		1800	"	1200	1092
"	"	66	0,43		2100	"	900	387
"	"	67	0,46		"	"	"	414
"	"	68	0,43		"	"	"	387
"	"	69	0,47		"	"	"	423
"	"	70	0,61		2400	"	600	366
"	"	71	1,24		2100	"	900	1116
Transport			22,26					22944

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		22,26					22944
Åker	mylla/lera	72	0,60		2400	3000	600	360
"	"	73	0,34		2100	"	900	306
"	"	74	1,20		1800	"	1200	1440
"	"	75	0,38		"	"	"	456
"	"	76	0,15		2700	"	300	45
"	"	77	0,06		1500	"	1500	90
"	"	78	0,06		2100	"	900	54
A- Summa			25,05					25695
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan E-26+2 = 602 m. å 6:--								3612
" 26+8 -H= 1428 m å 8:--								11424
B-Summa								15036
<u>Totalsumma</u>								40731
<u>Väsentes, Stadsäga 643,</u>								
litt. D.								
<u>Menings häradsallmänning,</u>								
Äng	mylla/lera	59		0,23	1000	2000	1000	230
"	"	60		0,65	1400	"	600	390
Summa				0,88				620

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för Södra området.</u>	Fastig- hetens hela åkerareal har			A-båt- nad.	B-båt- nad.		Summa båtnad.
<u>Norrköpings stad.</u>							
Alsäter, stadsäga 634, litt. A. Karl Törnqvist.	203	11,91		13884	3456		17340
Krogstorp, Stadsäga 633, litt. C. G.E. Lööv.	27	1,32		666	-		666
Alsäter, Stadsäga 635,665, litt. B. Karl Törnqvist.	203	25,05		25695	15036		40731
Väsentorp, Stadsäga 643, litt. D. Memnings häradsallmanning.	51		0,88	620	-		620
Summa		38,28	0,88	40865	18492		59357
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Norra området		15,34		15133	11840		26973
Södra området		38,28	0,88	40865	18492		59357
Summa		53,62	0,88	55998	30332		86330
Alsäter den 29 mars 1951 <i>Johan Hedin</i> Lantbruksingeniör. Såsom gode män: <i>Carl Henrik Beckman</i> <i>Ernst Nilsson</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
A-B	566	<u>Norra området.</u>			<u>Bil. B.</u>	
		<u>Alsätersbäcken, sträckan A-B.</u>				
		Lera m ³	400	2:25		900
		Tillägges för oförutsett m.m.				76
		Jordersättning en l. bil. C.				374
	566	Summa				1350
B-6+32 B 6+32 6+32-6+40 6+40-8+90 8+85 6+40,8+90 8+90-11+37 11+37 11+37-13+50 13+50	216	<u>Avloppsdiket, sträckan B-C.</u>				
		Grävning, läggning och höljning för rörledning m	216	2:50	540	
		18" betongrör med frakt m	216	11:--	2376	
		Stödjemur enl. ritn. st	1		100	
	8	Brunn, 90 cm. enl. ritn. st	1		120	3136
		Enskild väg trumman skall ej onläggas				
	250	Grävning, läggning och höljning 6+40-6+72 m	32	5:--	160	
		Grävning, läggning och höljning av rörledning 6+72-8+90 m	218	2:50	545	
		18" betongrör m	250	11:--	2750	
		Upptagande av trumma			25	
	247	Brunnar 90 cm. st	2	120:--	240	3720
		Grävning, läggning och höljning m	247	3:--	741	
		18" betongrör m	247	11:--	2717	
		Brunn 90 cm. st	1		120	3578
	213	Grävning, läggning och höljning för rörledning m	213	2:--	426	
		15" betongrör m	213	8:--	1704	
		Kopplingsbrunn 75 cm. st	1		50	2180
		Transport				112614

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
13+50-15+22	172	Grävning, läggning och ^{Transport} höljning m	172	2:--	344	12614
		15" betongrör m	172	8:--	1376	
15+22		Brunn 75 cm. st	1		100	1820
15+22-17+60	238	Grävning, läggning och höljning m	238	2:25	536	
		15" betongrör med frakt m	238	8:--	1904	
17+4		Uppptagande av ägobro			25	
17+60		Brunn 75 cm. st	1		100	2565
17+60-18+87	127	Grävning, läggning, höljning m	127	2:50	318	
		15" betongrör m	127	8:--	1016	
18+87		Brunn 75 cm. st	1		100	1434
18+87-C	255	Grävning, läggning, höljning m	255	2:25	574	
		15" betongrör m	255	8:--	2040	
C		Brunn 75 cm. st	1		100	2714
						21147
		Tillägges för oförutsett mm.				2153
	1726	Summa				23300
		<u>Sammandrag för Norra området.</u>				
	566	Alsätersbäcken A-B				1350
	1726	Avloppsdiket, sträckan E-C				23300
	2292	Summa				24650
		<u>Södra Området.</u>				
		<u>Alsätersbäcken, sträckan D-E-F-G.</u>				
D-0+76	76	Pinnmo m ³	60	10:--		600
0+76-0+87	11	Enskild väg				
0+87-G	453	Lera m ³	950	2:25		2138
		Transport				2738

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				2738
		Tillägges för oförutsett m.m.				298
		Jordersättning enl. bil. C.				864
	540	Summa				3900
<u>Bidiktet, sträckan E-H.</u>						
E-20+14	14	Grävning, läggning och höljning för rörledning	m 14	4:--	56	
		50 cm. betongrör	m 14	12:--	168	
E		Stödjemur	st 1		100	324
E-20+20	6	Genomgrävning av väg, upptagande av gammal trumma	6	10:--	60	
		50 cm. betongrör kommunalrör	6	20:--	120	
		Rörens läggning återställ. av vägbanan	6	7:--	42	
20+20		Brunn, 100 cm.	st 1		130	352
20+20-23+35	315	Grävning, läggning, höljning av rörledning	m 315	4:--	1260	
		50 cm. betongrör	m 315	12:--	3780	
23+35		Brunn 100 cm.	st 1		130	5170
23+35-26+8	273	Grävning, läggning och höljning	m 273	4:--	1092	
		50 cm. betongrör	m 273	12:--	3276	
24+75		Kopplingsbrunn, 100 cm.	st 1		80	
26+8		Brunn 100 cm.	st 1		130	
26+8		Upptagande av ägobro			50	4628
26+8-28+42	234	Grävning, läggning, höljning	m 234	4:--	936	
		50 cm. betongrör	m 234	12:--	2808	
28+42		Brunn 100 cm.	st 1		130	3874
		Transport				14348

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				14348
28+42-32+28	386	Grävning, läggning, höljning m	386	3:50	1351	
		18" betongrör m	386	11:--	4246	
30,32+28		Brunn 90 cm. st	2	120:--	240	
31+86		Kopplingsbrunn 90 cm. st	1		60	5897
32+28-34+84	256	Grävning, läggning, höljning m	256	3:--	768	
		15" betongrör m	256	8:--	2048	
34+30		Upptagande av ägobro			50	
34+84		Brunn 75 cm. st	1		100	2966
34+84 -38+60	376	Grävning, läggning, höljning m	376	3:--	1128	
		15" betongrör m	376	8:--	3008	
36+36		Kopplingsbrunn 75 cm. st	1		50	
38+60		Brunn 75 cm. st	1		100	4286
38+60-H		Grävning för rörledning m	176	3:--	528	
		12" betongrör m	176	6:--	1056	
H		Intag medslambassäng st	1		250	1834
						29331
		Tillägges för oförutsett m.m.				2969
	2036	Summa				32300
		<u>Bidikt, sträckan F-I.</u>				
F-11+27	127	Grävning, läggning, höljning m	127	2:50	318	
		12" betongrör m	127	6:--	762	
F		Stödjemur st	1		100	
11+27		Brunn 75 cm. st	1		100	1280
11+27-15	373	Grävning, läggning, höljning m	373	2:--	746	
		9" betongrör m	373	4:25	1585	
15		Brunn 75 cm. st	1		100	2431
	500	Transport				3711

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15-I	500	Transport				3711
	76	Grävning, läggning, höljning m	76	1:--	76	
		6" tegelrör med frakt st	260	0:55	143	
		Brunn 75 cm. st	1		100	319
						4030
		Tillägges för oförutsett m.m.				470
	576	Summa				4500
		<u>Sammandrag för Södra området.</u>				
	540	Alsäterbäcken, sträckan D-E-F-G				3900
	2036	Bidiket, sträckan E-H				32300
I	576	" " F-I				4500
	3152	Summa				40700
		<u>Sammandrag för hela företaget.</u>				
	2292	Norra området				24650
	3152	Södra "				40700
	5444	Summa				65350
		<u>Sammanställning av material- och arbetskostnad.</u>				
		<u>Materialkostnad.</u>				
		<u>Norra området.</u>				
		18" betongrör m	713	11:--	7843	
		15" betongrör m	1005	8:--	8040	
		Brunnar 90 cm. med lock st	4	60:--	240	
		" 75 " " " "	4	50:--	200	
		Kopplingsbrunn 75 cm.	1	30:--	30	16353
		Övrig material				310
		Transport				16663

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				16353
		<u>Arbetskostnad.</u>				
		Grävning, läggning och höljning för rörledning + grävning för öppna dike			5134	
		D:o för brunnar och stödjemur			250	5384
		För oförutsett tillägges				2229
		Jordersättning				374
		<u>Summa</u>				24650
		<u>Sammanställning av material- och arbetskostnad.</u>				
		<u>Südra området.</u>				
		<u>Materialkostnad.</u>				
		50 cm. betongrör kommunalrör m	6	20:--	120	
		" " " lantbruksrör m	836	12:--	10032	
		18" " m	386	11:--	4246	
		15" " m	632	8:--	5056	
		12" " m	303	6:--	1818	
		9" " m	373	4:25	1585	
		6" tegelrör st	260	0:55	143	
		Brunnar 100 cm. med lock st	4	70:--	280	
		" 90 cm. " " st	2	60:--	120	
		" 75 cm. " " st	5	50:--	250	
		Kopplingsbrunn 100 cm. st	1	50:--	50	
		" 90 " st	1	40:--	40	
		" 75 " st	1	30:--	30	23770
		Övrig material				560
		Transport				24330

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				24330
		<u>Arbetskostnad.</u>				
		Grävning, läggning, höljning för rörledning + öppna diket			11199	
		D:o för brunnar stödjemur intag			570	11769
		Tillägges för oföutsett m.m.				3737
		Jordersättning				864
		<u>Summa</u>				40700
		Alsäter den 29 mars 1951.				
		<i>Loar Selin</i>				
		Lantbruksingeniör.				

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Norra området.</u>						<u>Bil. C.</u>	
<u>Norrköpings stad.</u>							
Alsäter, stadsäga 634							
litt. A.							
Karl Törnqvist	1,5	18:--	27	200	0,80	160	187
Alsäter, stadsäga 635,665,							
litt. B.							
Karl Törnqvist.	1,5	18:--	27	200	0,80	160	187
<u>Summa</u>							374
<u>Södra området.</u>							
<u>Norrköpings stad.</u>							
Alsäter, stadsäga 634							
litt. A.							
Karl Törnqvist	1,1	18:--	20				
	1,0	24:--	24	475	0,80	380	424
Alsäter, stadsäga 635,665							
litt. B.							
Karl Törnqvist	2,0	18:--	36				
	1,0	24:--	24	475	0,80	380	440
<u>Summa</u>							864
<u>Sammandrag.</u>							
Norra Området							374
Södra "							864
<u>Summa</u>							1238
Al-							

Festighet och ägare m. m.

Avlopp

Upplag

Summa
ersättning

Areal

Ersättning

Areal

Ersättning

m²öre/m²

kronor

m²öre/m²

kronor

kronor

-säter den 29 mars 1951.

Leif Selin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Carl Louis Beckman Ernst Nilsson

Bil.D.Synemännens utlåtande

angående

Alsäters dikningsföretag år 1951, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Alsäter, Krogstorp och Väsentorp i Norrköpings stad, Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen vid Alsäters gård 6 km. sydväst om Norrköpings stad.

På grund av markens belägenhet har företaget indelats i två från varandra beträffande arbetenas utförande skiljda områden, nämligen:

Norra området.

1. Alsätersbäcken, sträckan A - B på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	566 m.
2. Avloppsdiket, sträckan B - C,	" " " "	<u>1,726 "</u>
	Summa	<u>2,292 m.</u>

Södra området.

1. Alsätersbäcken, sträckan D - E - F - G,	med en längd av	540 m.
2. Bidiket, sträckan E - H,	" " " "	2,036 "
3. " " F - I,	" " " "	<u>576 "</u>
	Summa	<u>3,152 m.</u>

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på hithörande översiktskarta² betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 13,5 km².

De i företaget ingående delarna av Alsätersbäcken skola utföras som öppna avlopp enligt nedanstående tabell:

Sträcka.	Neder-Maxi- börds-miav- områ- rin- de. ning. 2 Km $\frac{\text{sek} 1}{2}$ Km	Q max 3 $\frac{m}{\text{sek.}}$	Q med 3 $\frac{m}{\text{sek.}}$	Bot- ten- bredd. m.	Sido- lut- ning.	I	$\frac{T}{\text{max}}$ m.	$\frac{T}{\text{med}}$ m.
----------	---	--	--	------------------------------	------------------------	---	------------------------------	------------------------------

Norra området.

A - B	13,5	100	1,35	0,13	1,00	1:1,50	0,5:1000	1,05	0,35
-------	------	-----	------	------	------	--------	----------	------	------

Södra området.

D - 0+76	10,2	100	1,02	0,10	1,00	1:1	1:1000	0,90	0,27
0+76-0+87	Enskild väg med 1,20 m rörtrumma.								
0+87 - E	10,2	100	1,02	0,10	1,00	1:1,50	0,5:1000	0,95	0,30
E - F	8,0	"	0,80	0,08	"	"	2:1000	0,60	0,20
F - G	"	"	"	"	"	"	4:1000	0,50	0,15

Övriga avloppsdiken skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Neder- börds- område.	Q max	I	Rördimension.	Uppdämning
	Ha	sekl.			cm

Norra området.

Avloppsdiket, sträckan B - C.

B	- 5	155	155	3:1000	18" betongrör.
5	- 6+32	"	"	5:1000	18" "
6+32	- 6+40	"	"	"	21" " Enskild väg.
6+40	- 8+90	140	140	3,5:1000	18" "
8+90	- 11+37	122	122	2,5:1000	18" "
11+37	- 13+50	110	110	4:1000	15" "
13+50	- 15+22	98	98	7:1000	15" "
15+22	- 15+50	88	88	32:1000	15" "
15+50	- 16	"	"	10:1000	15" "
16	- 17+60	"	"	3,5:1000	15" "
17+60	- 18+87	70	70	2,5:1000	15" "
18+87	- C	55	55	"	15" "

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 6+32, 6+40, 8+90 och 11+37 samt brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 15+22, 13+50 (kopplingsbrunn), 17+60, 18+87 och C.

Sträckn.	Neder- börds- område.	Q max sekl.	I	Rördimension.	Uppdämning. cm
----------	-----------------------------	-------------------	---	---------------	-------------------

Södra området.Bidiket, sträckan E - H.

E	- 20+14	210	210	2:1000	50 cm betongrör.	
20+14-20+20	"	"	"	50 cm	"	3
20+20-21+50	175	175	"	50 cm	"	10
21+50-23+35	"	"	"	50 cm	"	19
23+35-24+74	170	170	"	50 cm	"	22
24+74-26+8	145	145	"	50 cm	"	15
26+8-28+42	135	135	"	50 cm	"	3
28+42-30	125	125	"	18"	"	
30 - 31+86	110	110	1,5:1000	18"	"	
31+86-32+28	"	"	"	18"	"	
32+28-34+94	80	80	2:1000	15"	"	
34+94-36+36	70	70	"	15"	"	
36+36-38+60	57	57	3:1000	15"	"	
38+60 - H	42	42	5:1000	12"	"	

Bidiket, sträckan F - I.

F - 11+27	26	26	2:1000	12"	betongrör.
11+27 - 15	13	13	2,5:1000	9"	"
15 - I	4	4	1:1000	6"	tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemurar vid punkterna E och F, brunnar av 100 cm betongrör vid punkterna 20+20, 23+35, 24+74 (kopplingsbrunn), 26+8 och 28+42, brunnar av 90 cm betongrör vid punkterna 30, 31+86 (kopplingsbrunn), och 32+28 samt brunnar av 75 cm betongrör vid punk-

terna 34+84, 36+36 (kopplingsbrunn), 38+60, 11+27, 15 och I samt intag med slambassäng vid punkt H.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Ersättning för mark till avloppets breddning och uppläggning av dikesbankar skall av företaget utgivas vid Alsättersbäcken med i jordersättningslängden, bil.C, angivna belopp. Ersättningarna hava beräknats efter jordvärdet före företaget utförande för mark till avlopp och efter visst pris per m³ för dikesbankar. Ersättningsbeloppen skola utbetalas genom avdrag från ersättningstagarens andelar i för företaget utförande uttaxerade belopp.

Vid framtida rensningar skall ersättning för jordupplag ej utgivas.

Ersättning skall ej utgå för den skada på växande gröda, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt uppläggning och transport av rör och andra materialier längs de täckta dikena.

Broar och trummor.

Av företaget beröras följande trummor:

1. Trumma för Norrköpings stad tillhöriga Alsätters utfartsväg vid punkt 6+40 av dikessträckan B - C inom Norra området. Befintlig trumma av 21" betongrör har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner och djup, varför ingen förändring av densamma föreslås.

2. Trumma för vägen Alsäters skola - Lillie vid punkt 0+80 av Alsätersbäcken inom Södra området. Befintlig trumma på platsen, utförd av 120 cm betongrör år 1950, tillhör Lillie vägsamfällighet och har för vattenavrinningen tillräckliga dimensioner, varför ingen förändring av densamma föreslås.
3. Trumma för vägen Alsäters skola - Heljetorp vid punkt 20+20 av bidiket, sträckan B - H, inom Södra området, tillhörig Heljetorps vägsamfällighet. Befintlig trumma på platsen har anlagts före år 1920. Ny trumma av 50 cm betongrör skall anläggas på dikningsföretagets bekostnad.

Enligt protokollet § 5 skola inga andra broar eller trummor ingå i företagets arbeten, dock skall körbanan på dikena korsande vägar och broar efter rörledningarnas nedläggning återställas i körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till:

För Norra området	24,650:- kr.
" Södra området	40,700:- "
<u>Summa</u>	<u>65,350:- kr.</u>

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

	Alstrings- båtnad. Kr.	Bruknings- båtnad. Kr.	Summa båtnad. Kr.
Inom Norra området	15,133:-	11,840:-	26,973:-
" Södra området	40,865:-	18,492:-	59,357:-
<u>Summa</u>	<u>55,998:-</u>	<u>30,332:-</u>	<u>86,330:-</u>

Kostnadernas fördelning

Arbets- och materialkostnader skola särskilt fördelas inom vart och ett av de båda dielningsområdena i mån av den på varje fastighet inom området uppskattade båtnaden.

Förrätningskostnader och andra kostnader för företaget i dess helhet skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet beräknade kostnaden för företaget i dess helhet.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Pastigheter och ägare.

Norrköpings stad.Norra området.

Stadsäga 634	(Alsäter),	litt.A.	Karl Törnqvist, <u>sökande</u>
" 635, 665.	("),	" B.	Karl Törnqvist, <u>sökande</u>

Summa

Södra området.

Stadsäga 634	(Alsäter),	litt.A.	Karl Törnqvist, <u>sökande</u>
" 633,	(Krogstorp)	" C.	G. B. Lööv, ej sökande
" 635, 665.	(Alsäter)	" B.	Karl Törnqvist, <u>sökande</u>
" 643.	(Väsentorp)	" D.	Memmings häradsallmänning, ej sökande

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grund, som gäller för arbetenas första utförande, med undantag av av företaget berörda trummor, villa skola underhållas av deras ägare.

Uppskattad	Beräknad	Deltägningskyldighet i procent	
		I arbets- och mate- rialkost- nader.	I förrätt- nings- kostnader o.dyl.
båtnad. Kr.	kostnad. Kr.	%	%
1,332	1,217:71	4,94	1,86
25,641	23,432:29	95,06	35,86
			27,72
26,973	24,650:-	100,00	
17,340	11,888:47	29,21	18,19
666	455:84	1,12	0,69
40,731	27,928:34	68,62	42,74
620	427:35	1,05	0,66
59,357	40,700:-	100,00	100,00

Arbetsplan n.m.

Företaget skall benämnas Alsäters dikmingsföretag år 1951.

Arbetets må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen

till den 1 september 1951.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande Alsätersbäcken, att jordbankarna, som ej få läggas närmare bäckkanten än 1 meter i lutning 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,20 m. i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets avrinnande till bäcken, dock minst på var 50:de meter.

Beträffande de täckta ledningarna iakttages

- att Betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,
- att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,
- att all ur dikena uppschaktad jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,
- att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,
- att brunnarna skola utföras med botten på plank 0,50 m. under utgående rörets underkant och försees med öppningar för ytvattnets inrinnande,
- att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med cementrör och
- att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsetts på följande ställen:

1. Överkanten av järndubb i berg 46 m. sydväst om punkt 1 av Alsätersbäcken, sträckan D - E, belägen på höjden + 9,00 m.
2. Överkanten av järndubb i jordfast sten 124 m. nordväst om punkt I, belägen på höjden + 9,80 m.
3. Överkanten av järndubb i berg 60 m. söder om punkt 28+50 av sträckan E - H, belägen på höjden + 10,25 m.

4. Överkanten av järndubb i berg 170 m. sydväst om punkt H, belägen på höjden + 12,69 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95
skall utgivas av Norra området med 40 kronor 46 öre och
av Södra området med 89 " 04 "

Summa 129:50 kr.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Alsäters gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Alsäter den 29 mars 1951.

Ivar Selin

Lantbruksingeniör

Såsom gode män:

Carl Henrik Carlsson *Emil Nilsson*

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjörsavdelningen, Linköping.

KH/MG

Godsägaren Karl Törnquist,
Alsäter,
N o r r k ö p i n g l.

Ang. ALSATERS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1951 i Norrköpings stad, Östergötlands län.

Lantbruksstyrelsen har antagit kontrakt om arbetets utförande och underhåll samt godkänt företaget. Statsbidraget, 22.060 kronor, och lånet, 43.500 kronor, tillställas Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

./. Ett av kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 12 februari 1954.

Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

