


^R Översiktskarta

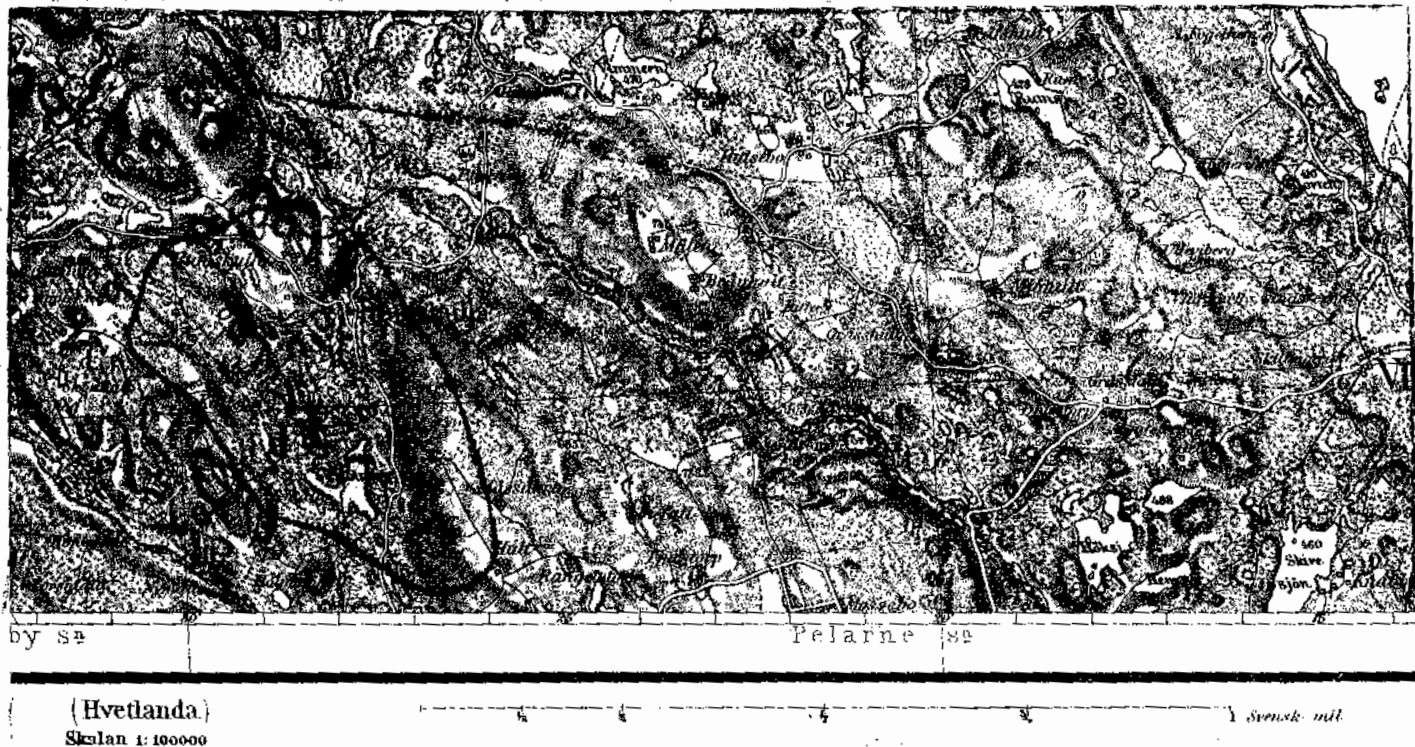

Skala 1:100000

32/ att egoutbyte göres mellan kyrko-
herdebrötället och hemmanet diö C i
Skattegården, så att brötället erhåller hela
sin skift med jämn bredd nämnt
in till skiftet diö D. och hemmanet diö.
C. sina egor samman dragna på norra
sidan om präst-gårdstegen.

Sämda öfverhusmanen och
brötat erhållas

Pumskulla den 18 Oktober 1899.

A. V. Vikström .	A. P. Westermans.
H. H. Karlsson .	August Pettersson.
D. H. Nilsson .	H. J. Kristiansson.

Att intressenterna egenhändigt
undertecknat sina namn eller låtit
i sin närvaro underskrifva det sam-
ma intygas af biträdande syrnemän-
nen.

P. Salomonsson . L. J. Karlsson.

(Bz. E.)

Fullmakt

för innehafvarer att vid samman-
trädet i Pumskulla Prästgård den 25
denne, angående utdelning af de
så kallade Skattehärren i mina vägnar
föra min talan. Och godkänner jag, hvad
fullmakt innehafvarer härvid i mitt
namn lagligen gör och låter, som
försäkras af

Pumskulla Skattegård den
25/11 1899

D. H. Nilsson. (sigill.)

Uthållande af synsmännen vid laga synsförädling rörande utrifning af den Rumsdalla skattegård tillhöriga kvarndammen samt uppgräfnings af aflöpskanal genom st. Backhärret i och för afdikning och velling af vattensjuka marker hörande till skattegårderna och prästgårderna i Rumsdalla by uti Rumsdalla socken af Lunds härad och Kalmar län.

Sedan förning angående utrifning af skattegårdens kvarndamm blifvit af samtliga intressenter underskrifven sfordras härmed ingen vidare utredning.

För bestämmande af aflöpskanalens storlek har det vattensamlingsområde från hvilket den har att afföra vattnet blifvit i Generalstabens topografiska karta öfver trakten uträknadt och befunnits utgöra omkring 1570 har. och då största vattenmängd, som kanalen kan behöfva afföra, enligt hvad erfarenheten från andra ställen i trakten visat, kan beräknas till 0.7 liter för kubitar i sekunden för hela området sfordras enligt vanlig beräkningsgrund en bottenbredd af 1.0 meter, för att, då bottenlutningen är 1.6 på 1000 vid ett vattendjup af 0.6 meter och med en sidolutning af 1:125 från släppstaden beräknade vattenmängden.

Vidareburen kunde bottenbredden

hafva tagits mindre, men i så fall
skulle vattendraget vid flöde blifva i
proportion större och med hänsyn till
markens lilla beskaffenhet och den stor-
ka lutningen är det icke tillräckligt
om vattenet allt för mycket skulle
sträva ut i dikesidorna och kanalen
icke kunna sga beständ, vidolström-
men är i gräfningsförslaget endast
upptaget till 1 på 1.0, men då mar-
ken snart sätter sig, så att kanaldjü-
pet blifver mindre, ökas därmed öpen-
lutningen på kanalens sidor, hvar för
deras vid beräkningen af den
vattenmängd, som kan framrinna,
upptagits till 1 på 1.25.

Från punkten 16 blifver markens stig-
ning och således öpen bottenlutningen
ännu större än 1.6:1000, på grund
hvaraf öpen bottenbredden från näm-
da punkten 16 minskas till 0.75 meter.

Det gemensamma gräfningsarbetet
sträcker sig från punkten 1 till punkten
20, som står vid prästgårdens gamla
vattningstätta, en längd af 992.5
meter och har kanalen blifvit i lämp-
ligaste läge utstakat med hänsyn såväl
till befintliga egogränser som till
jordens brukning som åker på såd
af kartan närmare syns,

medom dammen följer kanalen
gränser emellan byarne med jämn
brök upp till slussen. Symmetrien
hafva upprättat marken såväl i dess

murvarande skick, därvid hänsyn ta-
gits till jordens större eller mindre
höjdighet i dess vatten-skadade skick,
som verk i det skick den kan antagas
komma genom ofvann anförda arbetes
utförande, därvid hänsyn tagits till
både jordens naturliga beskaffenhet
till markjord och af och till dess höjd-
läge i förhållande till kanalsträckan
och däraf berorande större eller mindre
behuf af dikningsdjups allt på såd
af den upprättade vändningslängden
närmare synes och skola intressenterna
deltaga uti alla med företaget förma-
de kostnader, således uti lönen för
hvarnfallst, gräfningskostnader, för-
rättningskostnader och alla andra om-
kostnader, i mån af det förbättrings-
värde, som i längden finnes för kvar
och en utförd.

Höjdebegränsningen för den mark,
som af nämnda säson vatten-
skadad ansetts är i profilritningen
markerad och utvisar denna i öfrigt
djupet vid hvarje afvägd punkt samt
skiktets form och storlek, hvarjämte
fixpunkter till ledning vid kontrolle-
ring af arbetet finnes på denna rit-
ning markerade och på marken in-
byggna dels på toppen af en större
jordfäst sten vnr. 10 m. öster om
kvarhuset, dels på toppen af en ensam
liggande större sten nära bäcken i
prästgårdens äng, och skall gräfnings-

arbetet utföras i full öfverensstäm-
melse med denna profitoritning.
Gräfningsarbetet skall påbörjas så snart
ärstaden tillåter efter det förordningen
vunnit laga kraft eller blifvit genom
laga kraft vunnit utslag fastställt och
skall fullbordas under loppet af ett
års tid därefter.

För upplag af dikejorden erfordras
icke någon ersättning när elensamma
för hvar och en är välbefärlig för gamla
bäckens fyllande och såväl jordförbät-
tringsmedel, som äger hvar och en rätt
att fritt disponera den uppgräpda
jorden inom sitt skifte.

För de på byskrivande bostället
belöpande kostnaderna ansvarar inne-
hafaren af bostället och tillstyrka
syssmännen att de kostnader, som
af honom utläggas för löser af kvarn-
dammur, kanalgräfnings samt annan
dikning och uppodling af marken
fördelas till amortering på 20 års tid
för den händelse bostället inom denna
tid skulle öfvergå till annan inne-
hafare.

För den mark, som ätgår till ka-
nalen, äger markägaren behöfva
ersättning efter det värde, som af sy-
smännen sålts elensamma i
dessa skifte för företags utförande,
hvilket ersättnings belopp tillgodoräk-
nas markägaren vid första utdelning
af penningar för gräfningsarbetet.

De kostnaderna för afdikningsföretagets
beräknats till 1.300 kronor, hvartill
kommer lönen för kvarnfallet med
400 kronor, således tillsammans 1700
kronor och vinsten af företaget enligt
värderingslängden uppskattats till
2432 kronor, visar det sig - att företaget
- är fullt lörande att utföra;
på grund däraf anse sig styrelsen
med fullt fog kunna tillstyrka dess
utförande och bestämma att det
skall gå i verkställighet enligt här
öfver angifna grunder, hvarjämte
meddelas att det samma är att hänföra
till vattenafledning på sätt 2 kap i
dikningslagen utförmåter.

Beträffande den af A. V. Petters-
son gjorda invändningen att lagens
sammmanträdelse icke vore lagligen ut-
lyst anse styrelsen densamma
utan betydelse, emär förordningen
ingång blifvit i laga ordning kungjord
och redovisande kallade, hvarom
santliga intressenter vore kända,
därjämte hade de bevisligen erhållit
undersättelse om det till den 14 ut-
satta sammmanträdet framflyttande
till denna dag och ären med
undantag för A. L. Pettersson om
kommit tillstädes. / jämf. slutet
af 51 § i dikningslagen.

Påmotkalla den 25 Novem-

hafva tagits mindre, men i så fall
skulle vattendjupet vid flöde blifva i
proportion större och med hänsyn till
markens lwa beskaffenhet och den star-
ka lutningen är det icke tillräckligt
om vattenet allt för mycket skulle
sträva ut i dikesidorna och kanalen
icke kunna sga beständ, vidolström-
men är i gräfningsförslaget endast
upptaget till 1 på 1.0, men då mar-
ken snart sätter sig, så att kanaldjü-
pet blifver mindre, ökas därmed öpen-
lutningen i kanalens sidor, hvarför
dermed vid beräkningen af den
vattenmängd, som kan framrinna,
upptagits till 1 på 1.25.

Från punkten 16 blifver markens stig-
ning och således öpen bottenlutningen
ännu större än 1.6:1000, på grund
hvaraf öpen bottenbredden från näm-
da punkten 16 minskas till 0.75 meter.

Det gemensamma gräfningsarbetet
sträcker sig från punkten 1 till punkten
20, som står vid prästgårdens gamla
vattendragsställe, en längd af 992.5
meter och har kanalen blifvit i lämp-
ligaste läge utstakat med hänsyn såväl
till befintliga egogränser som till
jordens brukning som åter på såd
af kartan närmare syns,
medom dammen följer kanalen
gränsen emellan byarne med jämn
brök upp till slutet. Lydnännen
hafva uppskattat marken såväl i dess

murvarandes sticket, därvid hänsyn ta-
gits till jordens större eller mindre
bushighet i dess våduskadade sticket,
som vte i det sticket den kan antagas
komma genom ofvann anförda arbetes
utförande, därvid hänsyn tagits till
både jordens naturliga beskaffenhet
till markjord och af vte till dess höjd-
läge i förhållande till kanalsträckan
och däraf berorande större eller mindre
behuf af dikningsdjups allt på sätt
af den upprättade vändringstängden
närmare synes och skola intressenterna
deltaga uti alla med företaget förma-
de kostnader, således uti lönen för
hvarnfallet, gräfningkostnader, för-
rättningskostnader och alla andra om-
kostnader, i mån af det förbättrings-
värde, som i längden finnes för hvar
och en utförd.

Höjdebegränsningen för den mark,
som af synerännan såsom vatten-
skadad ärosetts af i profilritningen
markerad och utvisar denna i öfrigt
djupet vid hvarje afvägd punkt samt
ledets form och storlek, hvarjämte
fixpunkter till ledning vid kontrolle-
ring af arbetet finnes af denna rit-
ning markerade och af marken in-
byggna dels af toppen af en större
jordfast sten omkr. 10 m. väster om
hvarhuset, dels af toppen af en ensam
liggande större sten nära bäcken i
hästgårdens äng, och skall gräfning-

arbetet utföras i full öpenhet
med denna profitritning.
Gräfningsarbetet skall påbörjas så snart
ärsticken tillåter efter det förordningen
nunnit laga kraft eller blifvit genom
laga kraft nunnit utlag fastställt och
skall fullbordas under loppet af ett
års tid därefter.

För upplag af dikusjorden erfordras
icke någon bräddning men densamma
för hvar och en är välbekäffig för gamla
bäckens fyllande och såvunn jordförbät-
tringsmedel, som äger hvar och en rätt
att frist disponera den uppsgräpda
jorden inom sitt skifte.

För de på byskotsherbostället
belöpsande kostnaderna ansvarar inne-
hafaren af bostället och tillstyrka
sysselmännen att de kostnader, som
af honom utläggas för lönen af kvarn-
dammen, kanalgräfnings samt annan
dikning och uppodling af marken
fördelas till ansvaret på 20 års tid
för den händelse bostället inom denna
tid skulle öfvergå till annan inne-
hafare.

För den mark, som ätgär till ka-
nalen, äger markägaren bekomma
ersättning efter det värde, som af sy-
sselmännen anslås densamma i
dessa skick före företagets utförande,
hvilket ersättnings belopp tillgodoräk-
nas markägaren vid första utdelning
af penningar för gräfningsarbetet.

De kostnaderna för afdikningsföretaget
beräknats till 1300 kronor, hvartill
kommer lönen för kvarnfallet med
400 kronor, således tillammans 1700
kronor och vinsten af företaget enligt
värderingslängden uppskattats till
2432 kronor, visar det sig att företaget
är fullt lörande att utföra;
på grund däraf anse sig synmännen
med fullt fog kunna tillstyrka den
utförande och bestämma att det
skall gå i verkställighet enligt här
afven angifna grunder, hvarjämte
meddelas att detta äro att hänföra
till vattenafledning på sätt 2 kap i
dikningslagen anförmålar.

Beträffande den af A. V. Petters-
son gjorda invändningen att dagens
sammmanträde icke vore lagligen ut-
lyst anse synmännena denna
utan betydelse, när förrättningen
engång blifvit i laga ordning kungjord
och ackröande kallade, hvadan
samtliga intressenter vore hända,
därför hade de bevisligen erhållit
underrättelse om det till den 14 ut-
satta sammmanträdet framflyttande
till denna dag och ären med
undantag för A. L. Pettersson om
kommit tillstädes. / jämf. slutet
af 5/ § i dikningslagen.

Protokoll den 25 Novem-

år 1899.

På tjänstens vägnar:

N. L. Florin

L. J. Karlsson.

P. Salomonsson.

Förstående för oss upplästa
utlåtande godkännes:

H. P. Wastenius.

H. J. Kristiansson

Ch. Mörberg.

Egenhändiga underskrifter intyga

Dag som upvar

På tjänstens vägnar:

N. L. Florin

L. J. Karlsson.

P. Salomonsson.
