

Kopia.
78581

DIARIE N:
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
1941 JUL 8 S

Blad 1.

Förslag i 3 blad till
Elleholms Kogårds invallningsföretag år 1939

Elleholms socken, Blekinge län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av:

Thore Möller
t.f. lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utskande.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

HJALMAR FORSMAN

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Karttekniska byråns arkiv

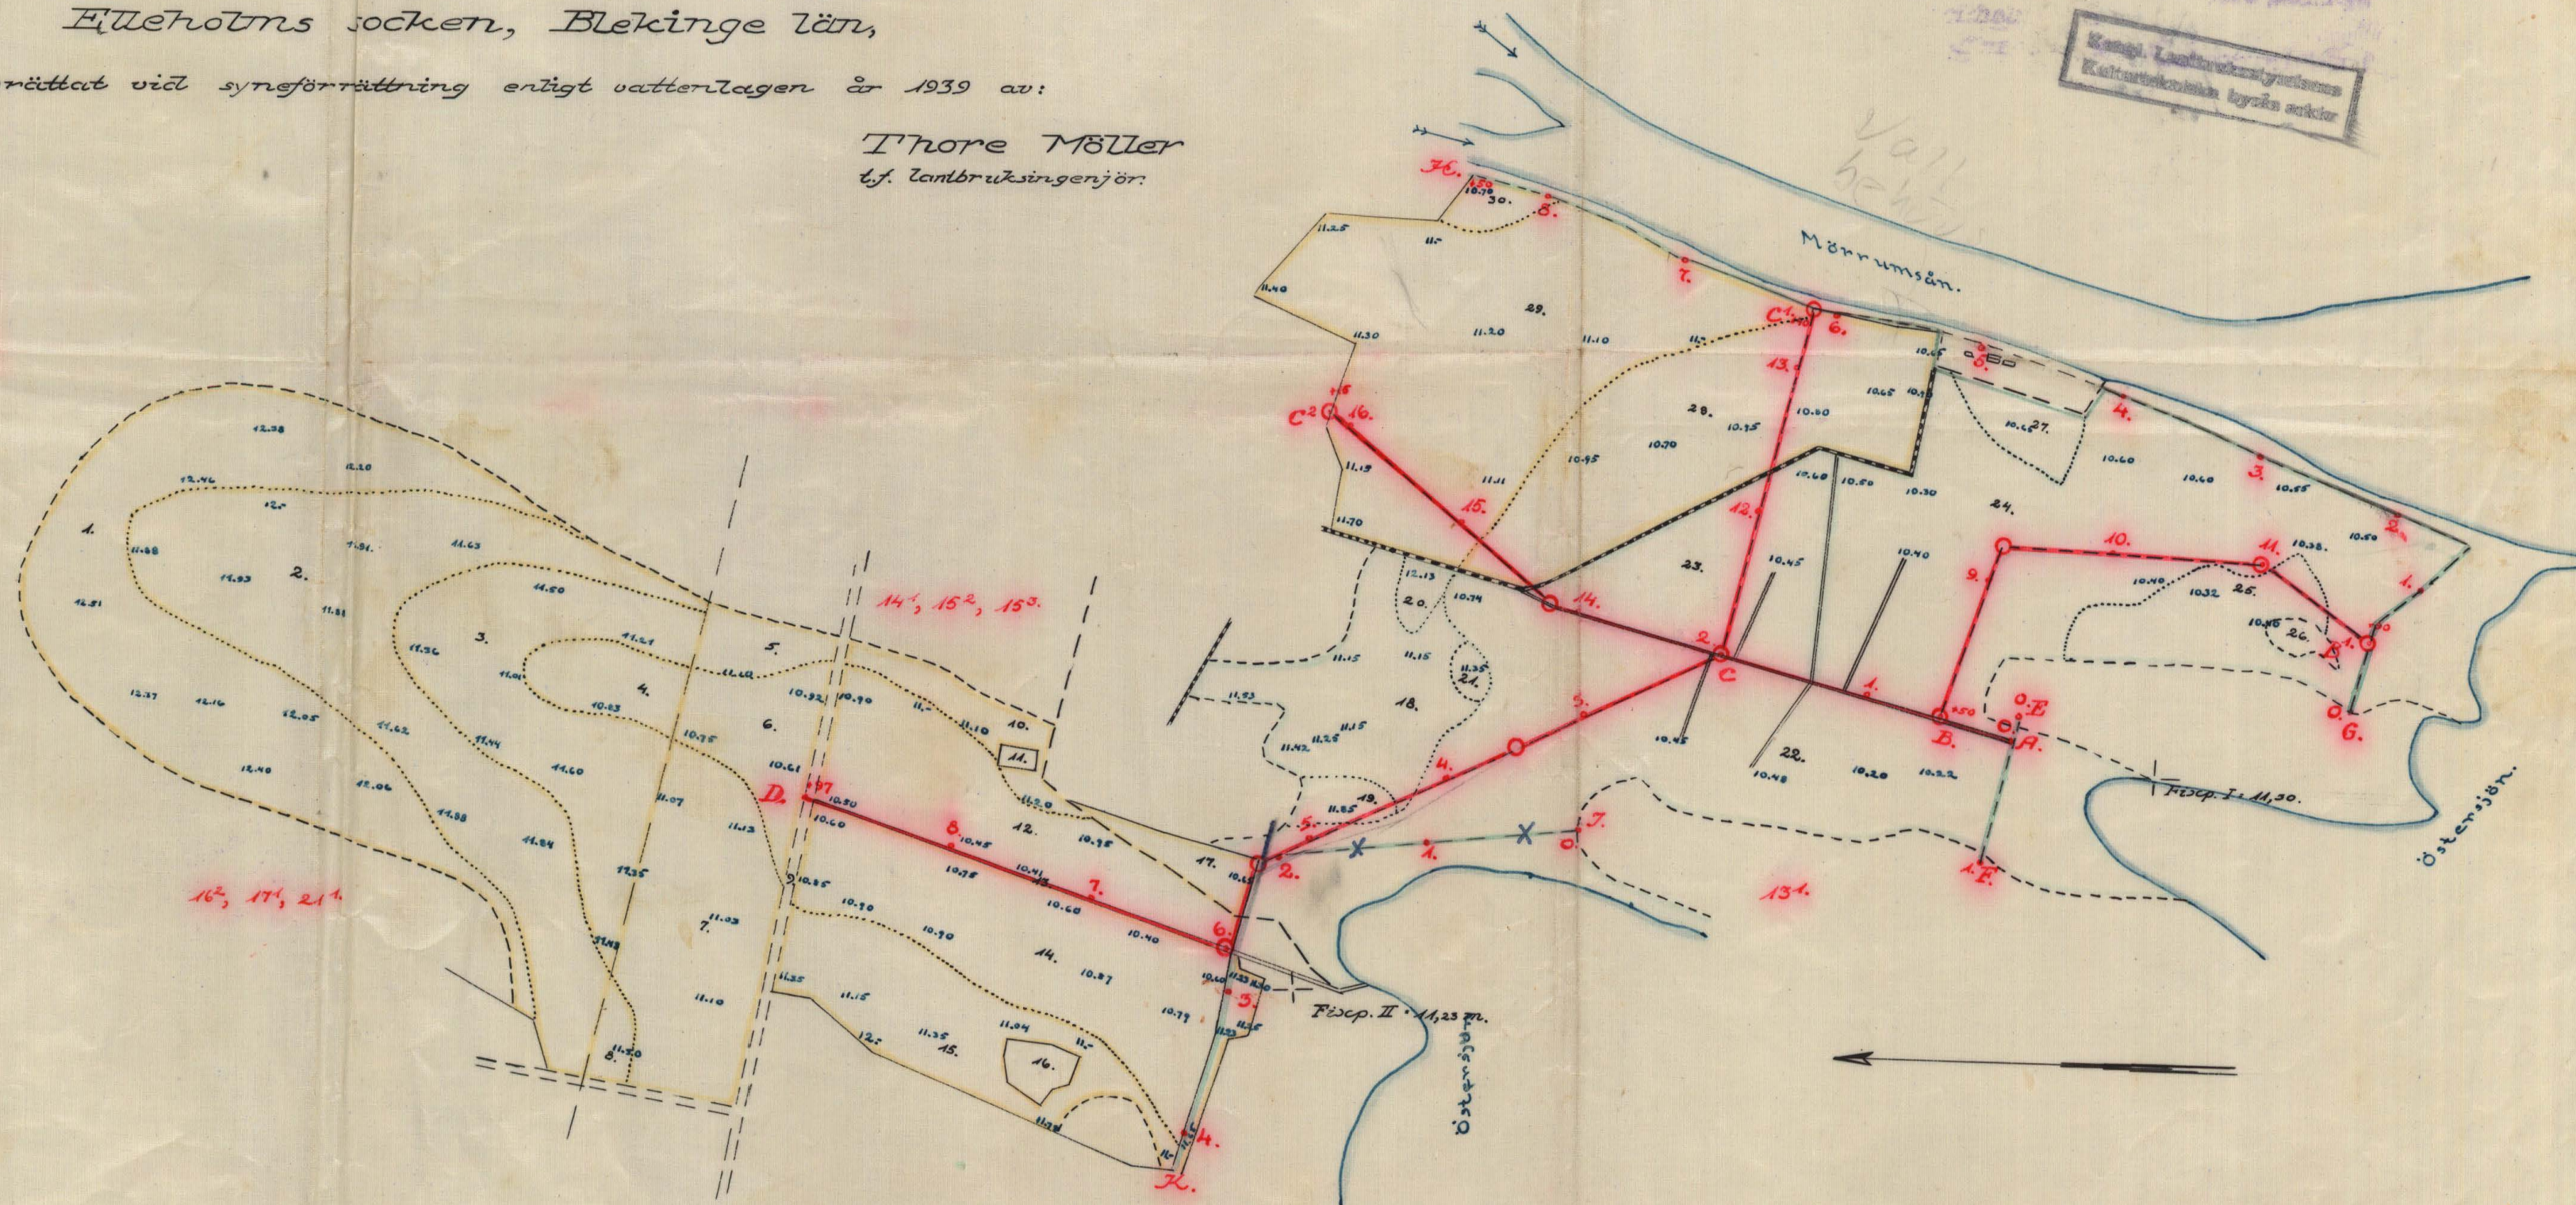

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut
denna dag har ändring i författningen fast-
ställt plan medgivits i enlighet med av Sty-
relsen å befälskändet gjord påskrift.

Stockholm den 19 februari 1943

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

A. Smith

Reshyskes i tjänsten
Thore Möller

K

3-0208

Nr 200 Blekinge 3 rök

18581
Kopia.
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
S 2 JUL 1941

Tillhör förslag till

Elleholms Kogård's invallningsföretag år 1939


Thore Möller
ef. Lantbrukseringen

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
HJALMAR FORSMAN

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturskolens trycks skriv

Blad 2.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut
denna dag har ändring i för företaget fast-
ställt plan medgivits i enlighet med av Sty-
relsen & betänkanget gjord påskrift.
Stockholm den 19 februari 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
A. Smith

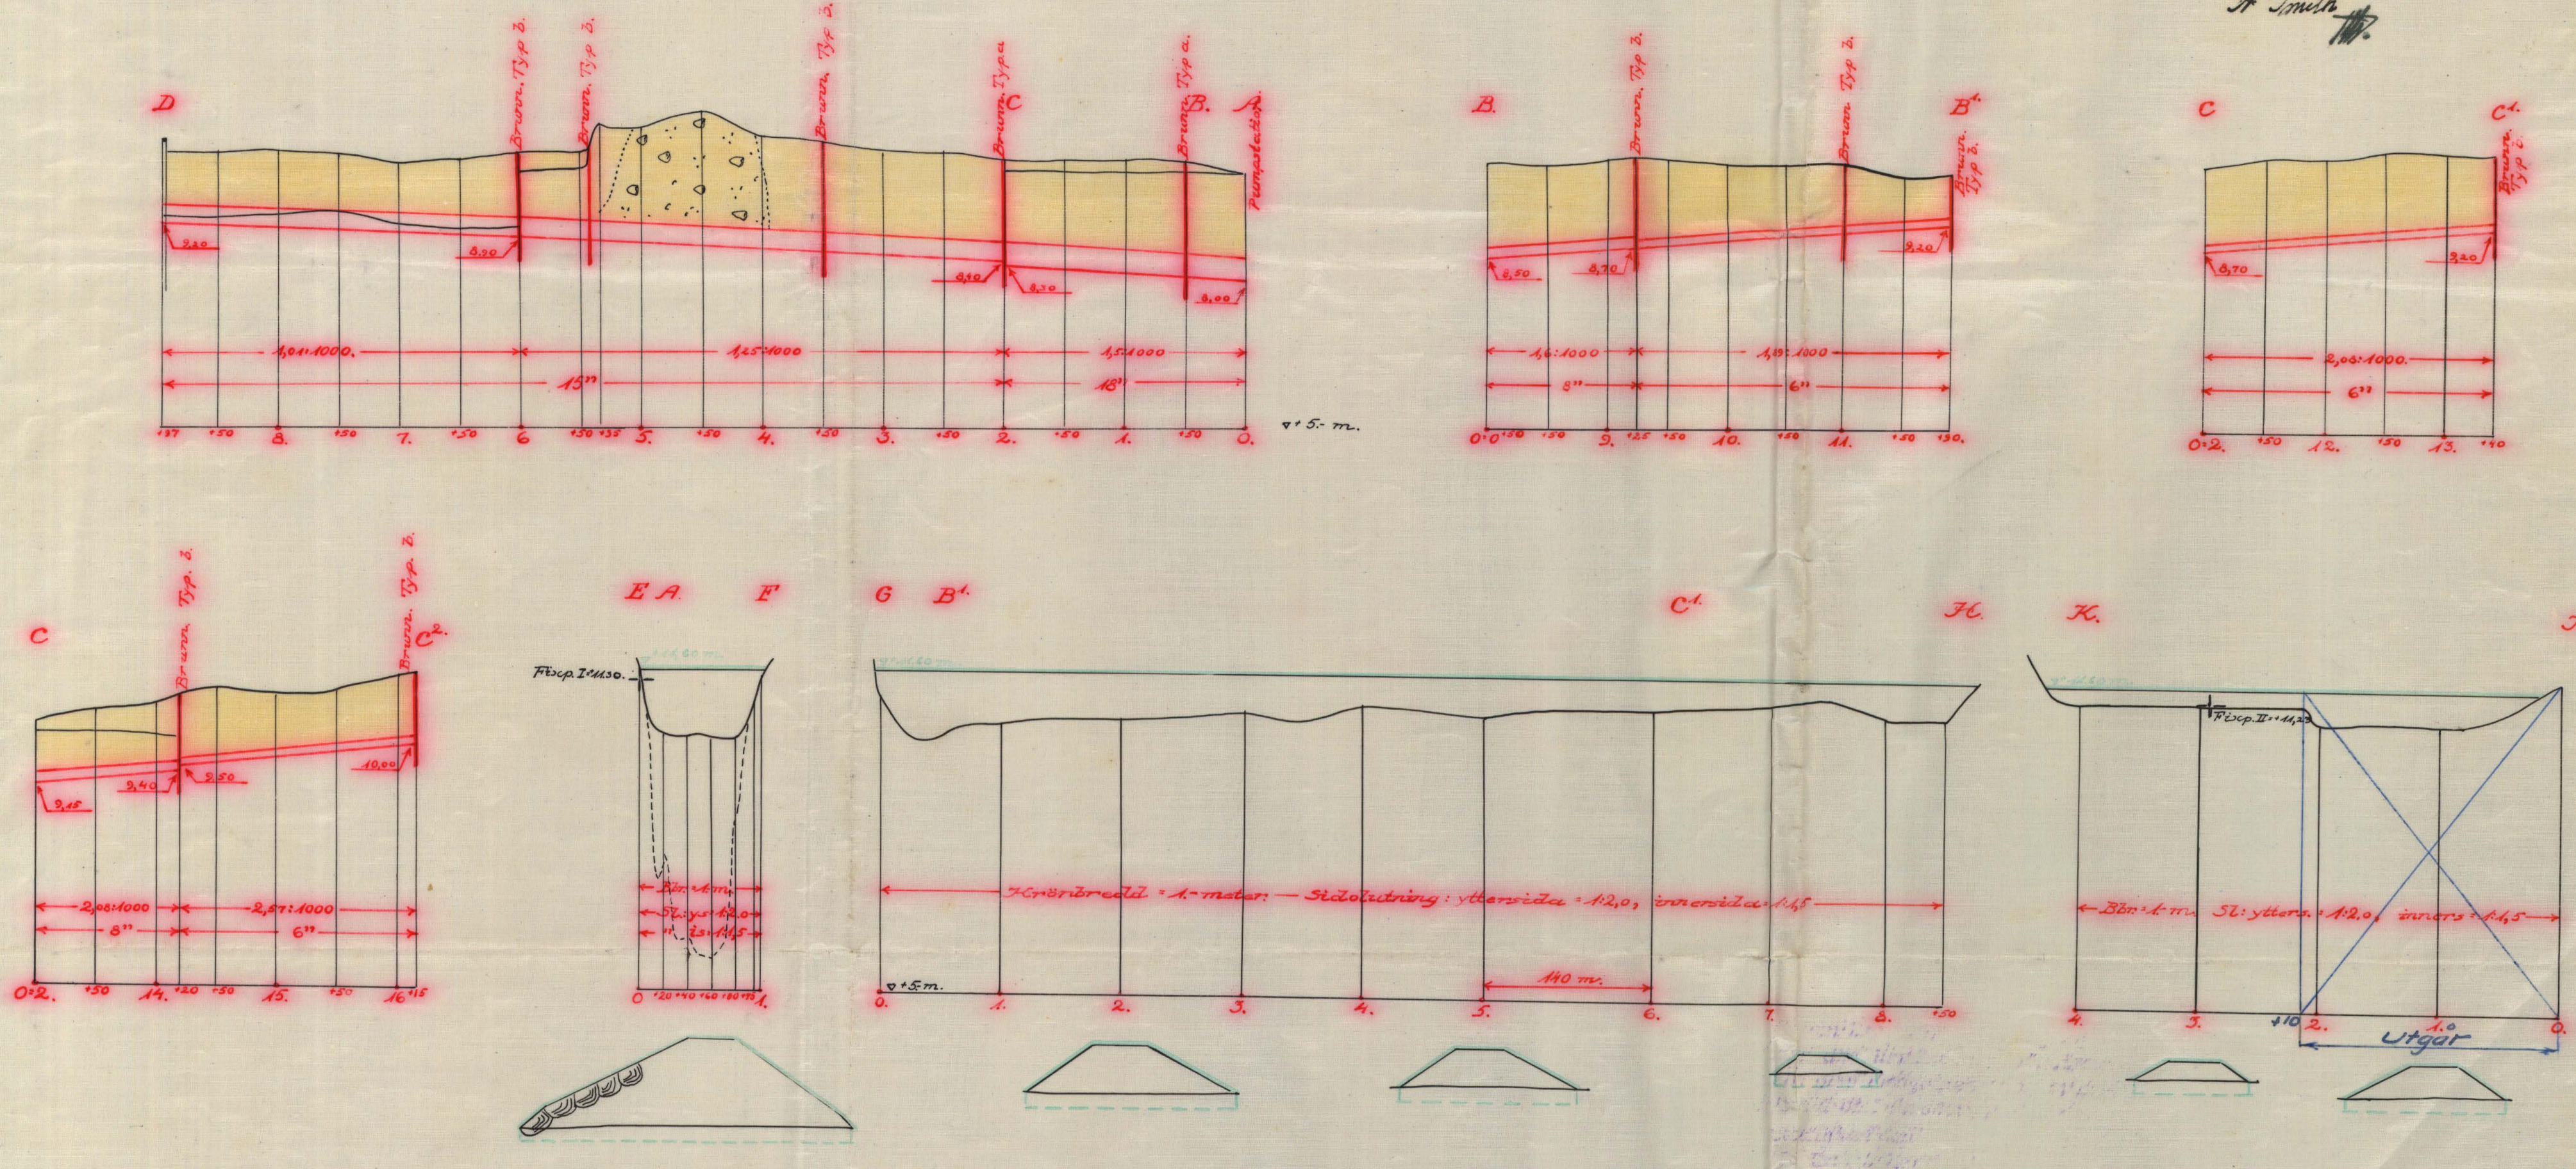

Längdskala.
0 100 200 300 m.
1:4000

Höjd- och sektionsskala
0 1 2 3 4 m.
1:100

Bestyckes i hänsen:
Thore Möller
K. L. N. Nr 002

K 310208 2
Nr 200 Blekinge 3 riter

72881

DIARIE Nr. 70
K. LANTRUKSTYRELSEN
28 JUL 1941


Tillhör förslag till

Elleholms Krogårds invallningsföretag år 1939

Thore Möller
t.f. Lantbrukssingenjör.

Blad 3.

Kang. Lantbrukstyreisens
Kultutekniska byrås arkiv


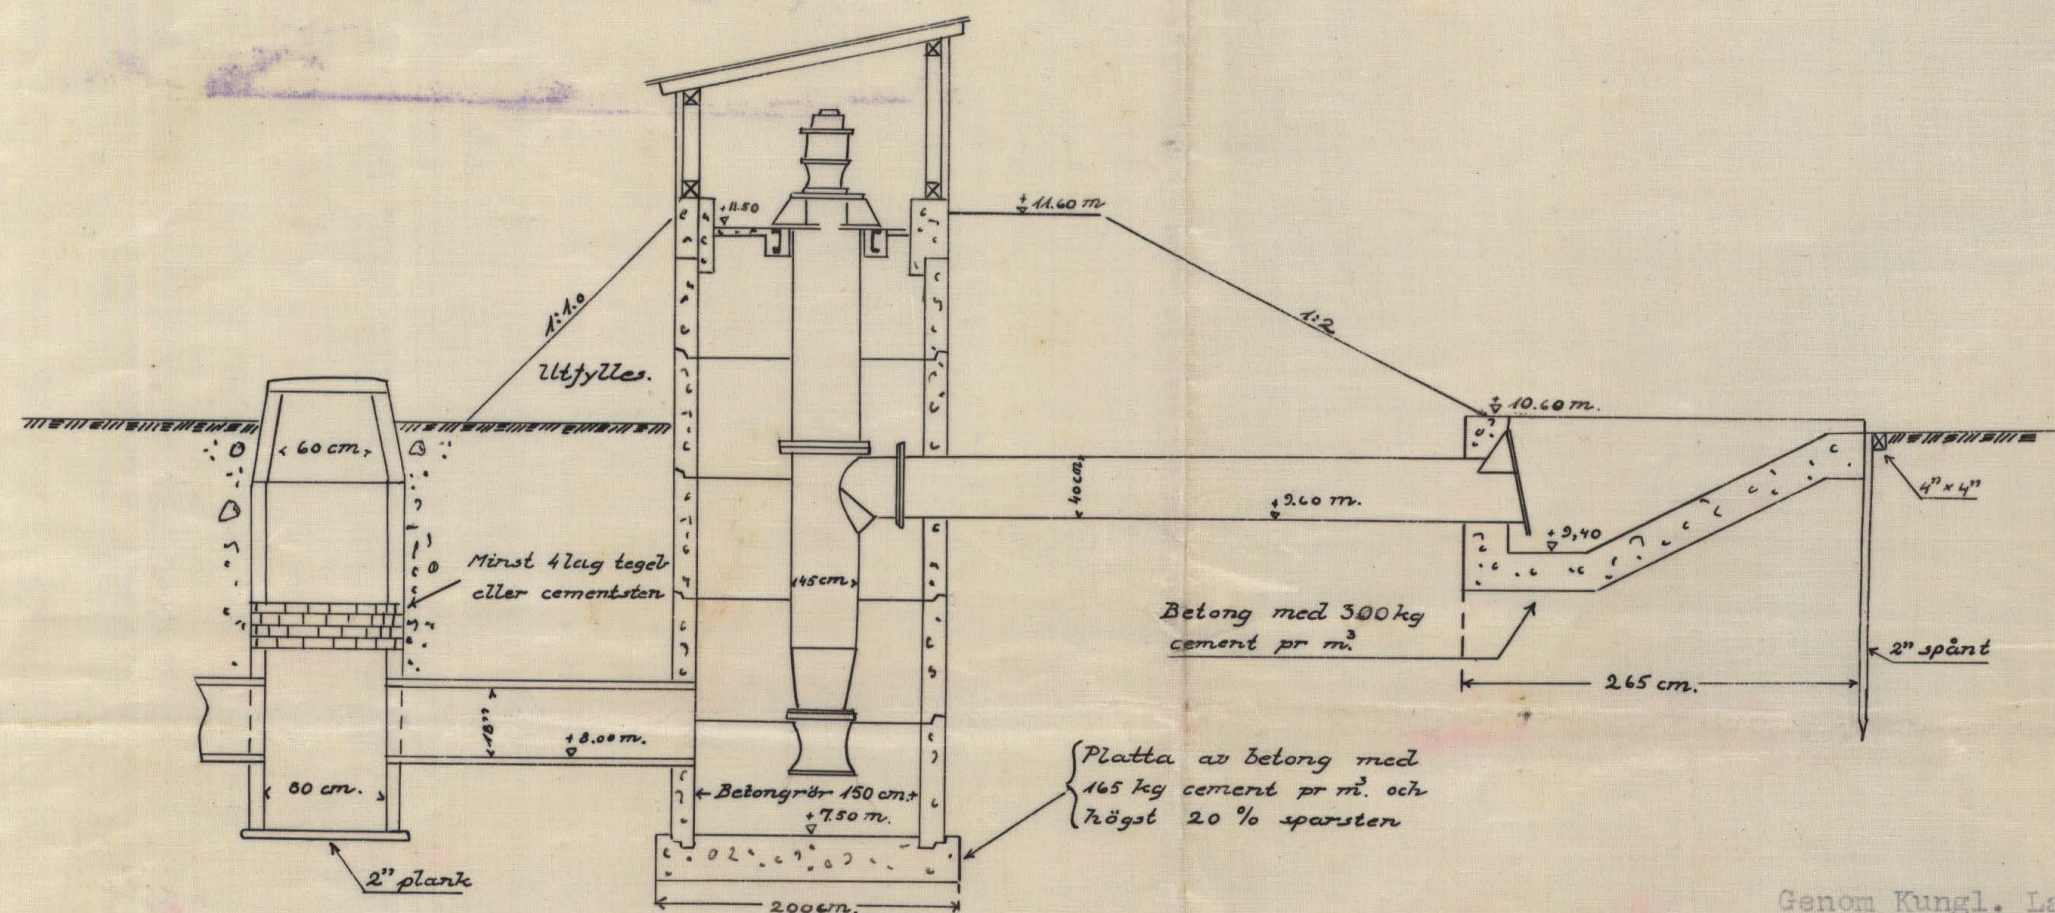


∇ Högst kända v.y. = +11,30 m.

↳ Město v. y. = 10.00 m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
HJALMAR FORSMAN

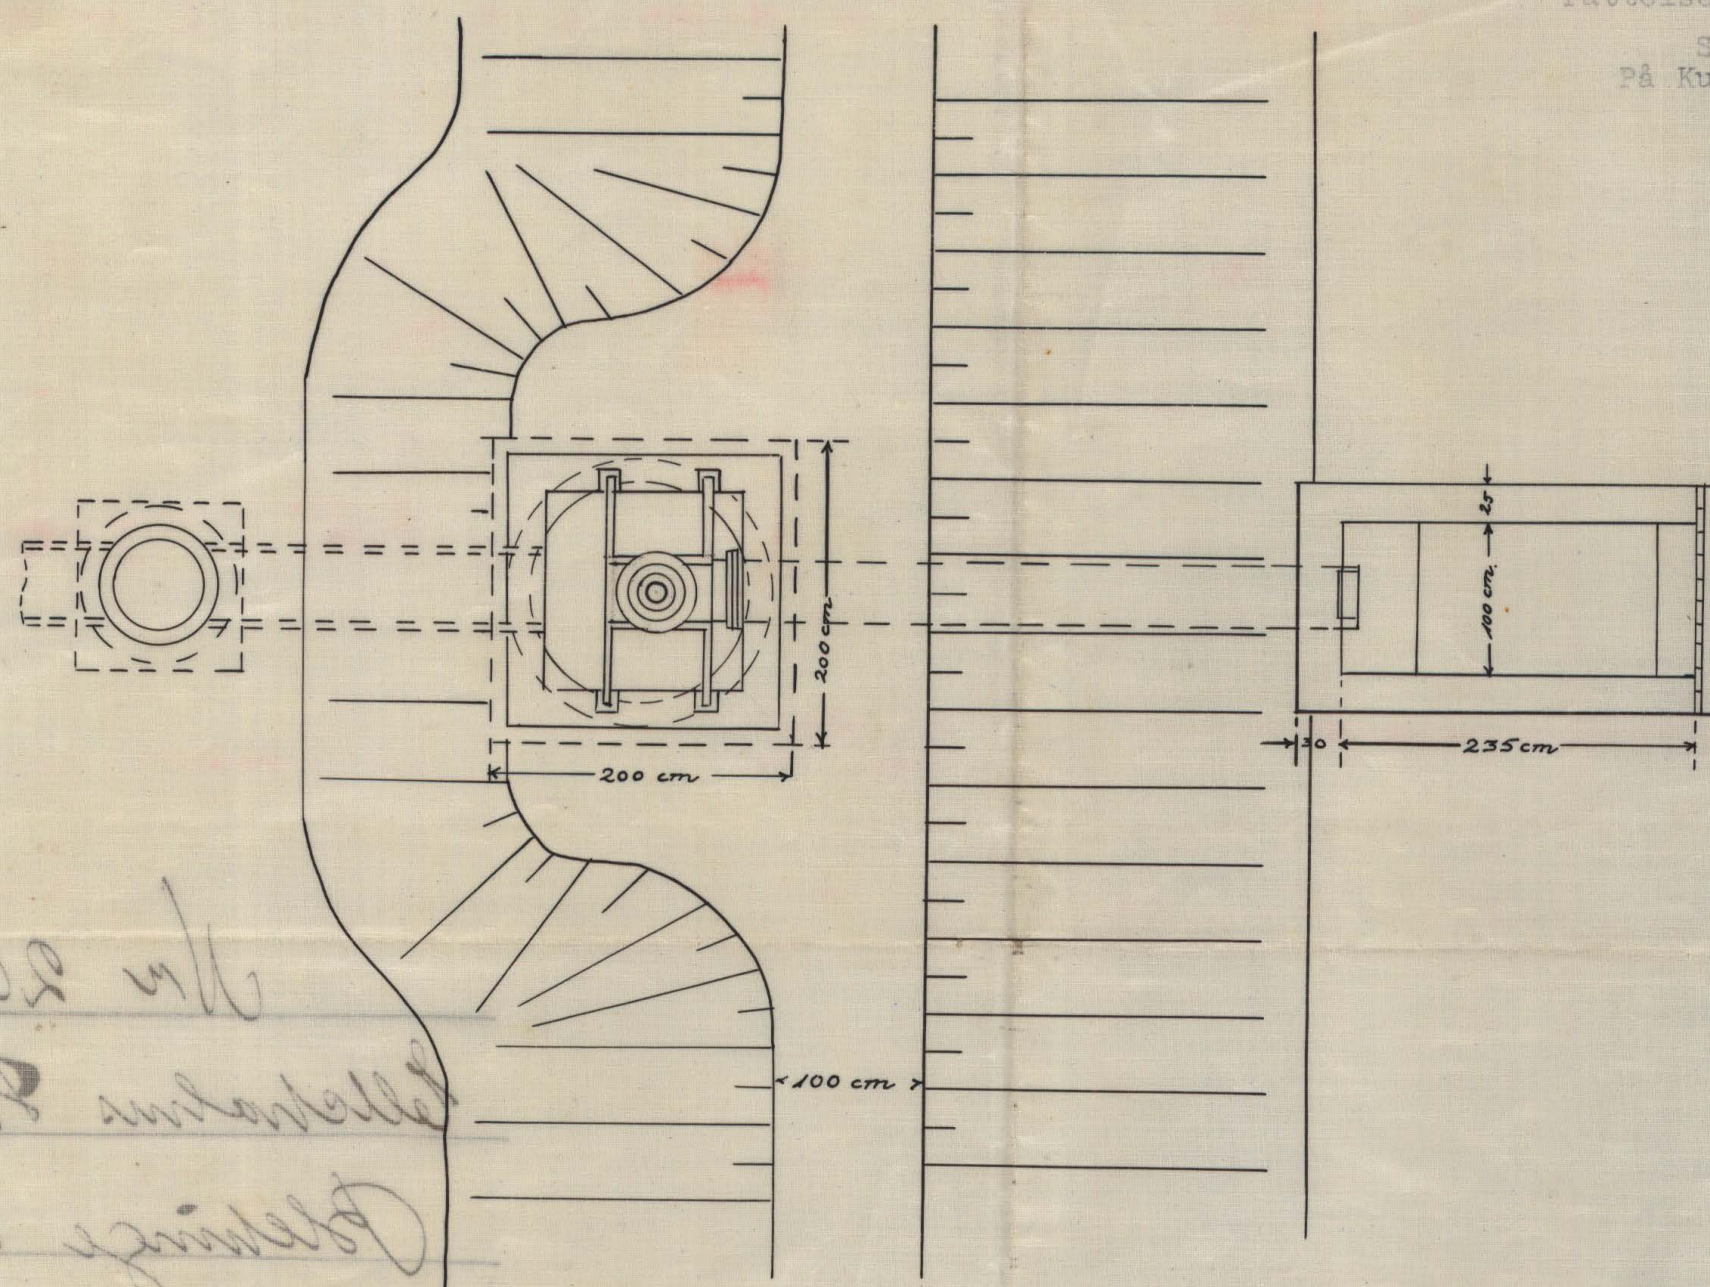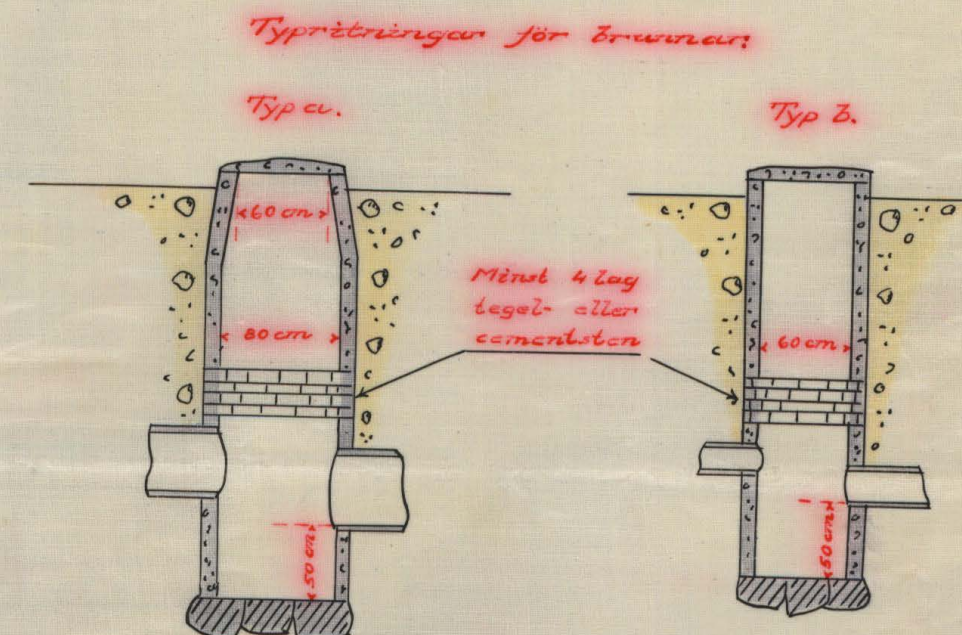

Scale.

1. 0. 1. 2. 3. 4.


1.50.

Bestyrkes: Jämben:
Hörs Inöcker

RIIN.Nr 003

K 3-0208 3

Nr 200 Blechnige 3 riter




Akt nr:
A208

AU\$A208

K 3-0206

DIARIE Nr 13257
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL 1941

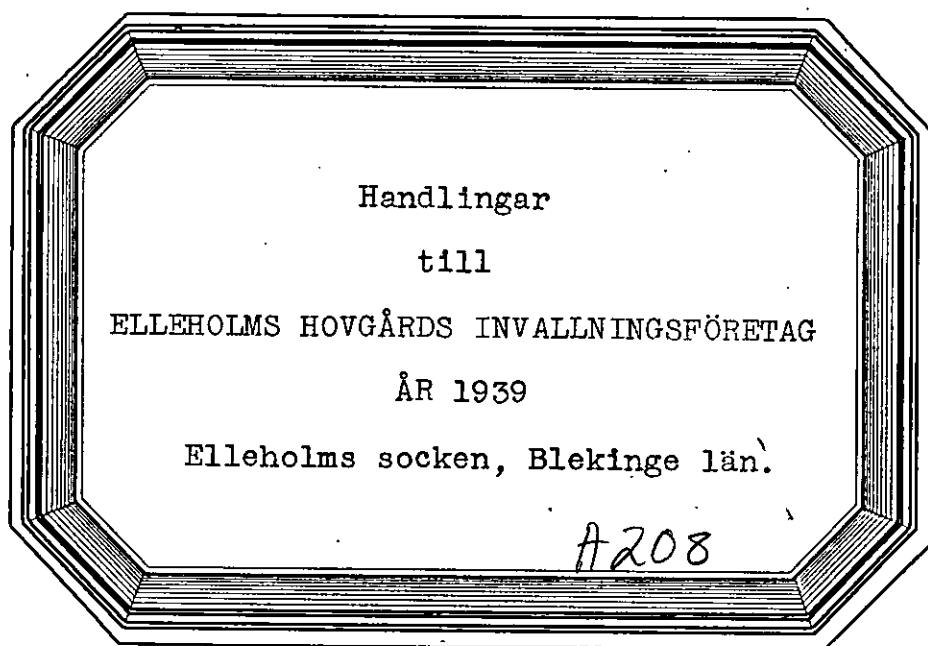

Austrätt

Senare Kungl. Lantbrukstygelsens
beslut denna dag fastställt sin efter-
rättelse och arbetets uppgående

Stockholm den 15 maj 1941

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Hjälmar Foroman

Bestyrkes i tjänsten
Sören Linder

Betänkande

till

ELLEHOLMS HOVGÅRDS INVALLNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Elleholms socken, Blekinge län

Kungl. Lantbrukstygelsen har denna dag
dels medgivit, att sträckan 9-2⁺¹⁰ av vallen 9-H omä utgå
ur den fastställda arbetsplanen, varvid sträckan 2⁺¹⁰ H av
samma vall skall förlängas åt öster fram till högmarsken och
om pågäfs nr 19, dels och föreskrivit, att de till företaget beviljade
statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 13.820 kronor
till 13.440 kronor och lånet från 13.820 kronor till 13.450 kronor.

Stockholm, den 19 februari 1943.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.
A. Smith.

L. Linder

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av stats-

understöd till Elleholms Hovgårds in-

vallningsföretag år 1939 i Elleholms

socken av Blekinge län.

Företagets läge, beskaftenhet m.m.

Till invallning föreslagna marker äro belägna 7 km väster om Karlshamn, omedelbart väster om Mörrumsån, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av ringa höjd över havsytan äro markerna i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att genom vallanläggning och avpumpning av vattnet samt utförande av vissa avlopp bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ende intressenten har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående ifrågavarande företag. Denna förrättning avslutades den 25 sistlidna november. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna fördelas på särskilda av företaget berörda fastigheter.

Hydrografiska förhållanden.

För rådande vattenstånd i havet, nederbördsområdets storlek m.m. och därav föranledda dimensioner å vallar, pumpanläggning och avlopp samt för förslagens tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna.

På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning, båtnad, kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till förbättrad torrläggning av en areal om 42,420 hektar, varav 28,373 hektar åker samt 14,047 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad, som genom företaget tillskyndas angiven areal, beräknats till 30.758:80 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 24.600:- kr.

Härtill kommer kostnaden för syneförrättningen och detta betänkande m.m., samt domstolsavgift, sammanlagt 648:47 kr, ävensom kapitaliserade driftkostnaden, 5.000:- kr, varför totalkostnaden uppgår till 30.248:47 kr, motsvarande 98 % av båtnaden.

Arbetstid.

I till synhandlingarna hörande utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bidrags- och lånebelopp.

Ende delägaren söker såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Enligt gällande grunder torde, då totalkostnaden uppgår till 98 % av båtnaden, statsbidrag kunna påräknas till ett belopp, motsvarande 49,30 % av anläggnings- och förrättningskostnaden, eller med 1 avrundat tal 12.440:- kr, samt statslån till återstående del av samma kostnad, eller med 1 likaledes avrundat tal 12.800:- kr.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

I företaget ingående odlade marker äro av god beskaffenhet och

de icke odlade områdena lämpa sig genom sitt läge i omedelbar närhet av åbyggnaderna synnerligen väl för uppodling till åker eller betesvallar. För egendomen är således företagets genomförande av stor betydelse. På grund härav får jag tillstyrka bifall till ansökningsen om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

4/ Räkningar / 2 st./.

5/ Avskrift av synehandlingarna.

6/ Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar / 3 blad /.

Karlskrona 1 december 1939.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Anläggningskostnad

26.250:-

27.000:-

24.600:- kr.

Syneförrättningen

516:82 "

Betänkandet m.m.

85:51 "

Domstolsavgift

46:14 "

26.898.47

27.648.47

26.840.47 kr

Driftkostnad: 2.500 kwh å 0:08 kr

200:- kr

Smörjning, tillsyn m.m.

50:- "

Summa

250:- kr

Driftkostnaden kapitaliserad efter 5 %

5.000:- "

Summa summorum

32.648.47

30.840.47 kr

31.898.47

Karlskrona 1 december 1939.

Thore Möller

x) Ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksskyddet
med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift
angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till:

Anläggningskostnad

27.648 kronor 47 öre

kapitaliserad driftkostnad

5.000 "

Summa32.648 kronor 47 öre

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksskyddets vägnar

Hjalmar Sörman

I samband med av Kungl.

(Fäst. se nästa sid.)

Förteckning

A fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdelningslån sökas.

Ellerholms socken.

Ellerholm	13 ¹	2	mtl	} Hg. Edgar Schander
"	14 ¹	1/4	"	
"	15 ²	1/8	"	
"	15 ³	1/8	"	
"	16 ²	1/6	"	
"	17 ¹	1/8	"	
"	21 ¹	1/4	"	

Karlskrona 1 december 1939.

Thore Möller

Förestående avskrifter, sid. 1 - 5, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen
har anläggningskostnaden för företaget beräknats till 26.898 kronor
47 öre.

W. H.

Stockholm den 19 februari 1943.
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
A. Smith.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
Ulleholms Högånds invallningsföretag år 1929
Ulleholms socken och Blekinge län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.0	6,00	6	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	1.7	11,00	18	70		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 178 ar	16	0.50	8	—		
		 har	28.37	0.40	11	35		
		äng och odlingsmark medelareal 15.6 ar	9	0.42	3	78		
		 har	14.047	0.26	3	65		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	5	0.05	—	25		
		 har	0.48	0.78	—	35		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 > 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarblad					63	58
		Överföres					63	58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 58
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har	424	0,30	12 72	
		avvägda punkter	110	0,08	8 80	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	32	2,00	6 40	
		i annan mark		5,00		63 92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 140 ar, ...	30	0,09	2 70	
		 har 43,25	43,25	0,04	1 72	4 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer			1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	25	0,12	3 -	6 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	322	3,00	9 66	
		2) befintligt avlopp ell. vall				9 66
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	5	6,00	30 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	50 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	46	0,03	1 38	2 38
		Överföres				212 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				212 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.84	2,50	4 60	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 —	23 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	1.38	0,50	— 69	
		c) Upprättning av tvärsektioner st.	6	0,25	1 50	
		d) Kostnadsberäkning km.	1.42	3,00	4 26	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	2	12,00	24 —	36 45
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01	1 10	1 10
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	— 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{4}$	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn..... "		12,00		
		utlopp för täckt ledning..... "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	6 —
		slanficka..... "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				321 51
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 140 ar ägofigurer st.	30	0,13	3 90	
		 har	43.25	0,05	2 16	
		Överföres			13 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	110	0,02	2 20	
		kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	19 31
		Kopia av profil-, sektion-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	3 22	500	16 10	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	20 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46; pumpstation,	1	12,00	12 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	20	0,55	11 -	11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				68 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 -
		Summa kronor				126 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				321 51
		Lösen för kopior och avskrifter				68 91
		Övriga förrättningskostnader				126 40
		Summa kronor				516 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Bäcke och Lötens dommars häradsrätt.

Elleholm den 25 nov 1924

Shore Möller
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bäcke och Lötens dommars

Shore Möller

R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Elleholms Hov-
gårds invallningsföretag år 1939.

Översiktskarta 1 2 ex å 4:- kr	8:- kr
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid å 3:- kr	12:- "
Kopia av plankartan å väv	19:51 "
" " profiler m.m. å väv	28:95 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 25 sid. å 0:55	13:75 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2:50 "
Inhäftning av handlingar	1:- "
	<u>Summa 85:51 kr</u>

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till vederbö-
rande häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 20 december 1939.

Thore Möller

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller

Synehandlingar

till

ELLEHOLMS HÖVGÅRDS INVÄLLNINGSFÖRETAG

ÅR 1939

Elleholms socken, Blekinge län.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående torrläggning
genom invallning av marker, tillhörande
Elleholms Hovgård i Elleholms socken av
Blekinge län.

Lördagen den 25 november 1939 kl. 11 fm. inställde sig underteck-
nad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sven Bengtsson i Torste-
boda och Viktor Sjöholm i Elleholm å Elleholms Hovgård för att påbör-
ja förrättningens handläggning. Därjämte tillstadeskom sökanden, gods-
ägaren Edgar Schander.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen och länsstyrelsens med anledning
härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna.

§ 2.

Synemännen förklarades ojäviga.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för preliminärt upprättat förslag
till torrläggning genom invallning och dikning av i företaget ingåen-
de marker.

§ 4.

Synemän och sakägare begåvo sig därefter till torrläggningsområ-
det, varefter synemännen besiktigade föreslagna sträckningar å vallar
och avlopp samt företogo markvärdering.

§ 5.

Efter synogången fortsattes sammanträdet på samma ställe som förut,
varvid synemännen meddelade utlåtande.

§ 6.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 7.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Elleholms Hovgård den 25 november 1939.

Thore Möller.

Sven Bengtsson

Viktor Sjöholm.

J.D. B 23 År 1939.

Till

Länsstyrelsen i Blekinge län.

Anhålles omförordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen angående torrläggning genom invallning av marker tillhörande Elleholms Hovgård i Elleholms socken. Förutom nämndaegendom synes företaget allenast komma att beröra Kronen tillhöriga avst. Elleholm 13³.

Elleholm, Vekerum, den 26 oktober 1939.

Edgar Schander.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingenjör i Blekinge län, som härigenom förordnas att lagligen verkställa ifrågavarande förrättning.

Karlskrona & landskansliet den 2 november 1939.

Sven Hagströmer.

Fritz Selmer.

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Ä g o b e s k r i v n i n g och v ä r d e r i n g s l ä n g d																

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
4	50.0							1200	5400	-	1600	7200	-	400	1800	-
4	30.0							1000	4300	-	"	6880	-	600	2580	-
2	18.0							800	1744	-	"	3488	-	800	1744	-
	48.0							600	288	-	"	768	-	1000	480	-
11	46.0								11732	-		18336	-		6604	-
	32.0							800	256	-	1600	512	-	800	256	-
	77.0							600	462	-	"	1232	-	1000	770	-
1	92.0							800	1536	-	"	3072	-	800	1536	-
	14.5							1000	145	-	"	232	-	600	87	-
						12.0		-			-			-		
	47.0							800	376	-	1600	752	-	800	376	-
						03.7		-			-			-		
1	70.0							400	680	-	1600	2720	-	1200	2040	-
						08.9		-			-			-		
2	40.0							600	1440	-	1600	3840	-	1000	2400	-
1	50.0							800	1200	-	"	2400	-	800	1200	-
						15.0		-			-			-		
9	22.5							396	6095	-		15760	-		8665	-
	28.0							400	112	-	1600	448	-	1200	336	-
		1	46.0					800	1168	-	1200	1752	-	400	584	-
			18.2					"	14560		1000	182	-	200	3640	
			12.0					"	96	-	"	120	-	"	24	-
	28.0	1	76.2						152160			2502	-		98040	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transp.
				21	ägg, mygglar grå runt ö grus
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" stening " "
				26	buske
				27	ägg " "
				28	äker " "
				29	" " " "
				30	" " " "
					Summa
					Summa
<u>Ellikholms socken</u>					
Ellikholmen	16 ²	ägg.	1/6	1-4	Edgar Schander
	17 ¹	grus.	1/8		
	21 ¹	sum.	1/4		
"	14 ¹	ägg.	1/4	5-16	
	15 ²	grus.	1/8		
	15 ³	sum.	1/8		
"	13 ¹		2	17-30	Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
28.0		176.2						1521		60		2502		-		98040	
		07.0						700		49		1000		70		30021	
		435.0						300		1305		1200		5220		9003915	
		160.0						"		480		"		1920		"	
		500.0						"		1500		"		6000		"	
		98.0						200		196		800		784		600588	
						08.7		-						-			
		28.5						400		114		1000		285		600171	
280.0								700		1960		1400		3920		7001960	
443.0								1000		4430		"		6202		4001772	
128								600		10680		"		24920		80014240	
768.8		1404.7				08.7				1166240				275220		1548980	
1146.0										11732				18336		6604	
922.5						39.6				6095				14760		8665	
768.8		1404.7				08.7				1166240				275220		1548980	
2837.3		1404.7				48.3				2948940				6024820		3075880	
Ellsholms Herzsädel den 25 november 1939																	
Thore Sküller																	
Isen Brantsson Viktor Ljöhalus																	

[illegible]

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. C.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån, m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-2	200	<u>Dikessträckan A - B - C - D.</u>								
		Grävning för nedläggning av rör m.	200	3.-	600	-				
		45 cm:s /=18"/ pansarce- ment inkl. frakt, läggning och fyllning m.	200	7.-	1400	-				
		Brunnar vid 0 ⁺⁵⁰ o 2 ⁺⁰⁰ , enl. typritning st	2	80.-	160	-	2160	-		
2-6	400	Grävning för nedläggning av rör m	400	2,50	1000	-				
		37,5 cm:s /=15"/ pansarce- ment inkl. frakt, läggning och fyllning m	400	5.-	2000	-				
		Brunnar vid 5 ⁺⁵⁰ , 5 ⁺⁴⁴ och 6 ⁺⁰⁰ , enl. typritning st	3	50.-	150	-	5150	-		
6-8 ⁺⁹⁷	297	Rensning för nedläggning av rör m	297	0,50	148	50				
		37,5 cm:s /=15"/ pansarce- mentrör inkl. frakt, lägg- ning, fyllning samt botten- förstärkning med virke, där så är behövt m	297	5,50	1635	50	1783	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					908	-	8000	-
	897	S u m m a							8000	-
0-11 ⁺⁹⁰	390	<u>Dikessträckan B - B¹.</u>								
		Grävning för nedläggning av rör m	390	1.-	390	-				
		8" tegelrör, inkl. frakt, läggning o fyllning st	440	500/ 1000	220	-				
		6" tegelrör, inkl. frakt läggning o fyllning st	900	300/ 1000	270	-				
		Brunnar vid 9 ⁺²⁵ , 11 ⁺⁰⁰ och 11 ⁺⁹⁰ enl. typritning st	3	50.-	150	-	1030	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					120	-	1150	-
	390	S u m m a							1150	-
0-13 ⁺⁴⁰	240	<u>Dikessträckan C - C¹.</u>								
		Grävning för nedläggning av rör m	240	1.-	240	-				
		Transport			240	-				

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-16 ⁺¹⁵	240	6" Transport			240	-				
		6" tegelrör, inkl. frakt läggning o fyllning	st 850	300/ 1000	255	-				
		Brunn vid 13 ⁺⁴⁰ enl. typ- ritning			50	-	545	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					55	-	600	-
	240	S u m m a							600	-
		<u>Dikessträckan C - C².</u>								
	315	Grävning för nedläggning av rör	m 315	1.-	315	-				
		8" tegelrör, inkl. frakt läggning o fyllning	st 420	500/ 1000	210	-				
		6" tegelrör, inkl. frakt läggning o fyllning	st 680	300/ 1000	204	-				
		Brunnar vid 14 ⁺²⁰ och 16 ⁺¹⁵ enl. typritning	st 2	50.-	100	-	829	-		
0-1 ⁺⁰⁰		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges					121	-	950	-
	315	S u m m a							950	-
		<u>Vallen vid pumpstationen, sträckan E - A - F.</u>								
	100	Borttagande av grästorv och matjord	m ² 700	0,20	140	-				
		Schaktning av dyfjord o lera	m ³ 700	2,50	1750	-				
		Stenbeklädnad av vallens yttersida till höjden +11. m.	m ³ 100	5.-	500	-	2390	-		
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tillägges					410	-	2800	-
	100	S u m m a							2800	-
		<u>Vallen utmed Mörrumsån, sträckan G - B¹ - G¹ - H.</u>								
	850	Borttagande av grästorv och matjord	m ² 3000	0,20	600	-				
0-8 ⁺⁵⁰		Schaktning av dyfjord o lera	m ³ 1600	2.-	3200	-	3800	-		
		För oförutsedda fall ar- betsledning m.m. tillägges					500	-	4300	-
	850	S u m m a							4300	-

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Vallen vid gamla pumpstationen, sträckan I - K.</u>								
0-2+10	210	Borttagande av grästörv och matjord m ² 100 650		0,20	130	-				
		Schaktning av dyjord och lera m ³ 10 300		1,50	150	-				
2+10-4+30	220	Påbyggnad av gamla vallen m 220		1,50	330	-	555			
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					60	615		
							140	1200	-	
	430	S u m m a						1200	-	
		<u>P u m p a n l ä g g n i n g.</u>								
		<u>Pumpverk.</u>								
		1 st. invallningspump med en kapacitet av 130 lit/sek vid 2,0 m lyfthöjd, förslagsvis NOHAB propellerpump P-3 uppställd i plåtmantel och direktkopplad 7,5 hkr kortsluten 3-fasmotor, försedd med motorskåp och flottörpådreg för helautomatisk drift					3000	-		
		Montering					500	-		
		Kraftledning ca 600 m					900	-		
		Mätare, instrumentering m.m.					400	-	4600 -	
		<u>Pumpstation.</u>								
		Inspänkning och länshållning					200	-		
		Schaktning m ³ 20		3.-			60	-		
		Bottenplatta av betong, 165 kg cement pr m ³ och högst 20% sparsten m ³ 1,2		40.-			48	-		
		Utlopp av betong, 300 kg cement pr m ³ "	2	60.-			120	-		
		Betongrör till pumpgrop, inre diam. 150 cm. m 4		50.-			200	-		
		Överbyggnad av trä, inkl. betongförstärkning					100	-		
		18" betongrör m 2,6		7.-			14	-		
		Brunn, inre diam. 80 cm					80	-		
		Formsättning, spånt och diverse					178	-	1000 -	
		S u m m a							5600 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
897 m		Dikessträckan A - B- C- D					8000	-		
390 "		" B - B ¹					1150	-		
240 "		" C - C ¹					600	-		
315 "	1842	" C - C ²					950	-	10700	-
100 m		Vallen vid pumpstation, str. E - A - F					2800	-		
850 "		" utmed Mörrumsån, " G-B ¹ -C ¹ -H					4300	-		
430 "	1380	" vid gamla pumpstationen, str. I - K					1200	-	8300	-
	3222	S u m m a							19000	-
		Pumpanläggning							5600	-
	3222	Totalsumma							24600	-
		Elleholms Hovgård den 25 november 1939.								
		Thore Möller.								

Kostnadsfördelningslängd

Söcker

och

hemmanor.

Registreringsnummer.

Littera.

Hemmanstal

Ägare

Ellsholms socken.

Ellsholm

16²

ägor.

1/6

17¹

sum.

1/8

21¹

sum.

1/4

14¹

ägor.

1/4

15²

sum.

1/8

15³

sum.

1/8

13¹

2

Edgar Schander.

Summa

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning
genom invallning av marker, tillhö-
rande Elleholms Hovgård i Elleholms
socken av Blekinge län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående marker finnas upptagna å den vid förrätt-
ningen genom inymätning åstadkomna nivåkartan, på vilken markernas höjd-
läge över det antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siff-
ror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen /Bil. B/.

Företaget avser att genom invallning och pumpning samt utfö-
rande av erforderliga avlopp inom invallningsområdet bereda möjlig-
het till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i före-
taget ingående områden, som lämpa sig för odling eller för anordnande
av betesvallar.

Åkermarken inom nordvästra delen av invallningsområdet har
tidigare invallats och vattnet avpumpats medelst en s.k. snäcka. An-
läggningen är dock bristfällig och torrläggningen otillfredsställan-
de.

För att avsikten med företaget skall kunna uppnås fordras
dels vällanläggning omkring området innefattande vallsträckorna

E - A - F, G - B¹ - C¹ - H och I - K,

dels utförande av avloppssträckorna A - B - C - D, B - B¹, C - C¹

och C - C², vilka samtliga skola utföras såsom rörledningar, dels ock uppförande av ett pumpverk vid punkt A för uppföring av det inom området förekommande vattnet så att grundvattennivån kan sänkas till erforderligt djup.

Företaget ligger mellan Mörrumsåns och Skräboåns nederbördsområden, vilka i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden erhållit nr 86 resp. nr 87.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till invallning jämlikt 7 kap. 49 - 55 §§ vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grunder sig på länsstyrelsens i Blekinge län förordnande den 2 november 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angives, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas. Företaget avser invallning dels mot havet, dels mot Mörrumsån, i vilken allmän farled eller allmän flottled icke förekommer.

Mom.4. Fixpunkter.

Vid undersökningarna har jämförelseplanet lagts 10,00 m lägre än 0-planet för Rikets precisionsavvägning. Havets medelvattenyta ligger således på höjden +10,00 m. Till ledning vid arbetenas utförande hava följande fixpunkter markerats och avvägs:

Fixp. I. Höjdläge = +11,30 m. + -format märke inhugget i sten invid

stranden 100 m söder om nya pumpstationen.

Fixp. II. Höjdläge $=+11,23$ m. $\pm$ -format märke inhugget i sten 45 m

söder om gamla pumpstationen.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivt av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Vallar och avlopp.

Som förut framhållits ligger Östersjöns medelvattenstånd på höjden $+10,00$ m över det antagna jämförelseplanet. Högsta kända vattenståndet har uppmätts till $+11,38$ m, men högvattenytan uppgår ytterst sällan höjden $+11,00$ m.

På grund härav har vallkrönet förlagts på höjden $+11,60$ m. Krönbredden har bestämts till 1,0 m. Sidolutningen har på vallens yttersida bestämts till 1:2,0 och på innersidan till 1:1,5.

Företagets nederbördsområde, som med ledning av ekonomiska kartverkets karta på marken noga uppgåtts, utgöres till övervägande del av odlade fält med tämligen svaga lutningar. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbörds mängden i trakten hava ledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Ledningarnas bottenlägen i brytpunkterna, lutningar och rördimensioner finnas angivna å de upprättade profilritningarna.

Av omstående tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden beräknade vattenmängder, lutningar och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Lutning	Dimension		Avbördn. förmåga lit/sek
				cm	/tum/	
A - B - C	85	85	1,5:1000	45,0	/18/	102
6 ⁺⁰⁰	55	55	1,25:1000	37,5	/15/	58
- D	45	45	1,01:1000	37,5	/15/	52
B - 9 ⁺²⁵	7,0	7,0	1,6:1000	20,0	/8/	10,8
C - 14 ⁺²⁰	7,0	7,0	2,08:1000	20,0	/8/	12,0
- C ²	4,0	4,0	2,57:1000	15,0	/6/	6,2

Övriga rörledningar avse huvudsakligen att bereda avlopp för vall-
dikena. För dessa ledningar har diamotern bestämts till 15,0 cm /6"/.

Mom. 6. Pumpanläggningen.

Beträffande pumpverket hava följande beräkningar verkstälts:

Nederbördsområdet omfattar 85 hektar. Största förekommande avrinning har
med hänsyn till läckage i vallar o. dyl. beräknats till 1,5 lit/sek/har.

Med nämnda avrinning kommer således den största vattenmängd, som kan före-
komma till avpumpning, att uppgå till 130 lit/sek.

Inre vattenståndet vid pumpstationen bör normalt kunna sänkas till
+8,20 m men kan under kortare perioder tillåtas stiga till +9,60 m. Medel-
vattenytan i Östersjön ligger på höjden +10,00 m. Högvattenytan stiger till
+11,00 å 11,38 m.

Med hänsyn till svårigheten att utföra och underhålla avlopp från
pumpstationen till stranden, har ansetts lämpligt att lyfta vattnet till
sådan nivå, att detsamma kan rinna fritt över ängsmarken utom vallen;

eller till höjden +10,20 m.

Vid en lyfthöjd för vattnet av 2,0 m och en beräknad verkningsgrad hos pumpanläggning^{en} av 50 % beräknas den erforderliga effekten till

$$\frac{130 \times 2,0 \times 0,736}{75 \times 0,5} = \sim 6 \text{ kilowatt.}$$

Den för ett år erforderliga energien uppgår, under förutsättning att 250 m/m av nederbörden måste pumpas, till

$$\frac{0,25 \times 850.000 \times 2,0 \times 0,736 \times 1000}{75 \times 3.600 \times 0,5} = \sim 2.500 \text{ kilo-}$$

wattimmar.

Beträffande pumpverkets storlek och konstruktion få synemännen på grund av ovanstående föreskriva, att detsamma skall utföras för en kapacitet av minst 130 lit/sek vid 2,0 m lyfthöjd samt anordnas på sådant sätt, att vattenytan inom området vid pumpstationen skall kunna stängas till höjden +8,20 m och att pumpning kan ske vid ett vattenstånd i Östersjön av +11,38 m.

Mom. 7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen, och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. B. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

I kostnadsfördelningslängden / Bil. D. / har varje särskild

fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna sökanden, dock obetaget att beträffande pumpanläggningen vidtaga de mindre ändringar, som efter infordrande av anbud kunna finnas påkallade med anledning av ändrad konstruktion å pump o.dyl.
- 2/ Rören till ledningar skola vara tillverkade av pansarcement och av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av

för 45,0 cm	/18"/	rör	19 kg
" 37,5 "	/15"/	"	16 "
" klenare rör			10 "

per centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatrisen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m per timme.

- 3/ Till klenare ledningar må även användas fullgoda tegelrör.
- 4/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 5/ Brunnarna skola förses med minst fyra lag tegel- eller cementsten och kringpackas med sten och skärv, så att dagvattnet kan tränga in i dem.

6/ Vallmaterialiet skall väl sammanpackas och grüstorven under vallon borttagas så att god anslutning erhålles mellan vallkroppen och underliggande mark.

7/ Arbetena skola utföras under betryggande kontroll.

8/ Arbetena med företags utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest ändamålsenligt och betryggande.

9/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara bragta till slut senast den 1 september 1942.

10/ Afsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mon.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp, vallar, pumpstation och övriga anläggningar skola omsorgsfullt underhållas. Brunnarna böra rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Vid inkoppling av täckdiken skall största försiktighet iakttagas så att brunnar och övriga anläggningar ej skadas eller rubbas.

Mon.10. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Elleholms Hovgårds invallningsföretag år 1939".

Mon.11. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart

förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Blekinge län orläggas avgift, motsvarande 0,15 % av båtnadsvärdet, eller 46 kronor 14 öre.

Mom. 12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å Elleholms Hovgård.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygds vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 13 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Elleholms Hovgård den 25 november 1939.

Thore Möller

Sven Bengtsson Viktor Sjöholm.

Thore Möller

1941 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 i §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Elleholms Hovgårds invallningsföretag år 1939
i Elleholms socken av Dlekinge län.

Lån 13.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i uträkningen angående det-
samma upptagne fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Elleholms socken.</u>			
Elleholm	2	13	Eäger Schander
"	1/4	14	
"	1/8	15	
"	1/8	16	
"	1/6	17	
"	1/8	18	
"	1/4	21	
"	1/4	21	

Stockholm den 2 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Grand Hotel
200 Högberg

306
41

Godk. 19/2 1943

DIARIE Nr 19915
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1942

R a p p o r t

över verkställd avsyning av Elleholms Hovgårds invallningsföretag år 1939 i Elleholms socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Statsbidrag : 13.820:- kr

Statslån : 13.820:- "

Kontrakt antaget den 2 september 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ende intressent : Godsägaren Edgar Schander, Elleholm, Vekerum.

Vid av undertecknad den 2 oktober 1942 verkställd avsyning av företaget, befanns detsamma, med här nedan angivna undantag, vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda planen.

1/ Utmed vallen E - A - F och ca 5 m från denna hade uppgrävts ett valldike för erhållande av material till vallen, varigenom även vunnits ett visst magasin för vattnet.

2/ Sträckan I - 2+10 av vallen I - K var ej byggd. Sträckan 2+10 - K av samma vall hade förlängts åt öster fram till högmarken norr om ägofig. 19.

Markytan mellan punkt I och ägofig. 19 ligger på höjden +11,0 m och därutöver. Enligt vid närmaste kustpegel, Kungsholms fort utanför Karlskrona, verkställda mätningar, har vattenståndet i havet under de senaste 150 åren endast fem gånger uppnått eller överstigit höjden +11,0 m, således i medeltal en gång vart 30-de år. Området mellan denna vall och Mörrumsån är avsett att utläggas till betesvallar, varför en enstaka översvämning kan beräknas vålla ringa skada. På grund härav får jag tillstyrka, att företaget godkännes i befintligt skick.

Enligt uppvisade räkenskaper hava kostnaderna för företaget uppgått till:

Pumpstation med pump, kraftledning och el.installation	6.950:-	kr
Vallen vid pumpstationen, sträckan E - A - F	3.850:-	"
" utmed Mörrumsån, " G - B ¹ - C ¹ - H	3.100:-	"
Den utförda delen av vallen vid gamla pumpstationen	750:-	"

hand. o. bet. ej

Transport 14.650:- kr

	Transport	14.650:-	kr
Rörledningarna		12.850:-	"
Arbetsledning, räntor m.m.	ca	<u>1.000:-</u>	"
		28.500:-	kr
Härtill kommer förrätningskostnader och domstols- avgift		<u>648:47</u>	"
	Summa	<u>29.148:47</u>	kr

Karlskrona den 6 oktober 1942.

Thore Möller
Thore Möller

1575 41
Elleholms Hovgårds invallningsföretag år 1939.

Blekinge län.

DIARIE Nr 5806

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MRS. 1940

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-
lån sökes.

Elleholms socken.

Elleholm	13 ¹	2	mtl	} äg. Edgar Schander
"	14 ¹	1/4	"	
"	15 ²	1/8	"	
"	15 ³	1/8	"	
"	16 ²	1/6	"	
"	17 ¹	1/8	"	
"	21 ¹	1/4	"	

Karlskrona 1 december 1939.

Edgar Schander

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1/ 1 häfte handlingar.

3/ Kontrakt i 2 ex.

5/ Skuldförbindelse.jämte utdrag av taxeringslängderna.

7/ Rekvisitioner å bidrag och lån.

Samtidigt får jag meddela, att godsägare Edgar Schander numera är ensam ägare till ifrågavarande fastigheter.

Uwe Möller

R a p p o r t

Över verkställd besiktning av Elleholms Hovgårds invallningsföretag
år 1939 i Elleholms socken av Blekinge län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Statsbidrag : 13.820:- kr

Statslån : 13.820:- "

Kontrakt ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ende intressent; Godsägaren Edgar Schander, Elleholm, Vekerum.

Vid av undertecknad den 22 denna månad verkställd besiktning av ovan angivna företag befunnos pumpstationen, vallen vid denna samt dikessträckan A - B - C - 6+00 utförda i enlighet med den fastställda planen. Därjämte hade samtliga rör till övriga avloppssträckor levererats.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete och levererad materiel beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till:

Vallen vid pumpstationen, sträckan E - A - F	2.800:- kr.
Pumpverk och pumpstation	5.600:- "
Sträckan A - B - C - 6+00	5.310:- "
Samtliga rör till övriga dikessträckor	2.792:50"
Summa	16.502:50 kr
Härtill komma förrättningskostnader och domstolsavgift	648:47 "
Summa	17.150:97 kr

motsvarande omkring 62 % av den beräknade anläggningskostnaden
27.648:47 kr.

Karlskrona den 25 juli 1941.

136

306
41

K 3-0208

DIARIE Nr 13257

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL. 1941

1/2 hand

Anmälan t. Ordfr. i St. A. E.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 7/8 1941

godkända den 21/8 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
Elleholms Hovgårds invallningsföretag år 1939 i Elleholms socken av
BLEKINGE LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels *statsbidrag* med trettontusenåttahundratjugo (13.820)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med trettontusenåttahundratjugo (13.820)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{enda delägare i} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elleholm den 26 juni 1941.

Edgar Schander

Att godsägaren Edgar Schander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Holmberg.
Adress Vekum.

Martha Holmberg.
Adress Vekum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1941.

Lantbruksstyrelsen

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

668
