



Akt nr:

P-F2a-LS161/56

AU\$P-F2a-LS161/56

F:nr. 372.

18.

161

Handlingar *nigens*
angående

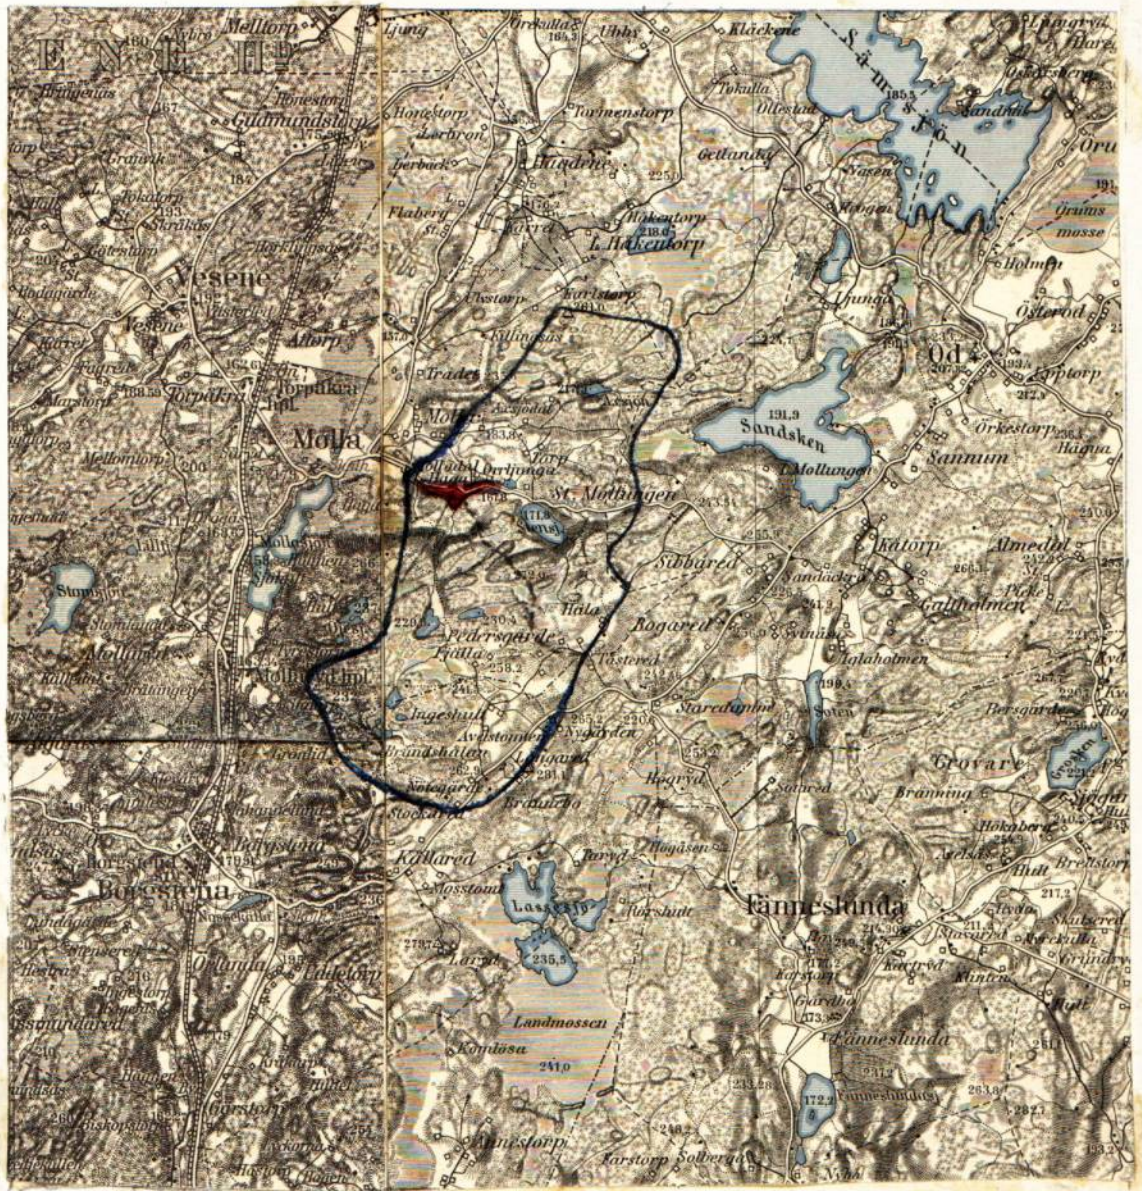
ORRLJUNGA DIKNING AV ÅR 1956

i Molla socken av Älvsborgs län.
Upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1956.

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2,3
Ansökan och förordnande	4,5
Förening	6,7
Utlåtande	8-12
Värderingslängd	13-14
Kostnadsförslag	15
Kostnadsfördelningslängd	16

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avlopps-diken genom och från mark till Orrljunga nr.1³, Molla Skattegården nr.5¹ och Lilla Haga nr.5¹ i Molla socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Hos Sven, Erik och Gunnar Svensson, Orrljunga, den 19 nov.1956 kl.16.

Närvarande: undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman samt intressenterna:

Sven Svensson, Erik Svensson och Gunnar Svensson, äg. till Orrljunga nr.1³

Arvid Lindström, äg. till Molla Skattegården 5¹

Erik Friberg, äg. till Lilla Haga 5¹

Vägmästaren i Vägmästareområde P 9 Erhard Holmqvist, Ljung.

§ 2.

Redogöres för upprättat förslag till företagets utförande.

§ 3.

Vägmästare Holmqvist meddelar att vägförvaltningen vill ha anbud på följande alt. beträffande bro över avloppet för landsvägen Molla-Od:

1. Anbud å upprensning utav vattenöppningen genom brovalvet för det fall att grundläggningen tillåter dylik upprensning.
2. Läggnig av rör genom brovalvet på omkring 5 meters längd, om brovalvet skall stå kvar. Anbud böra ange pris pr.meter.
3. Kostnad pr.meter för läggning av rör uppströms bron på omkring 8 meters längd samt rivning av gamla bron med stenen upplagd invid bron, så att den kan hämtas. Eventuellt hämtas den direkt av vägförvaltningen.

Vilket av dessa förfaringssätt, som kan finnas lämpligt, bör bestämmas, då avloppet uppgrävts fram till bron, så att undersökning kan verkställas i bron.

De närvarande ha ingen erinran häremot.

§ 4.

Förening angående kostnadsfördelning bilägges protokollet.

§ 5.

Avgives utlåtande.

§ 6.

Till förtroendeman utses Sven Svensson, Orrljunga, Torpåkra.

§ 7.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

Sven Svensson

lantbruksingenjör.

Ank. 2 JUN 1954

Diariernr.

Till

4.

LANTBRUKSNÄMNDEN BORÅS Ank. 26. MAJ 1954 Diariernr.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förord-
nande för vederbörlig förrättningsman att handlägga syne-
förrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av
mark till fastigheterna Orrljunga 1³ och Lilla Haga 5:1. Molladel
i Molla socken av Älvsborgs län.

Orrljunga, Torpåkra den 25-5-1954

Sven Svensson. Erik Svensson. Gunnar Larsson.

*Erik Friberg
L:a Haga
Torpåkra*

*David Svensson
Molladel*

Torpåkra.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 26 maj 1954.
På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund
(Sven Ekelund)





R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.
Vänersborg i landskansliet den 28 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Åke Paulsson


Chr. Fahlgren

Förening.

Undertecknade delägare i "Orrljunga dikning av år 1956" i Molla socken, Älvsborgs län, som tagit del av upprättat förslag till företags utförande hava träffat följande avtal.

Kostnaden för avloppens uppgrävning och framtida underhåll skall fördelas enligt nedanstående andelstal.

Fastighet	RN	Ägare	Andel i procent
Orrljunga nr. 1 ³		Sven Svensson, Erik Svensson o. Gunnar Svensson	78 procent
Molla Skatteg. 5 ¹		Arvid Lindström	18 - " -
Haga nr. 5 ¹		Erik Friberg	4 - " -

Några ersättningar skola ej utgå varken i samband med avloppens uppgrävning eller framtida underhåll.

Till företags styrelse utses *Sven Svensson* som befullmäktigas att vidtaga åtgärder för företags utförande samt uppbära det statsunderstöd, som kan komma att anvisas.

Orrljunga pr. Torpåkra den 19 nov. 1956.

*Sven Svensson,
Erik Svensson,
Gunnar Svensson
Arvid Lindström,
Erik Friberg*

Egenhändiga namnteckningar bevitnas:

Sven Svensson

Förestående

7
förening, som av mig befunnits skälig och lämplig, vitsordas:

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Orrljunga nr.1³, Molla 5¹, Haga 5¹ och Mollaryd 4¹² i Molla socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilket bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget omkring 2 km. öster om Molla kyrka å ömse sidor om den bäck, som från Stensjön rinner längs landsvägen mellan Molla och Od.

Vattnet från området rinner till Nossan omkring en km. nedom utloppet från Mollasjön.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom meddelade Länsstyrelsen den 28 maj 1954 förordnande angående företaget.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Allmänna intressen.

I samband med företagets utförande skall läggas en trumma av 1,4 m. rör genom landsvägsbron över avloppet i rågång mellan Orrljunga och Molla för det fall att upprensning av broöppningen ej är möjlig. Arbetet skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i länet. Vägförvaltningen äger själv avgöra om nuvarande valvbro av sten skall utrivas eller bibehållas. Bron, som är byggd 1918, torde ej få anses som fornminne.

Uppgrävning utav de avloppssträckor, som ingå i företaget medför ej någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering och sammanställning av tillgäng-

liga kartor över det markområde, dikningen berör, varefter ytavvägning verkställets. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge angives av på kartan införda fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen!

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 8 kvkm. vid punkt 11 och 16 kvkm. vid punkt 6.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 1 km.³ i sek. i vardera av de diken, som går genom Orrljunga nr.1³ till deras föreningspunkt i rågång mellan Orrljunga nr.1³ och Molla nr.5¹.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav på bilagda plan- och profilritningar till dimensioner och bottenlägen närmare angivna avloppssträckor.

Broar.

I samband med avloppens fördjupning skall utföras brotrumma av 1,4 m. rör vid 2+32, av 1,2 m. rör vid 8+10 och 22+50 samt gångspång vid 0+40.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner har uppskattats jämlikt bestämmelserna i vattenlagen. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr. hektar efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr. hektar och pr. ägofigur.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Kostnadsfördelning.

Skäl till företagets uppdelning i avdelningar för jämkning i kostnadsfördelningen jämlikt bestämmelser i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skola fördelas på berörda fastigheter efter i bilagd kostnadsfördelningslängd införda andelstal.

Ersättningar.

Några ersättningar skall ej utgå varken i samband med avloppens uppgrävning eller underhåll.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och förses med öppningar för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket full-

ständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten i avloppet på egen mark, skall kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må ej tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgäder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1958. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Orrljunga dikning av år 1956".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtaget föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Orrljunga den 19 november 1956.

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Molla socken.</u>							
<u>Molla Skattegården 5⁴.</u>							
<u>Arthur Persson</u>							
äng Summa	1		0,12		1200	500	60:-
<u>Haga 5¹</u>							
<u>Erik Friberg</u>							
äng	2		0,16		1200	500	80:-
"	3		0,02		"	500	10:-
odlingsmark	4		0,68		1500	800	544:-
Summa			0,86				634:-
<u>Molla Skatteg. 5¹</u>							
<u>Arvid Lindström</u>							
äng	5		0,67		1200	500	335:-
"	6		0,64		"	500	320:-
"	7		0,79		"	500	395:-
odl. mark	8		1,63		"	500	815:-
åker	9	0,17			2000	800	136:-
"	10	0,29			3000	1200	348:-
"	11	0,15			3000	1200	180:-
"	12	0,11			3000	1000	110:-
Summa		0,72	3,73				2639:-
<u>Orrlunga 1³</u>							
<u>Sven Svensson, Erik Svensson</u>							
<u>och Gunnar Svensson</u>							
åker	13	0,60			3000	1000	600:-
"	14	0,33			"	1200	396:-
"	15	0,55			"	1200	660:-
Överföres		1,48					1656:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+00-6+21	621	Schaktning av morän, blocksten m ³	130	7:-	910:-	
		" " mjäla med sten och block "	650	3.50	2275:-	
		" " torvj.med sten och block "	1100	2:-	2200:-	
		Sprängsten "	10	20:-	200:-	
6+21-10+80	459	Schaktning av mjäla "	350	3:-	1050:-	
		" " torvj. "	750	2:-	1500:-	
10+80-11+80	100	Rensning m.	100	2:-	200:-	
20+00-23+21	321	Schaktn. av torvjord m ³	500	2:-	1000:-	
		" " mjäla, sten och block "	350	3.50	1225:-	
		" " torvjord "	300	2:-	600:-	11160:-
Q+40		Gångspång			100:-	
2+32-2+36	4	Vägtrumma av 1,4 m.rör			600:-	
8+10-8+14	4	" " 1,2 " "			500:-	
22+50-22+54	4	" " 1,2 " "			500:-	
		Tillägges			1140:-	14000:-
Orrljunga den 19 nov. 1956.						
<i>Benick Persson</i> lantbruksingenjör.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Molla socken.</u>						
<u>Molla Skatteg. 5⁴</u>						
Arthur Persson	-	60:-		-	-	
<u>Haga 5¹</u>						
Erik Friberg.	s	634:-		560:-	4	
<u>Molla Skatteg. 5¹</u>						
Arvid Lindström	s	2639:-		2520:-	18	
<u>Orrljunga 1³</u>						
Sven Svensson, Erik Svensson						
Gunnar Svensson	s	11701:-		10920:-	78	
<u>Summa</u>		15034:-		14000:-	100	

Orrljunga den 19 nov. 1956.

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.
