809

Nybble-Hilfröslunda

dikningsföretag år 1957

i Överselö socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 61 Mälaren-Norrström

38

Handlingar

rörande

Nybble-Kilprö Skunda dikningsföretag år 1957

i Overselö socken, Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Martin Ringström.

Statens lantbruksingenjör.

Fastighetsbeskrivningar.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Nybble Kilfröstunda och Ärnesta i Överselö socken, Södermanlands län.

Den 24 september 1957.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit på därom gjord ansökning, /Bil. A./ av Kommunens Befallningshavande i länet förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 f.m. hos majoran Anders Björkman, Nybble, till vilket sammanträde kallelse utgått till sökanden och goteman.

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad lantbruksingenjör och de för förrättningen tillkallade gotemännen

Bertil Jarl, Klahammar, och
Hans Käll, Odensiche.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sökande närvarande.

Gunnar Hyll, ägare av 3/32 mtl. Nybble 15.
Ida Maria Björkman, " " 3/32 " do 17,
3/16 " do 34
3/16 " do 35.

biträdd av sin make, majoran Anders Björkman.
Fru Ingrid Engström, såsom ombud enligt fullmakt /Bil. C./ för
Johan Ahlström, ägare av 3/16 mtl. Nybble 23.

Rasmus Karlsson, ägare av 5/16 mtl. Kilfröslunda 22
5/32 " " " 23
5/32 " " " 32
för egen del och såsom ombud enligt fullmakt för 6 2/ fvd
Ofv. Anna Kristina Karlsson, ägare av 5/32 mtl. Kilfröslunda 24
5/16 " " " 32
Petter Hällbom, ägare av 5/32 mtl. Kilfröslunda 33
Martin Söderholm, " " arr. Ämnesta 51
Ordföranden för Högsamfällighetens Östings-Ämnesta, ägoområde
Iten Wahlström, Ämnesta.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Kronofogdens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmännen eller de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt förskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och åsyftningar av de berörda markernas verkställts genom förrättningsmännens försorg, därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i sammanträdet, varjämte förrättningsmannen redogjorde för preliminära beräkningar rörande företaget.

§ 4.

Sökandens till företaget yrkade, att erforderliga anslag skulle anordnas för kartläggning av deras i företaget in-

gående marker i huvudsaklig överensstämmelse med det av förvaltningsmannen preliminärt framlagda förslaget med förändringar.

§5.

Justerandemannen Dagnar Karlsson, Kilfrösunda, anmäldes förening med förhandens om företagets utförande enligt föreningsskrivelse, som vitsordades medelst syneförrättningsmannens påskrift. (Bil. D.)

§6.

Upplystes, att den av företaget berörda sträckan för enskilda vägen Vittinge - Stenerta vid punkt 12+57 tillkommit före år 1921.

§7.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån till företagets utförande. Statsunderstöd bade icke tidigare utgått för upptagande av de i företaget ingående avloppen.

§8.

Förvaltningsmannen meddelade, att besiktning av och värdering av marknerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos ovanstående Anders Björkman, Stybble, onsdagen den 20 november 1957 kl. 10 f.m.

§9.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Stybble pr. Stallarholmen den 24 september 1957.

Vid förrättens vägnar:

Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör

Karin Käll

Biträdande sekreterare

Den 20 november 1957.

Föreståndaren förklarade sammanträdet öppnat och anmälde att ansökan om fastighetsregleringsförrättning inkommit från delägarna i Nybble, Ytterby socken, Kalmar län, att förrättningen skulle avse fastigheten Nybble 1:5 och att förrättningsmannen Anders Björkman, Nybble, Ytterby socken, Kalmar län, utsetts att handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande

Gunnar Hyll, ägare av 3/32 mtl. Nybble 1:5.
Ina Maria Björkman, " " 3/32 " " 1:7,
3/16 " " 3:4 och
3/16 " " 3:5,

biträdd av sin make, magister Anders Björkman.

Ingve Karlsson, såsom ombud, dels för
Ragnar Karlsson, ägare av 5/16 mtl Kilfjösunda 2:3,
5/32 " " 2:3 och
5/32 " " 3:4

och dels för
Anna Kristina Karlsson, ägare av 5/32 mtl Kilfjösunda 2:4 och
5/16 " " 3:2.
Verner Karlsson, " 5/32 " " 3:3.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till tomtläggning av de i företaget ingående marknerna, för de därför beräknade kostnaderna, bötnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Av värderingslängden upplystes det för varje fastighet beräknade bötnadsvärdet samt av kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Enligt gällande föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska Stationen i Örebro, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning. /Bil § 1 o § 2/

§ 12.

Syneförrättens utlåtande upplästes, varvid besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Östersysslets nämndemannatinget, Storkholm.

§ 13.

Beslöts att tillsätta en styrelse av tre personer för företaget ävensom två revisorer.

Till ordförande och kassör i styrelsen samt aktförvarare utsågs magister Anders Björkman, Styrbole pr. Stallarholmen, och till övriga ledamöter utsågos Ingve Karlsson, Vilfrösklunda, och Verner Hallbom, Vilfrösklunda.

Till revisorer utsågos Gunnar Hyll, Styrbole, och Sten Wahlström, Åmsta.

Styrelsen bemyndigades att för bestridande av kostnader för företaget upptaga lån å högst 30.000:- kronor

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att räkning å det till Statsverket utgående arvodet för förrättningen komme att översändas genom lantbruksnämndens kamrerare. Övriga kostnader för förrättningen anteckna des å specifikation till räkningen, som skulle bifogas förrättningshandlingarna.

7

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Skyttble pr Stallarholmen den 20 november 1907.

Å tjänstens vägnar:
Martin Ljungström.
Statens Lantbruksingenjör.

Bevittnas:

Bitr. lands ordföranden.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

Nyköping.

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
Landskansliet
26 NOV 1956
III 'M 16 J6

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Nybble och Kilfröslunda i Överselö socken, Södermanlands län.

Företaget avser torrläggning av omkring 15 har åker, upptagande av omkring 1500 m. avlopp och berör å omstående sida angivna fastigheter och ägare.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till magister Anders Björkman, Nybble, Stallarholmen, tel. Överselö 53. 41051

Nybble pr Stallarholmen den 6/10 1956.

Maria Björkman

Gunnar Flyckt

Anna Kristina Karlsson

Verner Hällbom

Företaget synes beröra följande fastigheter och ägare.

3/32 mtl Nybble 1^{5} ..... ägare: Gunnar Hyll.

3/32 " " 1^{7} .....
3/16 " " 3^{4} ..... } " Maria Björkman.
3/16 " " 3^{5} .....

3/16 " " 2^{2} ..... " Johan Olsson.

5/16 " Kilfröslunda 3^{2} ..... " Anna Kristina Karlsson.

5/32 " " 3^{3} ..... " Verner Hällbom.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjören i Södermanlands län.

Nyköping den 16 november 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

/ Åke Calmnder

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

Bil. B.

IIIM 16 56.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Maria Björkman m.fl., Nybble, Stallarholmen, gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt vattenlagen hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande fastigheterna Nybble och Kilfröslunda i Överselö socken, Stallarholmens kommun, förordnas på förslag av lantbruksnämnden i länet, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas.

Nyköping i landskansliet den 28 november 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Ekbom.

Tor Junkkvist.

Statens Lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Bilaga 6.

FULLMAKT

för Sigrid Engström (Ohlsson) eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nybble, Kilfröslunda och Ärnesta i Överselö sock en av Södermanlands län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nybble, Stallarholmen den 24/9 1957.

Johan Ohlsson

Sigrid Engström

Bevittnas:

Gustav Wahlgrist.

Ebba Selin

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 12.

FULLMAKT

för sämmansmannen Hugo Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nybble, Kilfröslunda och Ärnesta i Överselö sock en av Södermanlands län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kilfröslunda, Stallarholmen den 24/9 1957.

Anna Kristina Karlsson

Bevittnas:

Hilmer Andersson Elsa Pettersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. D.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad, ägare av fastigheterna Kilfröslunda 2^2, 2^3 och 3^4, förklarar mig härmed göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Nybble och Kilfröslunda i Överselö socken, Södermanlands län, med yrkande, att erforderliga avlopp måtte upptagas även för torrläggning av mina i företaget ingående marker.

Kilfröslunda pr Stallarholmen den 24/9 1957.

Ragn. Pärsson

Förestående förening vitsordas och bevittnas:

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

Bil. E!

KEMISKA STATIONEN
ÖREBRO
Adress: Stortorget 18
Telefon 11 03 57
Postgiro nr 68471

LANTBRUKSNÄMNDEN
SÖDERMANLANDS LÄN
Inkd 24 SEP. 1957
D.nr Arkiv n:r
Centralreg.

KOPIA

Analysbevis N:r 1251

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Herr Anders Björkman, Nybble, Stallarholmen,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 21/9 1957.

Märke: Prov fr. Östra diket.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	18,8	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO_2	63,8	mg/l
Aggr. " " " " "	0	"

Örebro den 23 sept. 19 57

Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Analysavgift Kr. 11:50

~~*Kvitteras.*~~

F. G. LARSSONS TR. AB. ÖREBRO 787

Bil. E. 2

KEMISKA STATIONEN
ÖREBRO
Adress: Stortorget 18
Telefon 11 03 57
Postgiro nr 68471

LANTBRUKSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN
Inkd. 24 SEP. 1957.
D.nr Arkiv n:r
Centralreg.

KOPIA

Analysbevis N:r 1252

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Herr Anders Björkman, Nybble, Stallarholmen,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 21/9 1957.
Märke: Prov fr. Västra diket, Kilsfröslunda.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	63,3	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO_2	45,1	mg/l
Aggr. " " " " "	0	"

Vattnet torde innehålla stor mängd natriumbikarbonat, som medtitreras vid best. av karbonathårdheten.
Den verkliga hårdheten torde dock vara tillräcklig för att aggressiviteten skall bliva obetydlig.

Örebro den 23 sept. *19* 57

Analysavgift Kr. 11:50

Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

~~*Kvitteras:*~~

F.G. LARSSONS TR. AB. ÖREBRO 787

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
3/16 mtl Nybble 3⁵.							
Maria Björkman.							
Åker, lermylla på lera	1	0,25		2400	3000	600	150:--
" " " "	2	0,65		900	3000	2100	1365:--
" " " "	3	0,70		900	3000	2100	1470:--
" " " "	4	0,26		2400	3000	600	156:--
" " " "	5	0,74		2550	3000	450	333:--
" " " "	6	0,74		1050	3000	1950	1443:--
" " " "	7	0,29		1800	3000	1200	348:--
" " " "	8	0,15		2100	3000	900	135:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppen:							
41+4 - B, 139 m à 7:-							973:--
B - 3+79, 94 " " 8:-							752:--
Summa	1-8	3,78					7125:--
3/16 mtl Nybble 3⁴.							
Maria Björkman.							
Åker, lermylla på lera	9	0,62		2250	3000	750	465:--
" " " "	10	0,59		1050	3000	1950	1150:50
" " " "	11	0,14		2250	3000	750	105:--
" " " "	12	0,14		900	3000	2100	294:--
" " " "	13	0,05		1050	3000	1950	97:50
" " " "	14	0,33		1050	3000	1950	643:50
" " " "	15	0,22		2400	3000	600	132:--
" " " "	16	0,32		900	3000	2100	672:--
" " " "	16a	0,35		900	3000	2100	735:--
" " " "	17	0,30		1050	3000	1950	585:--
" " " "	18	0,29		2400	3000	600	174:--
" " " "	19	0,15		1800	3000	1200	180:--
" " " "	20	0,18		1050	3000	1950	351:--
Transport	9-20	3,68					5584:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	9-20	3,68					5584:50
Åker, lermylla på lera	21	0,27		2400	3000	600	162:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppen:							
5+17-6+80, 162 m. å 7:-							1134:--
20 - 22+80,278 " " 7:-							1946:--
Summa	9-21	3,95					8826:50
3/32 mtl Nybble 1[7].							
Maria Björkman.							
Åker, lermylla på lera	22	0,19		2400	3000	600	114:--
" " " "	23	0,08		1050	3000	1950	156:--
" " " "	24	0,21		1050	3000	1950	409:50
" " " "	25	0,25		2100	3000	900	225:--
" " " "	26	0,37		2400	3000	600	222:--
" " " "	27	0,31		1500	3000	1500	465:--
" " " "	28	0,30		1350	3000	1650	495:--
" " " "	29	0,16		1950	3000	1050	168:--
" " " "	30	0,26		2400	3000	600	156:--
" " " "	31	0,15		2400	3000	600	90:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppen:							
6+80-7+58, 77 m. å 7:-							539:--
22+80-24+7, 126 " " 7:-							882:--
Summa	22-31	2,28					3921:50
3/32 mtl Nybble 1[5].							
Gunnar Hyll.							
Åker, lermylla på lera	32	0,19		1200	3000	1800	342:--
" " " "	33	0,09		1200	3000	1800	162:--
" " " "	34	0,40		2400	3000	600	240:--
" " " "	35	0,31		2250	3000	750	232:50
" " " "	36	0,20		2100	3000	900	180:--
Transport	32-36	1,19					1156:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	32-36	1,19					1156:50
Åker, lermylla på lera	37	0,14		1050	3000	1950	273:--
" " " "	38	0,17		1050	3000	1950	331:50
" " " "	39	0,10		2550	3000	450	45:--
" " " "	40	0,22		2400	3000	600	132:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppet 7+58-8+47, 89 m. à 7:-							623:--
Summa	32-40	1,82					2561:--
3/16 mtl Nybble 2^2.							
Johan Ohlsson.							
Åker, lermylla på lera	41	0,78		2700	3000	300	234:--
" " " "	42	0,23		1500	3000	1500	345:--
" " " "	43	0,24		1350	3000	1650	396:--
" " " "	44	0,42		2550	3000	450	189:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppen:							
A - 41+4, 145 m. à 7:-							1015:--
8+53-10+16,162 " " 7:-							1134:--
Summa	41-44	1,67					3313:--
5/16 mtl Kilfröslunda 3^2.							
Anna Kristina Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	45	0,20		1050	3000	1950	390:--
" " " "	46	0,21		2100	3000	900	189:--
" " " "	47	0,23		2550	3000	450	103:50
" " " "	48	0,09		2250	3000	750	67:50
" " " "	49	0,16		1050	3000	1950	312:--
" " " "	50	0,29		900	3000	2100	609:--
" " " "	51	0,10		2250	3000	750	75:--
" " " "	52	0,20		2250	3000	750	150:--
" " " "	53	0,10		1500	3000	1500	150:--
Transport	45-53	1,58					2046:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	45-53	1,58					2046:--
Åker, lermylla på lera	54	0,19		1650	3000	1350	256:50
" " " "	55	0,70		2250	3000	750	525:--
" " " "	56	0,28		2550	3000	450	126:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppet 10+16-12+13, 190 m. à 5:-							950:--
Summa	45-56	2,75					3903:50
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{3}.							
Verner Hällbom.							
Åker, lermylla på lera	57	0,52		2550	3000	450	234:--
" " " "	58	0,38		2100	3000	900	342:--
" " " "	59	0,10		2400	3000	600	60:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppet 12+13-12+56, 43 m. à 5:-							215:--
Summa	57-59	1,00					851:--
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{4}.							
Ragnar Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	60	0,24		2400	3000	600	144:--
" " " "	61	0,41		1350	3000	1650	676:50
" " " "	62	0,08		1050	3000	1950	156:--
" " " "	63	0,11		2400	3000	600	66:--
" " " "	64	0,43		2400	3000	600	258:--
" " " "	65	0,46		1200	3000	1800	828:--
" " " "	66	0,61		2250	3000	750	457:50
" " " "	67	0,19		2250	3000	750	142:50
" " " "	68	0,18		1950	3000	1050	189:--
" " " "	69	0,21		1950	3000	1050	220:50
Brukningsbåtnad genom utförande							
Transport	60-69	2,92					3138:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	60-69	2,92					3138:--
av avloppen:							
12+62-50+30, 218 m. à 7:-							1526:--
50+30-50+56, 25 " " 3:50							87:50
16+63-17+60, 97 " " 6:-							582:--
17+60-18+40, 80 " " 5:-							400:--
Summa	60-69	2,92					5733:50
5/16 mtl Kilfröslunda 2[2].							
Ragnar Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	70	0,06		1800	3000	1200	72:--
" " " "	71	0,34		1500	3000	1500	510:--
" " " "	72	0,11		1050	3000	1950	214:50
" " " "	73	0,20		900	3000	2100	420:--
" " " "	74	0,16		900	3000	2100	336:--
" " " "	75	0,20		750	3000	2250	450:--
" " " "	76	0,15		900	3000	2100	315:--
" " " "	77	0,29		1200	3000	1800	522:--
" " " "	78	0,42		2550	3000	450	189:--
" " " "	79	0,60		2250	3000	750	450:--
" " " "	80	0,70		2250	3000	750	525:--
Brukningsbåtnad genom utförande av avloppen:							
50+30-50+56, 25 m. à 3:50							87:50
50+56-52+29, 179 " " 6:-							1074:--
Summa	70-80	3,23					5165:--
Avst. Ärnesta 5[3].							
Martin Söderholm.							
Åker, lermylla på lera	81	0,38		2400	3000	600	228:--
" " " "	82	0,32		1650	3000	1350	432:--
" " " "	83	0,30		2700	3000	300	90:--
Summa	81-83	1,00					750:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
S A M M A N D R A G.							
3/16 mtl Nybble 3^{5}							
Maria Björkman	1-8	3,78					7125:--
3/16 mtl Nybble 3^{4}							
Maria Björkman	9-21	3,95					8826:50
3/32 mtl Nybble 1^{7}							
Maria Björkman	22-31	2,28					3921:50
3/32 mtl Nybble 1^{5}							
Gunnar Hyll	32-40	1,82					2561:--
3/16 mtl Nybble 2^{2}							
Johan Ohlsson	41-44	1,67					3313:--
5/16 mtl Kilfröslunda 3^{2}							
Anna Kristina Karlsson	45-56	2,75					3903:50
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{3}							
Verner Hällbom	57-59	1,00					851:--
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{4}							
Ragnar Karlsson	60-69	2,92					5733:50
5/16 mtl Kilfröslunda 2^{2}							
Ragnar Karlsson	70-80	3,23					5165:--
Avst. Ärnesta 5^{3}							
Martin Söderholm	81-83	1,00					750:--
Summa	1-83	24,40					42150:--

Nybble pr Stallarholmen den 20 november 1957.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A-B-C.				
A B 0 - 42+30 =40 =2+85	230	Rörledning av 37,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s lantbruksrör lm.	228	9:50	2166:--	
		D:o av dubbelt grenrör 37,5/15 cm vid 41+43 st.	1		20:--	
		Schaktning av lera	260	2:50	650:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	229	2:50	572:50	
		Trumöga av betong med rustbädd och förankring vid A			50:--	
		Ytvattenbrunn av 80 cm:s betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 41+4 (2,10 hög)			225:--	3683:50
B 2+85 - 3+79	94	Rörledning av 37,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s lantbruksrör lm.	94	9:50	893:--	
		Schaktning av lera	60	2:50	150:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	94	2:50	235:--	
		Kopplingsbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 3+8			125:--	
		Ytvattenbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 3+79 (2,10 hög)			225:--	1628:--
C 3+79 - 3+86	7	Inköp och frakt av 40 cm:s vägrör lm.	7	15:15	106:05	
		Schaktning av lera och grus genom vägbanken samt upptagning av gamla rör	10	6:-	60:--	
		Rustbädd av 3"x5" virke, 2 st. i bredd			20:--	
	331	Transport			186:05	5311:50

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	331	Transport			186:05	5311:50
		Läggning av rören genom vägbank samt grusfyllning och planering av vägbanan			75:--	
		Ytvattenbrunn av 1,0 m:s betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid C (2,40 hög)			300:--	561:05
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				577:45
Summa	331	Summa kronor				6450:--
		Avloppet C-N-O.				
C N 20 - 21+36 =3+86	136	Rörledning av 25 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 25 cm:s lantbruksrör lm.	135	6:15	830:25	
		Schaktning av lera	80	2:50	200:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	135	2:25	303:75	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid N (2,0 hög)			160:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 20+82			80:--	1574:--
N 21+36 - 22+80	144	Rörledning av 20 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 20 cm:s lantbruksrör lm.	144	3:60	518:40	
		Schaktning av lera	80	2:50	200:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	144	1:75	252:--	
		Kopplingsbrunn av 45 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 22+25			50:--	1020:40
	280	Transport				2594:40

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	280	Transport				2594:40
O 22+80 - 24+7	127	Rörledning av 20 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 20 cm:s lantbruksrör lm.	127	3:60	457:20	
		Schaktning av lera	70	2:50	175:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	127	1:75	222:25	
		Kopplingsbrunn av 45 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 23+26			50:--	904:45
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				351:15
Summa	407	Summa kronor				3850:--
		Avloppet O-P.				
O P 24+7 - 25+48	141	Rörledning av 20 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 20 cm:s lantbruksrör lm.	140	3:60	504:--	
		Schaktning av lera	70	2:50	175:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	140	1:75	245:--	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 24+7, 24+34 och P st.	3	160:-	480:--	1404:--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				146:--
Summa	141	Summa kronor				1550:--
		Avloppet C-D-E.				
C D 3+86 - 4+50	64	Rörledning av 37,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s lantbruksrör lm.	63	9:50	598:50	
	64	Transport			598:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	64	Transport			598:50	
		Inköp och frakt av 1 st. 37,5 cm:s muffrör med fals för krök lm.	1	12:50	12:50	
		Schaktning av lera	70	2:50	175:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	64	2:50	160:--	
		Ytvattenbrunn av 80 cm:s betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid D (2,35 hög)			240:--	1186:--
D E 4+50 - 6+80	230	Rörledning av 30 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s lantbruksrör lm.	214	7:10	1519:40	
		D:o av 15 st. 30 cm:s muffrör, varav 10 st. med fals för krökar lm.	15	8:50	127:50	
		D:o av dubbelt grenrör 30/10 cm vid E st.	1		15:--	
		Schaktning av lera	130	2:50	325:--	
		" " sten och grus	5	6:-	30:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	230	2:25	517:50	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 5+17 (2,0 hög)			160:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 5+96			80:--	2774:40
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				389:60
Summa	294	Summa kronor				4350:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet D-D^1.				
D D^1						
45 - 45+6	6	Rörledning av 22,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s vägrör lm.	6	6:40	38:40	
		Schaktning av lera och grus genom vägbanken	10	5:-	50:--	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd			15:--	
		Läggning av rören samt grusfyllning och planering av vägbanan			50:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid D^1 (2,o hög)			160:--	313:40
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				36:60
Summa	6	Summa kronor				350:--
		Avloppet E-F-G-H-I-K-L.				
E F						
6+80 - 8+52	172	Rörledning av 30 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s lantbruksrör lm.	163	7:10	1157:30	
		D:o av 3 st. 30 cm:s muffrör med fals för krökar lm.	3	8:50	25:50	
		D:o av 30 cm:s vägrör för sträckan 8+47-8+52 lm.	6	8:85	53:10	
		Schaktning av lera	110	2:50	275:--	
		Rivning av gammal stentrumma vid 8+47 samt schaktning av sten och grus genom vägbanken	10	6:-	60:--	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd genom vägen			15:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	166	2:25	373:50	
	172	Transport			1959:40	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	172	Transport			1959:40	
		Läggning av rören genom vägen samt grusfyllning och planering av vägbanan lm.	6		60:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 7+58 och F (2,0 höga) st.	2	160:-	320:--	2339:40
F G 8+52-12+13	361	Rörledning av 30 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s lantbruksrör lm.	339	7:10	2406:90	
		Inköp och frakt av 15 st. 30 cm:s muffrör med fals för krökar lm.	15	8:50	127:50	
		D:o av 30 cm:s vägrör för sträckan 11+5-11+11 lm.	6	8:85	53:10	
		Schaktning av lera	240	2:50	600:--	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd genom vägen vid 11+5			15:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	355	2:25	798:75	
		D:o genom vägen samt grusfyllning och planering av vägbanan lm.	6		90:--	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 10+16, 11+11 och G (2,0 höga)	3	160:-	480:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 10+68			80:--	4651:25
G H 12+13 - 14+50 =50	237	Rörledning av 30 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s lantbruksrör lm.	223	7:10	1583:30	
		D:o av 6 st. 30 cm:s muffrör med fals för krökar lm.	6	8:50	51:--	
	770	Transport			1634:30	6990:65

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	770	Transport			1634:30	6990:65
		Inköp och frakt av grenrör 30/10 cm vid 13+8 och 13+70 st.	2	15:-	30:--	
		D:o av 30 cm:s vägrör för sträckan 12+56-12+62 lm.	6	8:85	53:10	
		Schaktning av lera	160	2:50	400:--	
		Rivning av gammal stentrumma vid 12+57 samt schaktning av sten och grus genom vägbanken	10	6:-	60:--	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd genom vägen			15:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	231	2:25	519:75	
		D:o genom vägen samt grusfyllning och planering av vägbanan lm.	6		60:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 12+62 (2,o hög)			160:--	2932:15
H I 50 - 51+19	119	Rörledning av 30 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s lantbruksrör lm.	117	7:10	830:70	
		D:o av 2 st. 30 cm:s muffrör med fals för krökar lm.	2	8:50	17:--	
		Schaktning av lera	160	2:50	400:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	119	2:25	267:75	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 50+56 (2,0 hög)			160:--	1675:45
	889	Transport				11598:25

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	889	Transport				11598:25
I K 51+19-52+29 =16+63	110	Rörledning av 22,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s lantbruksrör lm.	109	4:60	501:40	
		D:o av 25 cm:s lantbruksrör såsom övergångsrör vid 51+19 lm.	1		6:15	
		Schaktning av lera	110	2:50	275:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	110	2:-	220:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 51+62 (2,o hög)			160:--	1162:55
K L 16+63 - 17+60	97	Rörledning av 22,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s lantbruksrör lm.	92	4:60	423:20	
		D:o av 5 st. 22,5 cm:s muffrör med fals för krökar lm.	5	5:60	28:--	
		Schaktning av lera	40	2:50	100:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm.	97	2:-	194:--	745:20
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				1394:--
Summa	1096	Summa kronor				14900:--
		Avloppet L-M.				
L M 17+60-18+40	80	Rörledning av 22,5 cm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s lantbruksrör lm	70	4:60	322:--	
		D:o av 12 st. 22,5 cm:s muffrör med fals för krökar lm	10	5:60	56:--	
	80	Transport			378:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	80	Transport			378:--	
		Schaktning av lera	30	2:50	75:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m	80	2:-	160:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid M (2,0 hög)			160:--	773:--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				77:--
Summa	80	Summa kronor				850:--
		SAMMANDRAG.				
	331	Avloppet A-B-C			6450:--	
	407	" C-N-O			3850:--	10300:--
	141	" O-P				1550:--
	294	" C-D-E			4350:--	
	6	" $D-D^1$			350:--	4700:--
	1096	" E-F-G-H-I-K-L				14900:--
	80	" L-M				850:--
Summa	2355	Summa kronor				32300:--

Nybble pr Stallarholmen den 20 november 1957.

Martin Ingström

Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för Nybble-Kilfröslunda dikningsföretag år 1957 i Överselö socken, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1957.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S=sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal inom varje avdelning	Kostnad för torrläggningen	Repartitionstal för företaget i dess helhet	Kostnad för laga syneförrättningen
		Kr.ö öre	%	Kr.ö öre	%	Kr.ö öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Avdelning I.						
Ägofigurerna 1-4, 7-16 och 26-31.						
3/16 mtl Nybble 2^{2}						
Johan Ohlsson	-	1015:--	7,0744	728:66	2,2559	32:34
3/16 mtl Nybble 3^{5}						
Maria Björkman	S	5349:--	37,2818	3840:03	11,8886	170:42
3/16 mtl Nybble 3^{4}						
Maria Björkman	S	5505:50	38,3725	3952:37	12,2364	175:40
3/32 mtl Nybble 1^{7}						
Maria Björkman	S	2478:--	17,2713	1778:94	5,5076	78:95
Summa		14347:50	100,0000	10300:--	31,8885	457:11
Avdelning II.						
Ägofigurerna 32-35 och 45-47.						
5/16 mtl Kilfröslunda 3^{2}						
Anna Kristina Karlsson	S	682:50	41,1392	637:66	1,9742	28:30
3/32 mtl Nybble 1^{5}						
Gunnar Hyll	S	976:50	58,8608	912:34	2,8246	40:49
Summa		1659:--	100,0000	1550:--	4,7988	68:79
Avdelning III.						
Ägofigurerna 5-6, 16a och 17-21.						
3/16 mtl Nybble 3^{4}						
Maria Björkman	S	3321:--	65,1560	3062:33	9,4809	135:90
3/16 mtl Nybble 3^{5}						
Maria Björkman	S	1776:--	34,8440	1637:67	5,0702	72:68
Summa		5097:--	100,0000	4700:--	14,5511	208:58

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Avdelning IV.						
Ägofigurerna 22-25, 36-44, 48-66 och 69-80.						
3/32 mtl Nybble 1^{7}						
Maria Björkman	S	1443:50	7,3780	1099:32	3,4035	48:79
3/32 mtl Nybble 1^{5}						
Gunnar Hyll	S	1584:50	8,0986	1206:69	3,7359	53:55
3/16 mtl Nybble 2^{2}						
Johan Ohlsson	-	2298:--	11,7456	1750:09	5,4182	77:67
5/16 mtl Kilfröslunda 3^{2}						
Anna Kristina Karlsson	S	3221:--	16,4630	2452:99	7,5944	108:86
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{3}						
Verner Hällbom	S	851:--	4,3496	648:09	2,0065	28:76
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{4}						
Ragnar Karlsson	S	5002:--	25,5660	3809:34	11,7936	169:06
5/16 mtl Kilfröslunda 2^{2}						
Ragnar Karlsson	S	5165:--	26,3992	3933:48	12,1780	174:57
Summa		19565:--	100,0000	14900:--	46,1301	661:26
Avdelning V.						
Ägofigurerna 67-68 och 81-83.						
5/32 mtl Kilfröslunda 3^{4}						
Ragnar Karlsson	S	731:50	49,3756	419:69	1,2993	18:62
Avst. Ärnesta 5^{3}						
Martin Söderholm	-	750:--	50,6244	430:31	1,3322	19:10
Summa		1481:50	100,0000	850:--	2,6315	37:72
S A M M A N D R A G.						
Avdelning I		14347:50	100,0000	10300:--	31,8885	457:11
" II		1659:--	100,0000	1550:--	4,7988	68:79
" III		5097:--	100,0000	4700:--	14,5511	208:58
Transport		21103:50	-	16550:--	51,2384	734:48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Transport		21103:50	-	16550:—	51,2384	734:48
Avdelning IV		19565:—	100,0000	14900:—	46,1301	661:26
" V		1481:50	100,0000	850:—	2,6315	37:72
Summa		42150:—	-	32300:—	100,0000	1433:46

Nybble pr Stallarholmen den 20 november 1957.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:1 000 000.
Nybyholm
Hjulstafjärden
Knöhällen
Oknö-
fjärden
Staby
Arnö
Arnö-
fjärden
Säby
Aspö
Gisselfjärden
Norrfjärden
Grönsöfjärden
Grönsö
Morrarö-
fjärden
Jansłunda
Algö
Hornby-
viken
Fogdö
Vansö
Överselö
Tynnelsö gård
TYNNELSÖ
Segerösfjärden
Strängnäs
Stallarholmen
Roteby
Hyvena
Kinger
Lagnö
Klahammar
Hästa
Vaxängsfj.
Väraäng
Sjöborg
Stadsskogen
Johannesberg
Ulvhällsfj.
Tynäs
Tynässkär
Segerön
Visholmen
Valhall
Eldsund
Skaskären
Ireshammar
Karlsborg
Lundbyholme
St. Skimpälsen
Sundin
Sjukhus
Norrskär
Vaxängsskär
S. Ljuprik
Ljuprik
Fogerhult
Knappunge
Brålarp
Stenby
Skolli
Askh.
Hästh.
St. Rullingen
L. Rullingen
Prästholmen
Rosendal
Sandu
Strängnäs fjärdar
Ellma
Mora
Nyby
Österby
Söderby
Valla
Hälby
Askare
Ask
Ov.
Valliesta
Nedl.
Plogsta
Rosendal
Sjöstugan
Tegelängen
Havgården
Gränna
Skär
Vadholm
Vadholmsh.
Vadholmsv.
Veckhäl
Veckhälsk.
Frösta
Vossnäs
Marby
Gryth
Lund
Hamarn
Dalby
Hästäng
Hästängsb.
Lagnö
Rysegrd
Näsudden
Lindö
Lindöäng
Lönnhorn
Lönnbergaholm
Tegeltorp
Janslundah.
Gröndal
Sveaborg
Apalvik
Algönäs
Algöholm
Hästh.
Solö
Runsö
Vikbyvik
Nyttorp
Nyttorpsvik
Nyttorpsudd
Nyttorpsgrund
Nyttorpsskär
Nyttorpsholm
Nyttorpsbrygga
Nyttorpsbadet
Nyttorpsbadets
Nyttorpsbadets
Nyttorpsbadets

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Nybble, Kilfröslunda och Ärnesta i Överselö socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr 61, 3 - 4 km. nordost om Överselö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 24,40 har åker.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits utförande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna rörledningarna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M, C-N-O-P och D-D^1.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 91 har. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter har angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 1,2 - 1,5 sekundliter pr har till 110 liter pr sekund från området i dess helhet.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 37,5 cm. å sträckan A-B-C-D, 30 cm. å sträckan D-E-F-G-H-I, 25 cm. å sträckan C-N, 22,5 cm. å sträckorna I-K-L-M och D-D^1 och 20 cm. å sträckan N-O-P. Minsta bottenlutningen är 1,6:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4})\sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas trumöga av betong vid A, ytvattenbrunnar med botten och lock av betong av 1,0 m:s betongrör vid C, av 80 cm:s betongrör vid 41+4, 3+79 och D och av 60 cm:s betongrör vid 5+17, 7+58, F, 10+16, 11+11, G, 12+62, 50+56, 51+62, M, N, O, 24+34 och P, kopplingsbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 3+8, av 60 cm:s betongrör vid 5+96,

10+68 och 20+82 och av 45 cm:s betongrör vid 22+25, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har befunnits vara fritt från aggressiva syror, varför dess angreppsförmåga på betong ansetts obetydlig eller praktiskt taget ingen. Någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören har därför ansetts icke vara erforderlig. Betongrören skola dock vara tillverkade av vibrerad betong, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen och Svenska kommunaltekniska föreningen fastställda normer för rör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Genom anordnandet av rörledningarna bliva några särskilda brobyggnader icke erforderliga. Vid de berörda vägbroarna vid 3+79, D, 8+47, 11+5 och 12+56 skall dock vägrör användas och körbanorna återställas i farbart skick.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen.

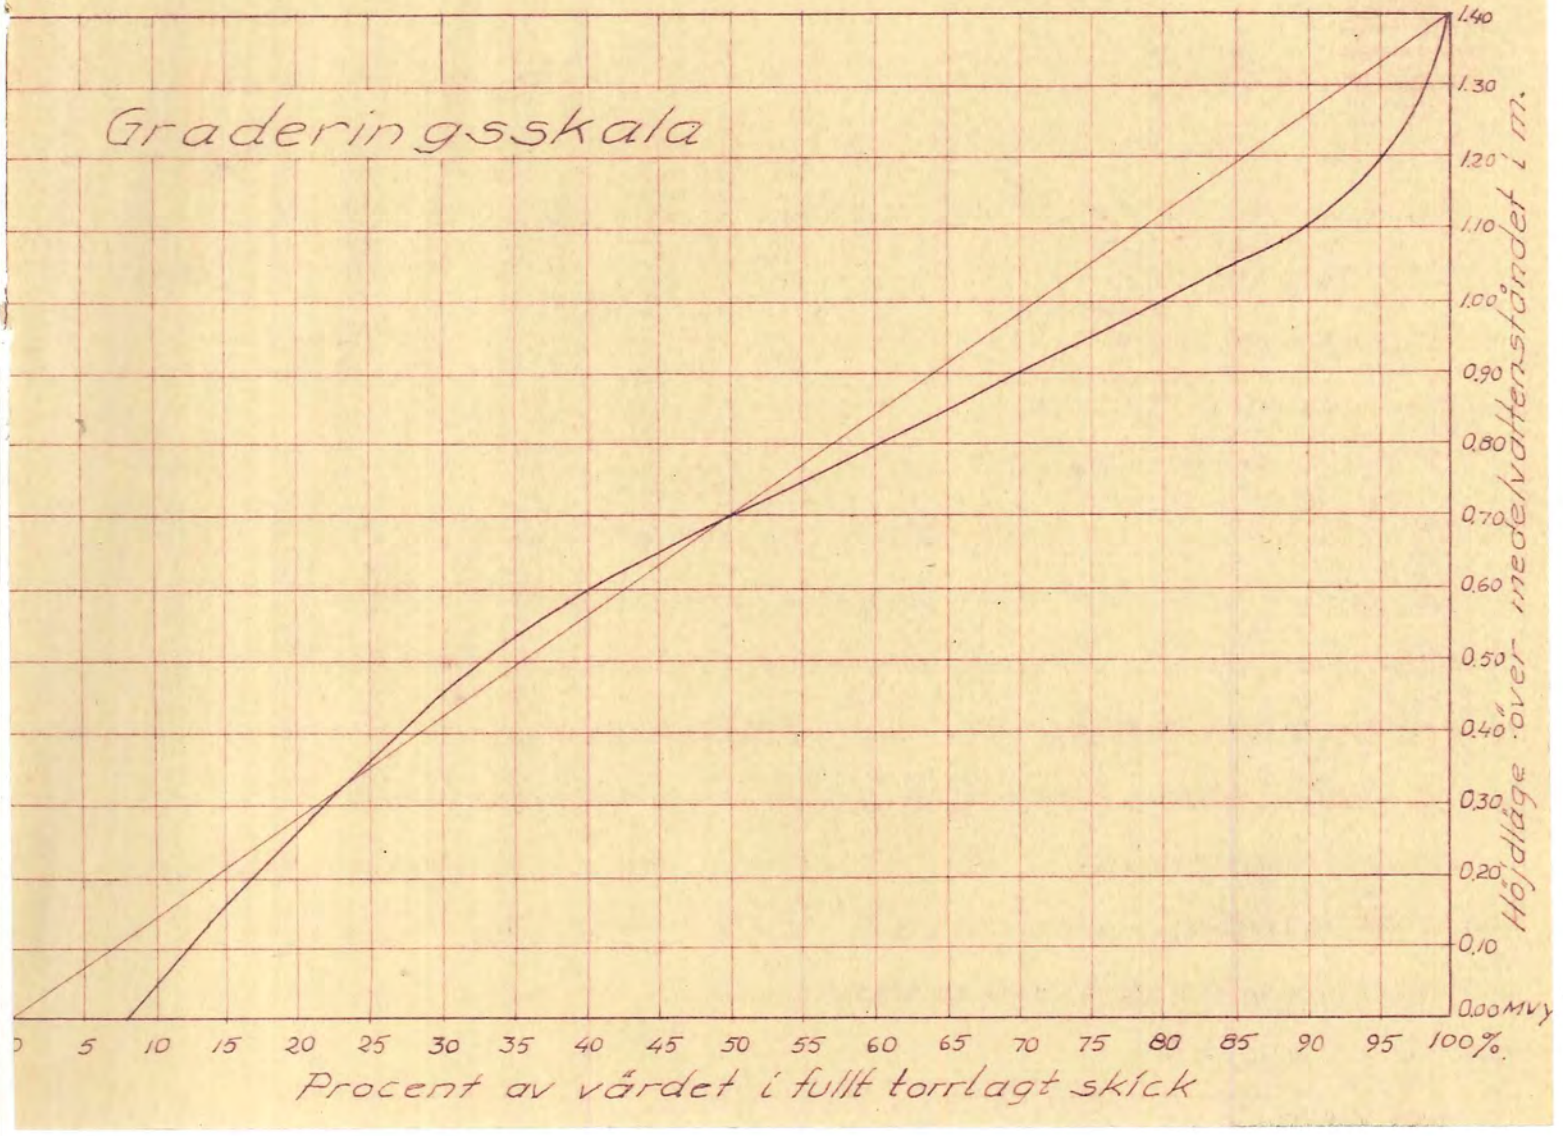
Graderingsskala
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00 MVy
Höjdläge över medelvattenståndet i m.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100%
Procent av värdet i fullt torrlagt skick

För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp har för de berörda fastigheterna brukningsbåtnad beräknats efter i värderingslängden närmare angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 42.150:- kronor, varav alstringsbåtnad 28.230:- kronor och brukningsbåtnad 13.920:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 32.300:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Den i företaget ingående marken har enligt bestämmelserna i vattenlagen betraktats såsom en torrläggningssamfällighet.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har emellertid för fördelning av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll företaget uppdelats i fem avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-4, 7-16 och 26-31 och utförande av avloppen A-B-C och C-N-O med torrläggningskostnad 10.300:- kronor, båtnaden 14.347:50 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,72,

avdelning II, omfattande ägofigurerna 32-35 och 45-47 och utförande av avloppet O-P med torrläggningskostnad 1.550:- kronor, båtnaden 1.659:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,93,

avdelning III, omfattande ägofigurerna 5-6, 16a och 17-21 och utförande av avloppen C-D-E och D-D^1 med torrläggningskostnad 4.700:- kronor, båtnaden 5.097:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,92,

avdelning IV, omfattande ägofigurerna 22-25, 36-44, 48-66 och 69-80 och utförande av avloppet E-F-G-H-I-K-L med torrläggningskostnad 14.900:- kronor, båtnaden 19.565:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,76,

avdelning V, omfattande ägofigurerna 67-68 och 81-83 och utförande av avloppet L-M med torrläggningskostnad 850:- kronor, båtnaden 1.481:50 kronor och relativa kostnaden 0,57.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet beräknade båtnaden enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl kostnaderna för företagets utförande som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet och införts i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1966.

Vid företagets utförande skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl på sidorna om rören, så att dessa icke kunna

rubbas, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke placeras över rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar eller i särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar få icke förekomma inom ett avstånd av sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. + 6,99 m., ring i sten, 95 m. sydväst om punkt 41+28.

Fixp. 2. +10,00 m., kors i berg, 105 m. söder om punkt 21+36.

Fixp. 3. +12,17 m., ring i berg, 60 m. väster om punkt 8+52.

Fixp. 4. +15,03 m., koppardubb i kors i berg, 95 m. väster om punkt 13+33 (officiell fixpunkt).

Fixp. 5. +17,41 m., ring i sten, 32 m. väster om punkt 18+40.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande ytvattenbrunnar skola rensas minst två gånger om året. Kostnaderna för underhållet skall fördelas på delägarna inom varje avdelning enligt i kostnadsfördelningslängden, kolumn 4, angivna repartitionstal.

Underhållet av i företaget ingående delar av rörledningarna, som ersätta förutvarande vägbroar, skall åvila vederbörande jordägare eller dem som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 63 kronor och 23 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företagets namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Nybble-Kilfröslunda dikningsföretag år 1957 i Överselö socken, Södermanlands län.

Nybble pr Stallarholmen den 20 november 1957.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

S P E C I F I K A T I O N

till räkning nr 74578

å ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan (SFS nr 482:1952)

Laga syneförrättning rörande Nybble-Kilfröslunda dikningsföretag år 1957 i Överselö socken, Södermanlands län.

			kr	öre	kr	öre
Sakersättning: för syneförrättning med biträde av godemän.						
Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtnad uppskattats, 26	ha		150	--		
Tilläggsavgift, för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats, planmätt, 25 ha å 16:-	kr		400	--		
för areal varå enbart brukningsbåtnad uppskattats, 1 ha å 8:-	"		8	--		
Av beräknad kostnad för företagets utförande, 32.300:-	"					
påföres för kostnad t.o.m. 100.000 kr	1 %		323	--	881	--
Tidersättning: Tariff A. Alternativa förslag, avloppen A-B och H-K, 11, 14/11 1956.						
5 timmar å 5:- kr för befattningshavare tillhörande grupp II					25	--
		Summa kronor			906	--

Övriga förrättningskostnader.

Inbindning av handlingarna, 2 ex.	4:—
Ersättning till godemännen	183:96
Hantlangning o.d.	311:50
Kostnad för vattenanalys	28:—
Summa kronor	527:46

S A M M A N D R A G.

Arvode till statsverket	906:—
Övriga förrättningskostnader	527:46
Summa kronor	1.433:46

Nybble pr Stallarholmen den 20 november 1957.

Statens lantbruksingenjör.
