103

217/33

D 1*0221

25085

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1933 för "torrläggningsföretaget Ånsta" i Lids socken av SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenetthundra (2.100) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusensjuhundrasjuttio (1.770) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad ende intressent i ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för~~ företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10933

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ärsta pr. Kappsta den 20. augusti 1933.

Carl Fr:m Wachtmeister

Att överstan greve Carl Fr:sm Wachtmeister

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Agnes Cronsborg — Betty Cronsborg

Adress Sibylleg. 18, Stockholm — Adress Adilsvägen 8 Djursholm 2

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juli 1933 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 15 september 1933.

Erik Lindahl

[illegible]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1*0221

25085

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1933

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Ånsta

i Lids socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

Å N S T A

i Lids socken av Södermanlands län,

upprättat år 1931 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juli 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Avskriften bestyrkes å fjänstens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande, rörande torrläggnings-
företaget Ånsta i Lids socken av Söder-
manlands län, upprättat i och för er-
hållande av statsunderstöd år 1931.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1931 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ånsta i Lids socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 24 oktober 1931. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. C.) och ritning (Bil. D.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 3 kilometer sydväst om Lids kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktsiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 13,53 har, varav 0,34 har åker, 12,03 har äng och kärräng samt 1,16 har betesmark och mosse. Jordmånen är i allmänhet av god beskaffenhet och består till största delen av dyjord eller dy på lerbotten.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C, B-D-E och D-D[1].

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnad.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en trumma för utfartsväg vid punkt 1+31 ombyggas av sten i enlighet med härför upprättad ritning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 1.277:99 kronor före torrläggningen, 6.158:85 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 4.880:86 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande och

brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 3.900:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 310:22 kronor samt för detta betänkande med bilagor 66:02 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4.276:24 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. A.).

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna tillhöra 4 1/8 mtl. Ånsta 2:1, och skola alla med företaget förenade kostnader utan särskild jämkning bestridas av ägaren till dessa marker.

Bidrags- och lånebelopp.

Som kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0.88, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 45,80 procent av den för företaget beräknade kostnaden 4.276:24 kronor eller med i avrundat tal 1950:-kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 2.320:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till före-

taget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av tre år.

Bilagor.

Bil. A. Kostnadsförslag.

Bil. B. Arvodesräkning.

Bil, C. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. D. Ritningskopia.

Nyköping i november 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgravarna A-B-C, B-D-E och D-D[1] enligt i syne-

handlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag ..... 3.500:- ~~3.900:-~~ *)

Kostnad för laga syneförrättningen 310:22

" " detta betänkande med bilagor 66:02

Summa kronor 3.876:24 ~~4.276:24~~

Nyköping i november 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbetspriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.876 kr. 24 öre

Stockholm den 3 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bestyrkes på fjänstens vägnar:

Martin Lingström

Bil. B.

A R V O D E S R Ä K N I N G.

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	12:-
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	15:40
Översiktskarta till avskriften, §41	4:-
Kopia å väv av planritningen, § 51	18:82
" " " " profil- och sektionsritningarna, § 54	10:80
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:-
Inbindning av handlingarna	1:-
Summa kronor	66:02

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 20 november 1931.

Martin Lingström.
Statens lantbruksingeniör.

Bil. C.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

Å N S T A

i Lids socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 4 1/8 mtl. Ånsta 2 1 i Lids socken av Södermanlands län.

Den 9 oktober 1931.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande förordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 f.m. å Ånsta gård.

Till sammanträdet hade tillstädeskommit skiftesgodemännen, lantbrukarna

Karl Andersson, Juresta, och

Gustaf Andersson, St. Välvesta, samt sakägaren

översten, Greve Carl Fr:son Wachtmeister, ägare av 4 1/8 mtl. Ånsta 2 1.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga un-

dersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna blivit verkställda genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde erfordras, för att markerna skulle kunna omvandlas till betesvallar, och att i samband därmed trumman för utfartsvägen vid punkten 1+31 måtte i erforderlig mån ombyggas.

Sökanden förklarade därjämte, att vid utloppet från markerna tidigare funnits ett vattenverk, vilket numera vore helt bortrivet, och att det kvarvarande fallet såsom obebyggt vore fullständigt värdelöst.

§ 5.

Sedan värdering verkställts av de i företaget ingående markerna, meddelade förrättningsmannen, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å lantbruksingeniörens kontor i Nyköping lördagen den 24 oktober 1931, kl. 10,30 f.m.

§ 6.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ånsta pr. Kappsta den 9 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Karl Andersson Gustaf Andersson
Biträdande godemän.

Den 24 oktober 1931.

Förestående dag kl. 10,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän jämte sakägaren, greve Carl Fr:son Wachtmeister å lantbruksingeniörens kontor i Nyköping för att fortsätta denna syneförrättning.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna samt för de beräknade kostnaderna och jordvärderingen m,m.

§ 8.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 4 dagar, för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Nyköping den 24 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Karl Andersson Gustaf Andersson

Biträdande godemän.

Nr. 21. D.R. 1931.

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande Statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker å undertecknad tillhöriga, $4^{1}/_{8}$ mtl. Ånsta 2^{1} i Lids socken, Söder manlands län.

Annan sakägare beröres icke av företaget.

Ånsta pr. Kappsta den $^{31}/_{7}$ 1931.

Carl Fr:son Wachtmeister.,

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 21 D. R. 1931.

Med anledning av en från översten, greve Carl Fr:son Wachtmeister, Ånsta, Kappsta, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande $4\ ^{1}/_{8}$ mantal Ånsta 2^{1} i Lids socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 1 augusti 1931.

G. Sederholm

S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	~~4 1/8~~ 3 7/8 mtl Ånsta 2' (+ 1/4 mtl 2²)								
	Greve Carl Fr:son Wachtmeister								
1	Äng, lermylla på lera, buskbev.				03.0				
2	do, " " "				10.0				
3	Avloppsgrav								
4	Äng, dyjord			1	93.0				
5	Åker, lermylla på lera		25.0						
6	Äng, " " ", buskbeväxt				10.0				
7	Betesmark, " " " "						16.0		
8	do " " " "						17.0		
9	Äng, " " " "				43.0				
9a	Backe								
10	Äng, dymylla på lera				39.0				
11	do, dy " "			1	14.0				
12	do, " " "				20.0				
13	Betesmark, " " " skogbeväxt						25.0		
14	Äng, " " " buskbeväxt				35.0				
15	do " " "				63.0				
16	Backe								
17	Äng, dymylla på lera, buskbeväxt				08.0				
18	do, " " "				68.0				
19	Betesmark, " " ", skogbeväxt						12.0		
20	Äng, lermylla på lera, buskbeväxt				34.0				
21	do, dyjord				73.0				
22	Göl								
23	Backe								
24	Äng, dyjord				64.0				
	Transport		25.0	7	77.0		70.0		

längd för torrläggningsföretaget Ånsta

i Lids socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget erhållen torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				300	80	240	60	1.0	9	-	7	20	1	80			
				600	70	420	180	1.0	60	-	42	-	18	-			
	36.0																
				500	15	75	425	1.0	965	-	144	75	820	25			
				1000	90	900	100	1.0	250	-	225	-	25	-			
				500	50	250	250	1.0	50	-	25	-	25	-			
				300	50	150	150	1.0	48	-	24	-	24	-			
				300	50	150	150	1.0	51	-	25	50	25	50			
				600	25	150	450	1.0	258	-	64	50	193	50			
	04.0																
				550	15	82.5	467.5	1.0	214	50	32	17	182	33			
				500	15	75	425	1.0	570	-	85	50	484	50			
				500	15	75	425	1.0	100	-	15	-	85	-			
				300	50	150	150	1.0	75	-	37	50	37	50			
				400	15	60	340	1.0	140	-	21	-	119	-			
				500	15	75	425	1.0	315	-	47	25	267	75			
	02.0																
				400	15	60	340	1.0	32	-	4	80	27	20			
				550	15	82.5	467.5	1.0	374	-	56	10	317	90			
				300	50	150	150	1.0	36	-	18	-	18	-			
				450	20	90	360	1.0	153	-	30	60	122	40			
				400	10	40	320	0.90	262	80	29	20	233	60			
	01.0																
	95.0																
				450	15	67.5	382.5	1.0	288	-	43	20	244	80			
1	38.0								4.251	30	978	27	3.273	03			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		25.0	7	77.0		70.0		
25	Kärräng, dyjord				35.0				
26	Mosse, dy och mossjord, buskbevuxet						45.0		
27	Kärräng, dyjord				10.0				
28	Avloppsgrav								
29	Kärräng, dyjord				20.0				
30	Äng, dy på lera				03.0				
31	do, dymylla på lera				33.0				
32	Kärräng, dyjord				39.0				
33	do, do				04.0				
34	Avloppsgrav								
35	Ägovägg								
36	Äng, dymylla på lera				26.0				
37	do, lermylla " "				05.0				
38	Betesmark, " " " bogbev.						01.0		
39	Äng, " " "				14.0				
40	Åker, " " "		09.0						
41	Äng, " " "				03.0				
42	do, dy på lera				47.0				
43	do, " " " , buskbevuxet				39.0				
44	Kärräng, dyjord				55.0				
45	Göl								
46	do								
47	Äng, dyjord				53.0				
48	do, dymylla på lera.				40.0				
	Summa		34.0	12	03.0	1	16.0	13	53.0

Nyköping

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1	38.0								4.251	30	978	27	3.273	03			
				400	0	0	240	0.60	84	-	-	-	84	-			
				300	15	45	195	0.80	108	-	20	25	87	75			
				400	5	20	280	0.75	30	-	2	-	28	-			
	05.0																
				400	0	0	200	0.50	40	-	-	-	40	-			
				500	15	75	425	1.0	15	-	2	25	12	75			
				600	15	90	510	1.0	198	-	29	70	168	30			
				400	0	0	200	0.50	78	-	-	-	78	-			
				400	0	0	160	0.40	6	40	-	-	6	40			
	08.0																
	05.0																
				550	15	82.5	467.5	1.0	143	-	21	45	121	55			
				600	20	120	480	1.0	30	-	6	-	24	-			
				300	80	240	60	1.0	3	-	2	40	-	60			
				600	20	120	480	1.0	84	-	16	80	67	20			
				800	75	600	200	1.0	72	-	54	-	18	-			
				600	50	300	300	1.0	18	-	9	-	9	-			
				550	15	82.5	467.5	1.0	258	50	38	77	219	73			
				500	15	75	425	1.0	195	-	29	25	165	75			
				400	0	0	200	0.50	110	-	-	-	110	-			
	34.0																
	21.0																
				450	10	45	360	0.9	214	65	23	85	190	80			
				550	20	110	440	1.0	220	-	44	-	176	-			
2	11.0	15	64.0						6.158	85	1.277	99	4.880	86			

den 24 oktober 1931

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Karl Andersson Gustaf Andersson

Biträdande godemän

Kostnadsförslag

för torrläggningsföretaget Östa i Lids socken av Södermanlands län; upprättat vid laga syneförrättning år 1931.

(Timpenning 0.70 kronor).

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C.						
A								
0-2	200	Schaktning av grus och sten med						
		enstaka sprängstenar	280	3.50	980	-		
		do av lera med mgt rötter	30	1.-	30	-		
		Bergsprängning	4	15.-	60	-	1070	-
		Ombyggnad av trumma för utfartsväg vid 1^{+31} enl. spec. kostnadsförslag.					450	-
B.								
$2-3^{+25}$	125	Schaktning av sten och grus	15	3.50	52	50		
		do " lera	160	0.85	136	-		
		do " dyjord	200	0.60	120	-	308	50
$3^{+25}-6$	275	do " do	720	0.60	432	-		
		do " lera	20	0.80	16	-	448	-
6-9	300	do " do	200	0.80	160	-		
		do " dyjord	560	0.60	336	-		
		do " grus och sten	5	3.-	15	-	511	-
C.								
$9-10^{+50}$	150	do " do	15	3.-	45	-		
		do " dyjord	120	0.60	72	-		
		do " lera	130	0.80	104	-	221	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 pro-						
	1050	Transport					3008	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1050	Transport					3008	50
		cent av föreståend belopp					311	50
S:ma	1050	Summa kronor					3320	–
		Avloppet B-D-E.						
B D								
20-20+90	90	Schaktning av dyjord	150	0.60	90	–		
E								
20+90-23+1	211	d:o " d:o	110	0.60	66	–		
		d:o " lera	70	0.80	56	–	212	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av förestående belopp.					28	–
S:ma	301	Summa kronor					240	–
		Avloppet D-D'.						
D D'								
15-17+25	225	Schaktning av dyjord	270	0.60	162	–		
		d:o " lera	175	0.80	140	–	302	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av förestående belopp.					38	–
S:ma	225	Summa kronor					340	–
		Sammandrag.						
	1050	Avloppet A-B-C.					3320	–
	301	–"– B-D-E.					240	–
	225	–"– D-D'.					340	–
S:ma	1576	Summa kronor					3900	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Specificerat kostnadsförslag						
		för trummans för utfartsväg vid 1+31						
		Schaktning och grundgrävning						
		utöver avloppets sektion	20	4.-	80	-		
		Grundmurar	3.2	10.-	32	-		
		Front- och gavelmurar	12	15.-	180	-		
		Täckhällar	2.9	30.-	87	-		
		Rivning av gamla trummans,						
		planering av vägbanan m.m.			71	-		
		Summa kronor			450	-		

Nyköping den 24 oktober 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

19a
ÖVERSIKTSKARTA.
Skala 1:100 000.
Torp Fjärden
Husbygård
Husby-Oppunda
Råby-Rönö
Wrena
Bärbo
Glottran
Kristineholm

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ånsta i Lids socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 kilometer sydväst om Lids kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 13,53 har, varav 0,34 har åker, 12,03 har äng och kärräng samt 1,16 har betesmark och mosse. Jordmånen är i allmänhet av god beskaffenhet och består till största delen av dyjord eller dy på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsdikena A-B-C, B-D-E och D-D^1.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 3 km^2. Avrinningen vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr. km^2. eller till 0,24 m^3/sek. från området i dess helhet.

Avloppsdikena hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter och med en sidolutning av 1:1,25. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmäng-d-

erna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,62 meter. Vid medelvattenföring i avloppen, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmägden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,21 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnad.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en trumma för utfartsväg vid punkt 1+31 ombyggas av sten i enlighet med härför upprättad ritning.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen.

Torrläggningsföretaget Ånsta

i Lids socken av Södermanlands län.

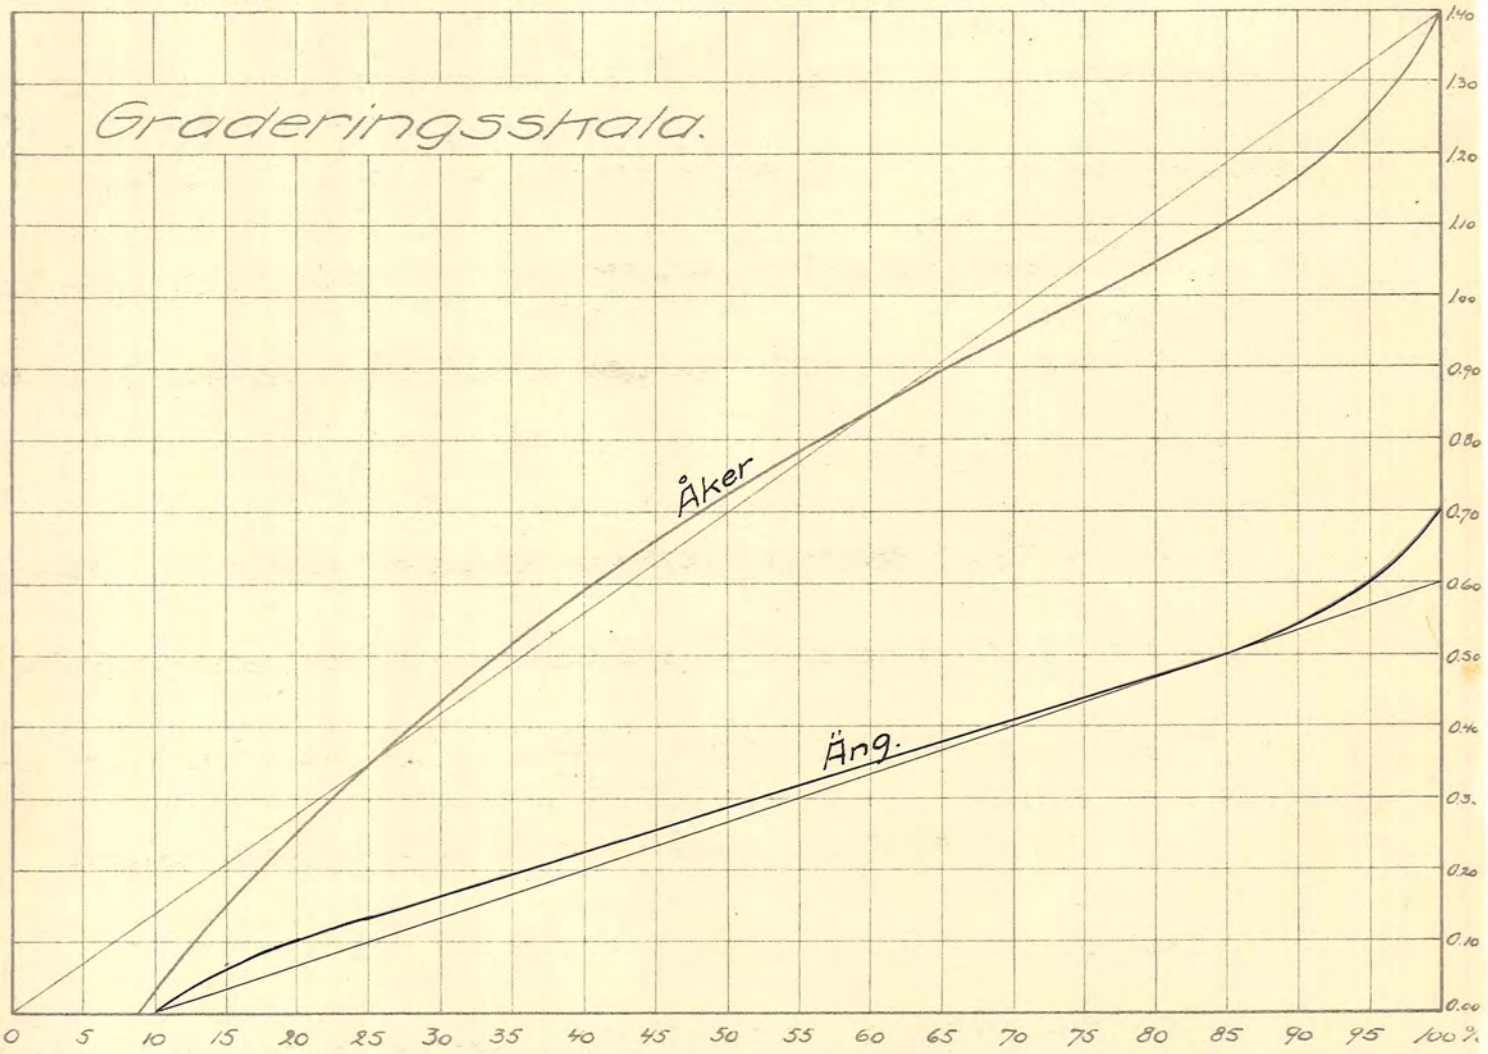

Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. För ängs- och betesmarken har emellertid nuvarande värdet även uppskattats direkt vid värderingen å marken, varvid dock graderingsskalan vid bedömandet av markens värde tjänat till hjälp och ledning. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 1.277:99 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 6.158:85 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 4.880:86 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnad till 3.900:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola bestridas av ägaren till 4 1/8 mtl. Ånsta 2 1.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Som jordmånen å de lägst belägna delarna av torrläggningsområdet är av mycket lös beskaffenhet och marken till stor del fullständigt genomdränkt av vatten, synes det icke vara möjligt att utan risk för ras

på en gång upptaga avloppsdikena därstädes till fullständigt djup. För att låta marken i möjligaste mån stabilisera sig, skola därför avloppen i de lösa jordlagren upptagas i minst två omgångar, och strängarna om möjligt efter hand utplaneras.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppsdikena, där någons rätt kan vara därav beroende, för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. öm.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar,

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken socken av Södermanlands län".

Nyköping den 24 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Karl Andersson Gustaf Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggningsföretaget Ånsta i

Lids *socken och* Södermanlands *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ~~31 december 1920.~~ 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50	1	–	1	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	0.4	3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.3	6,00	13	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 17 ar st.	2	0.17		34		
		har	0.34	1.06		36		
		äng och odlingsmark, medelareal 39 ar st.	31	0.18	5	58		
		har	12.03	0.58	6	98		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar st.	16	0.05		80		
		har	3.27	0.78	2	55	31	61
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10\text{—}15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	–	4	–
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					36	61

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					36	61
1930	7/10	**Avvägning:**						
1931	29,31/7	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	10.65	0.50	5	33		
		avvägda punkter ... st.	90	0.03	2	70		
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	2.88	1.00	2	88		
		avvägda punkter ... st.	19	0.06	1	14		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.2	2,~~00~~	2	40		
		i annan mark ... „	1.5	5,00	7	50	49	95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar, ... st.	49	0.05	2	45		
		... har	15.64	0.10	1	56	4	01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	49	0,04	1	96	1	96
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal st.	78	0,06	4	68		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	39	0,12	4	68	13	36
		Längdprofil, § 19, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	1.32	3,00	3	96		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	0.25	3,50		87		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	—	7	83
		Tvärsektioner, §§ 21/22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	6	0,15		90		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	10	0,25	2	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					3	40
		Hydrografisk utredning, § 23, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	3	0,02		06		
		...					2	06
		Dimensionsberäkning, § 24,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.5	3,50	5	25		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.5	1,00	1	50	6	75
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Överföres					121	93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				121 93
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	39	0,03	1 17	2 17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		— —
		Kostnadsberäkning *§ 28, a) nyanläggning* *km.*	1.3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	0.25	4,00	1 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 90	8 15
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 33 och 35*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet *kl.*	1	3.—	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning *„*	1	3.—	3 —	6 —
		c) för grundförstärkning *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd *m.*		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* *„*	125	0,01	1 25	1 25
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp *st.*		0,25		— —
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	6	3,00	18 —	18 —
1931	9/10 24/10	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
1931	21/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* Alternativ beräkning *dagar*	½	12,00	6 —	6 —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 43, ~~mom. 14~~* *„*		~~12,00~~	— —	— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 46, mom. 15* *dagar*		12,00		
		Översiktskarta *§ 41*				4 —
		Summa kronor				185 50
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51,*				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 32 *ar ägofigurer* *st.*	49	0.07	3 43	
		har	15.64	0.14	2 19	5 62
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 40
		Överföres				14 02

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					14	02
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	125	0,02	2	50		
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp* ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	39	0,05	1	95	6	20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	1.3	5,00	6	50		
		ändring av befintligt avlopp ... „	0.25	6,00	1	50		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			3	40		
		3) broar och trummor, „ „ ~~„ 30 % „~~			3	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „		3,00			14	40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... sid.	22	0,55			12	10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...					4	-
		Summa kronor					50	72
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...					6	-
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarne ... 2 ex.					2	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar* ...					42	-
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ... 6 dr.					24	-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...						
		Summa kronor					74	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					185	50
		Lösen för kopior och avskrift ...					50	72
		Övriga förrättningskostnader ...					74	-
		Summa kronor					310	22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönåkers, Röno och Flolebo *häradsrätt.*

Nyköping *den* 24 oktober *19*31

Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Andersson Gustaf Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

16/11-31

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Förestående avskrift, sid. 1 - 30, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Emgström

Avskrift.

Dr 24331/31

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av godemän handlagd, den 24 oktober 1931 avslutad ~~lags~~ syneförrättning, avseende "torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1932.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

217/33

25086

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1933

I N T Y G .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken av Södermanlands län.

Ånsta pr Kappsta den 6/9 1933.

L. Salomonsson ..... K. Asc. Andersson

adr. Ånsta Kappsta adr. Ånsta Kappsta

1933 den 15 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Ånsta" i Lids socken av Södermanlands län.

Lån 2.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juli 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående omförmälda upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Lids socken.			
Ånsta	3 7/8	2[1]	Greve Carl Fr:son Wachtmeister

Stockholm den 15 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

217/33

DIARIE Nr 29525
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 oktober 1933.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 juli 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.770:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.100:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 september 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende intressent: Greve Carl Fr:son Wachtmeister, Ånsta, Kappsta.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 11 november 1933. Därvid hade avloppen A-B-C, B-D-E och D-D^1 upptagits, dock återstod att på djupet upptaga 0,30 - 0,60 m. Bron vid 1+31 var ej ombyggd.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget har det utförda arbetet beräknats motsvara 2.180:-

Härtill komma: Förrättningskostnader 376:24

Summa kronor 2.556:24

utgörande omkring 66 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 3.876:24 kronor.

Nyköping den 18 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
29525/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggn.företaget Ånsta" i Lids sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 28/7 33

Kontrakt: 15/9 33

Fullbordas: 1/9 36

Statsbidrag: 1.770

Lån: 2.100

Beräkn. kostnad: 3.876:24

Tillstyrkt utbet. d. 15/9 33 av statsbidrag: 600 kr.
700

av lån: kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 11 /11 1933

kr. = c:a 66 %

0.66 · 1770 = 1170
600
570

0.66 · 2100 = 1400
700
700

~~Ordf. i arb. styrelsen~~ Ende intressent } Översten Greve Carl F:son Wachtmeister,
Ånsta, Kappsta

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 570 kr.

av lån 700 kr.

Stockholm den 1 /12 1933

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

Godkänt den 11 september 1935

Avskrift.

Dnr 18078

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1935

217/33

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 februari 1935.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Ånsta i Lids socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 28 juli 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.770:- kronor.

(Stämpel) 1:-kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2.100:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 september 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende intressent: Greve Carl Fr:son Wachtmeister, Ånsta, Kappsta.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 20 augusti 1935.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 21 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.
