SÖDERBYGDENS
28 DEC. 1933
VATTENDOMSTOL

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Fö 194.

D 3*0728

42 III: 18: 6. 7/6 26

Torrläggningsföretaget
Drögstad-Vallersta
i Nykyrka och Stigtomta socknar av
Södermanlands län.

No. 65.

Mf. i Avd III
textblad XVI 220

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Drögstad - Vallersta
i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
åren 1929-1932 av
Martin Lingström.
Statens lantbruksingenjör.

Kärtice två konceptritningar och en vitkopia.

Protokoll, fört vid sammanträdet under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögstad i Nykyrka socken samt Vallersta i Stigtomta socken av Södermanlands län.

Den 28 augusti 1929.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingarnas kyrka uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C' o C²) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Gustaf Jonsson, Drögstad, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Emil Johansson Kjulsta och

F. Ant. Jansson, Ytterstäng.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit

Gustaf Jonsson, ägare av 1 mtl Drögstad 1'

Karl Andersson, " " 1 mtl Vallersta 1'

Baningeniören Klas O. Valley, såsom ombud för Oxelösund-Flen-Westmanlands Jernvägsaktiebolag, enligt fullmakt (Bil E' o E²).

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

De vattenskadade marker, vilkas torrläggning avsåges genom föreliggande ansökning, voro belägna omedelbart nordost om Axelösund - Flen - Ulestmanlands järnväg, och avvattnades genom ett dike utefter järnvägen ut till Hallborjön vid en trumma, belägen c:a 1.0 km. från markerna. Sökandena till förrättningen yrkade nu, att erforderligt avlopp måtte upptagas från Hallborjön i gränsen mellan Drögstad och Vallersta, och att i samband därmed en trumma måtte anordnas genom järnvägsbanken.

§ 5.

Upplystes, att de marker, vilkas torrläggning det nu vore fråga om, voro att hänföra till åker vid tiden för järnvägens tillkomst.

§ 6.

Intressenterna förklarade, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avlappets breddning eller uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, varefter nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle delgivas vederbörande sak-

ägare.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Drögstad pr Stigtomta den 28 aug. 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

Förestående protokoll är för sakägarna upplärt, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan.

Anton Jansson Emil Johansson

Biträdande godemän

den 17 november 1932.

Förestående dag kl. 10 f.m. inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukaren Gustaf Jonsson, Drögstad, för att fortsätta denna synefärrättning. Till sammanträdet varom underrättelser utsänts enligt bifogade förteckning (Bil. F.) hade följande sakägare infunnit sig.

Gustaf Jonsson, ägare av 1 mtl. Drögstad 1'

Karl Andersson, " " 1 " Vallersta 1'

Bandirektören Lars Granfeldt, såsom ombud för Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg enligt fullmakt (Bil G¹ ÷ G²)

Banmästaren L. E. Widén.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen till Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen översänt planen för företaget med förslag till avlopp genom järnvägen, hade från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör inkommit skrivelse om godkännande av förslaget, som upplästes och bifogades detta protokoll. (Bil. H¹ ÷ H²)

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna, jordvärde-

ringen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 10.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras hos lantbrukaren Gustaf Jonsson, adress Drögstad pr. Stigtomta, och finnas därstädes tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 11

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbyggdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 12

Förrättningsmannen meddelade, att han under synefördrättningen tillgodoräknat sig arbode efter dagberäkning för sammanlagt 3 5/6 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 13

Dagens protokoll upplästes, varefter synefördrättningen förklarades avslutad.

Drögstad pr Stigtomta den 17 november 1932

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Stalens lantbruksingenjör

Mat. Jansson Örnulf Johansson

Biträdande godemän.

N:r 7 D. R. 1926.

Bil. A.

Ankom den
-7 JUN. 1926
till
Landskansliet
i Nyköping.

Till Konungens Befallningshavande
i Södermanlands län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens kulturingenjör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torläggning av vattensjuka marker tillhörande i mtl Drögsta nr 1 i Styckyrka socken och i mtl Wallersta nr 1 i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Stigtomta den 4 juni 1926.

Gustaf Jonsson, ägare af 1 mtl Drögsta.
Carl Johansson, ägare af 1 mtl Wallersta.

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN.

Bil. B.

RESOLUTION.

N:o 7 D.R.1926.

I anledning af en från Gustaf Jonsson och Carl Johansson, Stigtomta, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att enligt Vattenlagen hålla syneförrättning i och för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande 1 mantal Drögsta N:o 1 Nykyrka socken och 1 mantal Wallersta N:o 1 i Stigtomta socken, förordnas Landtbruksingeniören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar af detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ofvannämnde landtbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 7 juni 1926.

Utan afgift.

14/6 1926.

Landtbruksingeniören M. Lingström.

Bil. C'

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögsta i Nykyrka socken och Vallersta i Stigtomta socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Gustaf Jonsson, Drögsta, onsdagen den 28 augusti 1929, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget kommer även att beröra Oxelösund - Flen - Westmanlands järnväg.

Nyköping den 6 augusti 1929.

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Stigtomta och Nykyrka församlingars kyrka söndagen den 11/8 1929, intygas av

.....

p. l.

Bil. C 2 9.

Södermanlands Läns Tidning

Spridningsområde: Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Malmköping, Flen, Gnesta, Trosa, Oxelösund samt hela Södermanlands och Stockholms läns södra landsbygd, där den läses av alla samhällsklasser och i synnerhet av den köpkraftiga publiken.

Daglig aftontidning. Grundad 1862. *Telefoner: 26, 69, 468 och 1058.*

Nyköping den 30/9. 1929 *N:o* 2180.

Torde åberopas vid likvids insändande.

Herr Ingenjör Martin Lingström, Nyköping **DEBET**

		Att betalas kontant	Mm.	Gång.		Netto Kr.
3/8.	4382	Syneförrättning vid Drögsta 28/8	90.	6		
				Kronor		14.40.

Kritteras
Nyköping den 4/4 1930
Länstidningens Expedition
Ell

Bil. D.

Förteckning

över underrättelser om sammanträde den 28 augusti 1929 för laga syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögsta i Nykyrka socken och Vallersta i Stigtomta socken, av Södermanlands län, till nedanstående sakägare, avsända den 12 augusti 1929.

namn	adress.
Gustaf Jonsson	Drögsta, Stigtomta
Karl Andersson	Vallersta, — " —
Oxelösund-Flen-Westmanlands	
järnvägs A.B.	Eskilstuna

Nyköping den 12 augusti 1929.
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

TRAFIKAKTIEBOLAGETS
GRÄNGESBERG—OXELÖSUND
JÄRNVÄGAR.
OXELÖSUND-FLEN-VÄSTMANLANDS,
ÖREBRO-KÖPINGS & FRÖVI-LUDVIKA.

Bil. E'

JJ/NB

F u l l m a k t för Baningeniör Klas O.Valley att vid sammanträde för torrläggning av mark, tillhörande Drögsta och Vallersta i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län, onsdagen den 28 augusti 1929 järnvägsbolagets talan föra och dess rätt bevaka; hållande vi för gillt allt vad ombudet på grund av denna fullmakt lagligen gör och låter.

Eskilstuna den 13 augusti 1929.

för OXELÖSUND- FLEN-
WESTMANLANDS JÄRNVÄGS-AKTIEBOLAG

John Johnson.

Trafikchefen John Johnsons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gösta Peterson. R Betts.

Avskrift av avskrift.

Bil. 6 2

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent-och Registreringsverket den 23 maj 1898 beviljat registrering för Oxelösund- Flen- Westmanlands jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, vice häradshövdingen Walter Philipson och f.d. justitierådet Johannes Hellner, alla i Stockholm, kommerserådet Knut Abel Gunnar Dillner och bankdirektören Johan Oscar Ehrenfrid Rydbeck, båda i Djursholm, bankdirektören Herman Mannheimer i Göteborg samt direktören Martin Emanuel Waldenström i Mölnbo, Vårdinge socken av Stockholms län, med vice häradshövdingarna Carl Emil Kinander och James Thomson Millar, båda i Stockholm, till suppleanter, och att firman tecknas av Frisell, Philipson, Hellner, Dillner, Rydbeck, Mannheimer och Waldenström var för sig ävensom av trafikchefen John Johnson i Eskilstuna, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 29 juni 1929.

Ex. officio:

Gustaf Helmertz.

/ Stämpel. /

Rätt avskrivet intyga:

A. Roth. E. Jakobson.

Vidimeras:

B. Förare H. Ryott Johnson

Bil. F.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 17 november 1932 för laga syneförrättning, avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögsta i Nykyrka socken och Vallersta i Stigtomta socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och godemän avsända den 9 november 1932.

Namn	Adress
Gustaf Jonsson	Drögsta, Stigtomta.
Karl Andersson	Vallersta, "
Oxelösund-Flen-Westmanlands järnvägs Aktiebolag	Eskilstuna.
Skiftesgodemannen Antonius Jansson	Ytterstäng, Stigtomta.
" Emil Johansson	Kjulsta, "

Nyköping den 9 november 1932.

Martin Lindström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5

TRAFIKAKTIEBOLAGET
GRÄNGESBERG—OXELÖSUNDS
JÄRNVÄGAR.

OXELÖSUND-FLEN-VÄSTMANLANDS,
ÖREBRO-KÖPINGS & FRÖVI-LUDVIKA.

TELEGRAMADRESS: } OXELÖSUNDSBANAN
RIKSTELEFON: }
CODE: WESTERN UNION FIVE LETTER ED.

F u l l m a k t för Bandirektören Lars Granfeldt eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögsta i Nykyrka socken och Vallersta i Stigtomta socken av Södermanlands län den 17 innevarande november järnvägsbolagets talan föra och dess rätt bevaka; godkännande vi vad ombudet på grund av denna fullmakt lagligen gör och låter.

Eskilstuna den 11 november 1932.

för OXELÖSUND-FLEN-
WESTMANLANDS JÄRNVÄGS-AKTIEBOLAG

Trafikchefen John Johnson egenhändiga namnteckning bevittna:

Avskrift av avskrift.

Bil. 5²

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
S t o c k h o l m.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 23 maj 1898 beviljat registrering för Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, enligt en den 8 juli 1931 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, vice häradshövdingen Walter Philipson och f.d. justitierådet Johannes Hellner, alla i Stockholm, kommerserådet Knut Abel Gunnar Dillner och bankdirektören Johan Oscar Ehrenfried Rydbeck, båda i Djursholm, bankdirektören Herman Mannheimer i Göteborg samt direktören Martin Emanuel Waldenström i Mölnbo, Vårdinge socken av Stockholms län, med vice häradshövdingen James Thomson Millar och direktören Carl Fränckel, båda i Stockholm, till suppleanter, att firman tecknas av envar av Frisell, Philipson, Hellner, Dillner, Rydbeck, Mannheimer och Waldenström ävensom av trafikchefen John Johnson i Eskilstuna samt direktörerna Gustaf Wallin i Djursholm och Berndt Forsgrén i Stockholm var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 3 augusti 1932.

Ex officio:

E. Sandegren

(Stämpel)

Lösen	Kr.	1:50
Stämpel	"	2:-
	Kr.	3:50

Rätt avskrivet intyga:

I. Kronlund E. Jakobson

V i d i m e r a s:

B. Törnblomy
Lennart Walling

Bil. H'

16

KUNGL. VÄG- OCH
ATTENBYGGNADSSTYRELSENS
BANINSPEKTÖR
STOCKHOLM

RESS: ENGELBREKTSGATAN 41.
TELEFON: 3959

Stockholm Ö. den 10 sept. 1933.

Herr Landtbruksingenjör M. Lingström.

Nyköping

Härmed får jag efter granskning äran återställa av Eder ingivna ~~förslag~~ och till mig af K. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsen för åtgärd remitterade förslag till torrläggningsföretaget Drägstad-Vallersta,

försett med vederbörlig påskrift om godkännande, ~~samt anmoda Eder att inom en månad hit inkomma med bestyrkta kopior i två exemplar.~~

Tjänsteräkning bilägges.

Stockholm som ovan

Carl J. Insulander

Bil. H² 17.

ÖFVERSTELÖJTNANT
CARL J. INSULANDER
I KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSKÅREN

ENGELBREKTSGATAN 41, STOCKHOLM Ö.
TELEFON 3959.

Stockholm Ö. den 10 sept. 1932.

RÄKNING.

Torrläggningsföretaget Drögstad-Vallersta Debet

TILL

Carl J. Insulander.

1932 sept. 10. Av Granskning i hvad rör jernvägen af planen till företaget Kr. 30,00

Summa Kronor 30,00

Qvitteras:

Carl J. Insulander

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Nykyrka Socken								
	1 mtl. Drögstad 1'								
	Gustaf Jonsson								
1	Åker, lermylla på lera		22.5						
2	Dr, d. " d.		24.0						
3	Dr, dymylla " d.		30.0						
4	Dr, d. " d.		55.0						
5	Avloppsgrav								
	Summa	1	31.5					1	31.5
	Stigtomta Socken								
	1 mtl. Vallersta 1'								
	Karl Andersson								
6	Avloppsgrav								
7	Åker, dymylla på lera		28.5						
8	Dr, lermylla " d.		57.0						
8a	Dr, d. " d.		35.0						
9	Dr, d. " d.		73.5						
10	Dr, d. " d.		38.5						
11	Dr, d. " d.		02.5						
12	Dr, d. " d.		48.0						
	Summa	2	83.0					2	83.0
	Summan —								
	Nykyrka Socken								
	1 mtl. Drögstad 1'								
	Gustaf Jonsson	1	31.5					1	31.5
	Stigtomta Socken								
	1 mtl. Vallersta 1'								
	Transport	1	31.5					1	31.5

längd för torrläggningsföretaget Drögstad-Vallersta

i Nykyrka och Stigtomta sock~~en~~nar av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	85	850	150	1.0	225	–	191	25	33	75			
				1000	50	500	500	1.0	240	–	120	–	120	–			
				1000	35	350	600	0.95	285	–	105	–	180	–			
				1000	25	250	600	0.85	467	50	137	50	330	–			
	0%																
	0%	1	38.5						1217	50	553	75	663	75			
	0%																
				1000	20	200	600	0.80	228	–	57	–	171	–			
				1000	60	600	400	1.0	570	–	342	–	228	–			
				1000	75	750	250	1.0	350	–	262	50	87	50			
				1000	50	500	500	1.0	735	–	367	50	367	50			
				1000	45	450	500	0.95	365	75	173	25	192	50			
				1000	90	900	100	1.0	25	–	22	50	2	50			
				1000	55	550	450	1.0	480	–	264	–	216	–			
	0%	2	90.0						2753	75	1488	75	1265	–			
drag.																	
	0%	1	38.5						1217	50	553	75	663	75			
	0%	1	38.5						1217	50	553	75	663	75			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	31.5					1	31.5
	Karl Andersson	2	83.0					2	83.0
	Summa	4	14.5					4	14.5

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	07.0	1	38.5						1217	50	553	75	663	75			
	07.0	2	90.0						2753	75	1488	75	1265	–			
	14.0	4	28.5						3971	25	2042	50	1928	75			

Drögstad pr. Stigtomta den 17 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Ant. Jansson Örnulf Johansson

Bihödande godemän.

Kostnadsförslag

för torrläggningsföretaget Drögstad-Vallersta i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning åren 1929-1932.
(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B.						
A-B 13+4-10+4	300	Schaktning av lera	300	0.75	225	-	225	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp					25	-
Summa	300	Summa kronor					250	-

Drögstad pr. Stigtomta den 17 november 1932.

Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggningsföretaget Drögstad – Vallersta i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län, upprättad vid laga synsförrättning åren 1929-1932.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=sökande till företaget.	Jord-förbättringsvärde. Kr. ö. öre	Repartitionstal. %	Kostnad för torrläggningen. Kr. ö. öre	Kostnad för laga synsförrättningen. Kr. ö. öre
Nykyrka socken.					
1 mtl. Drögstad 1:.					
Gustaf Jonsson	S	663 75	34.413	86 03	94 52
Stigtomta socken.					
1 mtl. Vallersta 1:.					
Karl Andersson	S	1265 –	65.587	163 97	180 14
Summa		1928 75	100.000	250 –	274 66

Drögstad pr. Stigtomta den 17 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ant. Jansson

Emil Johansson

Biträdande godemän.

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:100000
Bettna
Husbygård
Husby-Oppunda
Wrena
Halla
Hallbo
Yngaren
Stigtomta
Räbygård
Öf. Walinge
Ned. Walinge

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Drögstad i Nykyrka socken och Vallersta i Stigtomta socken av Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omedelbart nordost om Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg omkring 3 kilometer nordväst om Stigtomta järnvägsstation och finnes till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 4,145 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

De i företaget ingående markerna avvattnas för närvarande genom ett utefter järnvägen gående , c:a 1 kilometer långt avloppsdike ned till Hallbosjön. På grund av markernas ringa höjd över Hallbosjön och det långa utloppet äro markerna i hög grad vattensjuka och ofta besvärade av översvämning. För att ernå en tillfredsställande torrläggning av markerna har därför i enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits upptagande av ett nytt avlopp från markerna rakt ned till Hallbosjön, å hithörande plan- och profilritningar betecknat med A-B med ny kulvert under järnvägen vid punkt 10+8.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för det föreslagna avloppet från markerna är å

översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 0,45 km^2. Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km^2 eller till 45 liter/sekund från området i dess helhet. Avloppet har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25, en bottenbredd av 0,3 meter och med en bottenlutning av 0,4:1000. Härigenom beräknas den vid flöden framrinnande vattenmängden komma att avbördas vid ett vattendjup av 0,36 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängden beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,15 meter.

Dimensionen å kulverten under järnvagen har beräknats enligt Darcy och Weisbach till 0,30 meter, varvid tillåtits ett övertryck av 5 cm.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

För företagets utförande erfordras enligt ovan nybyggnad av en trumma för Oxelösund-Flen-Westmanlands järnväg vid punkt 10+8. Trumman har föreslagits till utförande med användande av 30 cm:s järnrör i enlighet med härför upprättad ritning. Enligt till protokollet fogad skrivelse av den 10 september 1932, har Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör godkänt förslaget ifråga.

Som den av företaget berörda marken enligt järnvägens expropriationskarta jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker, skall jämlikt 7 kap. 10 § vattenlagen arbetet med kulver-

Torrläggningsföretaget Drögstad-Vallersta

i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län.

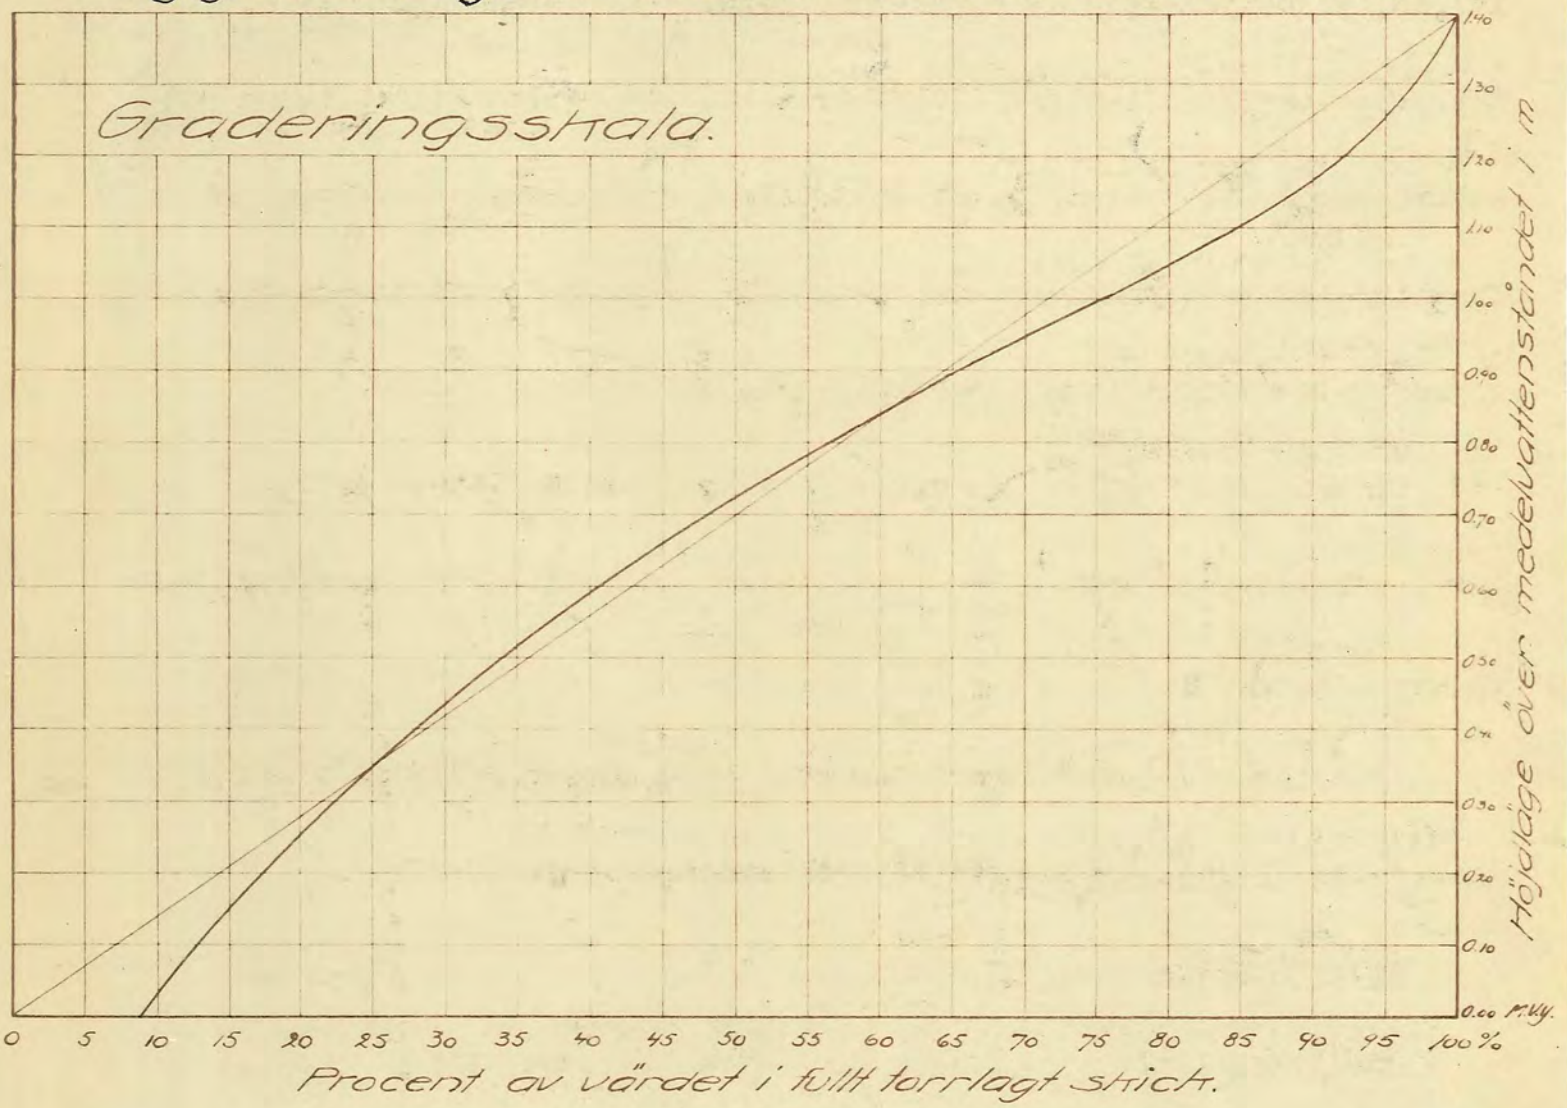

ten under järnvägen bekostas av järnvägens ägare, som enligt 7 kap. 9 § vattenlagen även är pliktig att ombesörja arbetet.

Brobyggnader i övrigt ingå icke i företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i nuvarande avloppet från markerna, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

De lägst belägna delarna av torrläggningsområdet hava emellertid

beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 2.042:50 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 3.971:25 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 1.928:75 kronor.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning eller för jordupplag. Synemännen föreskriva därför, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet. Därest dessa rensningar utföras enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam o.d. som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakt-

tagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande till 250:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. I detta belopp ingår dock icke kostnaden för kulverten under järnvägen, som överslagsvis beräknats till 400:- kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader, med undantag dock för järnvägstrumman vid punkt 10+8, som skall bekostas av järnvägens ägare, skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade

bestämmelser.

Arbetet skall vara fullbordat inom ett år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jordmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla svackor samt i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete, och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall sålunda grässkäras minst en gång om året och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas, och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av kulverten under järnvägen skall åvila järnvägens ägare.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrläggningsföretaget Drögstad - Vallersta i Nykyrka och Stigtomta socknar av Södermanlands län".

Drögstad pr. Stigtomta den 17 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ingström

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Jansson Emil Johansson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående tomtägoregleringsföretaget Dröpstabo-
Vallersta i Nykvarns och Stigtomta
socken ~~nar~~ *och* Södermanlands *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50	6	–	6	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.6	1,50		90		
		kroklinje „	0.7	3,00	2	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 41 ar st.	10	0.24	2	40		
		har	4.145	0.78	3	23		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.14	0.78		11		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.73	3.00	2	19		
		kroklinje „	0.37	5.00	1	85	12	88
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	–	4	–
		övriga regalark blad						
		Överföres					22	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 88
		Avvägning:				
1926	4/6 8/7	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* ..... *har*	4.145	0.50	2 07	
		avvägda punkter ..... *st.*	25	0.03	75	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	0.7	2,00	1 40	
		i annan mark ..... *„*		5,00		16 22
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 40 *ar,* ..... *st.*	12	0.05	60	
		..... *har*	4.285	0.10	43	1 03
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* minsta avvde ..... *st.*		0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för öviga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	20	0,06	1 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	10	0,12	1 20	6 40
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... *„*	1.3	3.50	4 55	4 55
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion ..... *st.*	2	0.12	24	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	6	0.25	1 50	1 74
		..... *„*				
		..... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*	0.45	0,02	01	
		dagar		12,00		2 01
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta avvde *km.*	1.0	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	1.0	1,00	1 —	4 50
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² *„*				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	7.5	0,03	22	1 22
		Överföres				65 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 05
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		- -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp minsta avstånd ... *„*	1.0	4,00	4 00	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			25	4 25
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		- -
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar ...		3,-		
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ... *kr.*	1	3.-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
						3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	25	0,01	25	25
		Översiktskarta *§ 41* ...			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25	-	- -
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		2 60
1929	28/8	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	7	3,00	21 —	21 —
1932	17/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 —	24 —
1932	25/8 9/9	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* Skrivelser och prövning ang. jämförelsenummer ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
1929	27/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		Summa kronor				134 15
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...				7 —
		övriga *regalark* *blad* ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 40 *ar ägofigurer* ... *st.*	12	0.07	84	
		... *har*	4.285	0.14	60	
		Överföres			1 44	7 —

35.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1 44	7 –
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	25	0,02	50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	37	4 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	1.0	3.–	3 00	
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	0.30	6.–	1 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 74	
		3) broar och trummor, „ „			3 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					9 54	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2 39	7 15
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				36 51
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 –
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2 ex			2 –	16 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		utlägg till baninspektören för granskning				30 –
		Summa kronor				104 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				134 15
		Lösen för kopior och avskrifter				36 51
		Övriga förrättningskostnader				104 –
		Summa kronor				274 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönköpings, Rinkabo och Södra *häradsrätt.*

Skeppsta pr Skiftinge den 17 november 1932

Martin Lindström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Jansson — Emil Johansson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30613
