godk. 12.

110/45

DIARIE NR 5429
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB 1946

D 2*0382

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 oktober 1945 till Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken av SÖDERMANLANDS LÄN

117/46

beviljat **statsbidrag** med ettusenetthundrasextio (1.160) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören M. Lingström vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig. ~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 7/8 1945. K. 73.
8. 1945. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
344745

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valla pr Bettna den 18. 2. 1946.

Ivar Norberg

Att agronom Ivar Norberg, Valla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[illegible] Anna-Lisa Hoflund

Adress Venehlund, Bettna Adress Engsberg Avesta.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 mars mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

N:r 5429
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1946

D____2★0382

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande
V A L L A - S K E P P S T A
dikningsföretag av år 1944
i Husby-Oppunda socken,
Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande

V A L L A - S K E P P S T A

dikningsföretag av år 1944

i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län,

upprättat år 1944 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 oktober 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å Länsstens vägnar.

Martin Lingström

Betänkande rörande statsbidrag från statens avdikningsanslag till Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, har handlagts av undertecknad och avslutats den 27 juni 1944. Enligt här bifogat bevis (Bil. A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till utförande av det i företaget ingående avloppet.

Belägenhet.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2,5 kilometer sydsydväst om Husby-Oppunda kyrka och angives med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Torrläggningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid

syneförrättningen föreskrivits utförande av det å plan- och profil ritningarna angivna röravloppet A-B.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppets dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Sammanfattning av uppgifter

om företagets areal, kostnad och båtnad samt beräknat bidragsbelopp finnas angivna i efterföljande tabell, varjämte särskilt sammandrag av kostnaderna upprättats och bilagts detta betänkande (Bil.C.)

Areal i hektar			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Bidrag i procent av kostnaden	Bidrag
åker	annan mark	summa	kronor	kronor			kronor
5,60	-	5,60	2.348:64	2.364:10	0,99	49,65	1.166:10

Statsbidrag.

Som all i företaget ingående mark utgöres av åker, synes enligt för närvarande gällande bestämmelser statsbidrag till företaget kunna utgå enligt bidragskvoten maximum 1/2. Såsom framgår av förestående tabell torde därför till företaget kunna beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 1.160:- kronor.

Förord samt utredning om företrädesrätt till erhållande av statsbidrag.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Den i företaget ingående marken utgöres av åker, som genom torrläggningen omedelbart kommer att giva ökade skördar, varför företaget enligt nådiga brevet den 28 juni 1941 synes böra givas företräde till erhållande av statsbidrag, som tillstyrkes med ovan angivna belopp.

Arbetstid.

För företaget beräknas en arbetstid av ett år.

Bilagor.

Bil. A. Laga kraftbevis.

Bil. B. Bevis, att redogörelse lämnats till Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.

Bil. C. Kostnadssammandrag.

Bil. D. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna i ett band samt en ritningskopia.

Nyköping i december 1944

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 27 juni 1944 avslutad laga syneförrättning rörande Valla - Skeppsta diknings-ningsföretag av år 1944 inom Husby-Oppunda socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-tendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lantbruksingenjören M. Lingström, på begäran.

Lösen redov. gm stpl ... 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

Södermanlands Läns K. Bil. B.

Hushållningssällskap

Intyg.

Härmed intygas att från lantbruksingenjören i Södermanlands län till Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd den 27 juni 1944 inkommit redogörelse ang. planerat torrläggningsföretag, benämnt Valla-Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Nyköping den 16 oktober 1944.

I tjänsten

Robert V. Wennberg

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Avloppet A-B enligt i synehandlingarna intaget,

detaljerat kostnadsförslag 2.100:-

Förrättningskostnader m.m.

Kostnad för laga syneförrättningen 222:24

" " betänkandet angående statsunderstöd 26:40 248:64

Summa kronor 2.348:64

Nyköping i december 1944

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 2.348 kronor 64 öre.

Stockholm den 26 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Gästens vägnar:

Martin Lingström

Bil. D.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	15:-
Avskrift av betänkandet, § 57	4:40
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	5:-
Inbindning av handlingar	2:-
Summa kronor	26:40

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den 23 december 1944.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift, sid. 1 - 8, bestyrkes å tjänsten vägnar:

Martin Lingström

godkl. 1/3 1946 110/15

DIARIE Nr 5430
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB 1946

RAPPORT

över avsyning av torrläggningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juni 1945.

Företagets namn: Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 oktober 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.160:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förtroendeman: Agronomen Ivar Norberg, Valla, Bettna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 14 mars 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de beräknade.

Nyköping den 20 februari 1946.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

29417
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1945
D 2*0382

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Valla-Skeppsta

dikningsföretag av år 1944

i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län

Nederbördsområde nr 65 Nyköpingsån.

Handlingar
rörande
Valla-Skeppsta diknings företag av år 1944
i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning
år 1944 av
Martin Lingström.
Statens lantbruksingenjör.

Härtill två ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för tomläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Den 27 juni 1944.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Husby-Oppunda församling anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil C.¹-C³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 11 f.m. hos agronomen Ivar Norberg, Valla, varjämte underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet hade infunnit sig
undertecknad, statens lantbruksingenjör,
de för förrättningen tillkallade biträdande godemännen
Ivar Nilsson, Tärnö, och
Ruben Nilsson, Sjösa,
samt sakägare
agronomen Ivar Norberg, ägare av 4/8 mtl. Valla 2!

§1.

Ansökningen om förrättningen, Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§3.

Undersökning och avvägning av de i företaget ingående

markerna hade tidigare verkställts genom förrättningsmannens försorg, varjämte förslag upprättats till markernas torrläggning.

§ 4.

Från ägaren av 5/14 mtl. Skeppsta 1³, John Annell, hade till förrättningsmannen inkommit en skrivelse, som upplästes och bilades protokollet. /Bil. E./

§ 5.

Agronomen Ivar Norberg yrkade, att erforderligt avlopp skulle få anordnas för torrläggning av den honom tillhöriga i företaget ingående marken i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för det upprättade torrläggningsförslaget samt för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. ävensom för nu gällande villkor för erhållande av statsunderstöd från statens avdikningsfonder till företagets utförande.

För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått till utförande av det i företaget ingående avloppet.

§ 7.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 8.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade härvid tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för 2½ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 9.

Avskrift av förrättningshandlingarna med därtill hörande ritningar skulle inom trettio dagar härefter överlämnas till sökanden, agronomen Ivar Norberg, Valla pr Bettna, som skulle vara förtroendeman för företaget. Handlingarna

och utningarna skulle finnas å Valla gård tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes, varefter synefärrättningen förklarades avslutad.

Valla pr Bettna den 27 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör

Ivar Mixten

Biträdande godemän.

JS 11/92 D.R. 1944.

Bil. A.

5

Ankom den
- 4 MAJ 1944
till
Landskansliet
i Nyköping

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 6 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

4 1/8 mtl. Valla ..... ägare: Ivar Norberg.

5/14 " Skeppsta ..... " John Annell.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad, agronom Ivar Norberg, Valla, Bettna, tel. Husby-Oppunda 43.

Valla pr Bettna den 2/5 1944.

Ivar Norberg

Bil. B.

LÄNSSTYRELSEN
I
...NLANDS LÄN.

KONUNGENS BEFALLNINGSHAFVANDE I SÖDERMANLANDS LÄN

N:o 11/92 D.R.1944.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från agronomen Ivar Norberg, Valla, Bettna, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 4 maj 1944.

På Länsstyrelsens vägnar:

(S.Ljungstedt.) (B.Löfström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Bil. 6

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, kommer att av synemännen hållas hos agronomen Ivar Norberg, Valla, tisdagen den 27 juni 1944, klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 5 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i Laga ordning i Husby-Oppunda församling söndagen den 11 juni 1944 intygas

Bettna, Husby-Oppunda den, 11/6 1944

Erik Broberg

kyrkoherde.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 27 juni 1944 för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta.

Bil. C.2

KUNGÖRELSE.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, kommer att av synemännen hållas hos agronomen Ivar Norberg, Valla, tisdagen den 27 juni 1944, klockan 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 5 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 6/6 1944, intygas av:

Södermanlands Nyheter

Bil. 6³.

N:o 2959

Angives vid likvid pr post. Postkvitto gäller som vårt kvitto.

Södermanlands Nyheter

LÄNETS STÖRSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING SAMT ALLMÄNNA ANNONSORGAN

UTKOMMER ALLA HELGFRIA DAGAR . UPPLAGA 17,500 EX.

Telefoner: Huvudkontoret i Nyköping 137.
Redaktionen i Nyköping 278.
Oxelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44,
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

NYKÖPING den 19 Juni 1944

Statens Lantbruksingenjör N. Ljungström Nyköping

DEBET

		Att betalas pr kontant netto An annons:		Mm.	Ggr	Pris pr mm.	Brutto Kr.	Brutto öre	Rabatt Kr.	Rabatt öre	Netto Kronor	Netto öre
Juni	6	Sammanträde 27 Juni i Valla		55	1	20		Kontra			11	-

KVITTERAS
- 3. JUL. 1944
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

ning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten.
t bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

G. ÖSTERBERGS TR. A/B. NYKÖPING 493. 43.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 27 juni 1944 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 5 juni 1944.

Namn.	Adress.	
Ivar Norberg	Valla,	Bettna.
John Annell	Skeppsta,	"
Skiftesgodemannen Axel Ruben Nilsson ..		Sjösa.
" Ivar Nilsson	Tärnö,	Bettna.

Nyköping den 5 juni 1944.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. E. 4

Skeppsta, Bettna 21 juni 1944

Lantbruksingenjör Martin Lingström,

Nyköping!

Med anledning av vårt telefonsamtal för några veckor sedan har jag äran meddela, att jag av en byråchef i sakkunnig institution avråtes från att tecknа godkännande på kostnadsförslag för Valla-Skeppsta avdikningsföretag.

Först idag har jag fått svar på en förfrågan jag omedelbart efter vårt samtal gjorde hos en son, som är pirist om byråchef. Dröjsmå-

målet har berott på, att denne ej själv alls kände till de förordningar, som reglera dylika frågor, utan måste vända sig till en gammal vän, som var fackman.

Dennes utlåtande innebar, att Skeppsta visserligen är skyldigt att deltaga i kostnaderna för grävningen av avloppet, men att praktiskt taget hela båtnaden av att graven ej blir öppen blir Vallas. Jag skulle därför ha rätt att på begäran erhålla specifikation av de olika kostnader, som Skeppsta skall deltaga uti. Och med vilken procent.

Finner jag den anmärkningsvärda skulle vederbörande vid tillfälle vilja på ort och ställe "göra ett stickprov", vad han kan mena med det.

Min närvaro vid sam-

manträden för torsla
var absolut obehövlig

Alltså har jag a
dels att jag i sinom
ler ett fullt specific
nads förslag

dels att jag icke
något torrläggningsla
betala allt kontant

Med utmärkt
John An

...på, att denne ej själv alls
...förordningar, som reglera
..., utan måste vända sig
...al vän, som var fackman.
...utlåtande ämnar, att
...rligen är skyldigt att del-
...derna för grävningen av
... att praktiskt taget hela
... att graven ej blir öppen
...Jag skulle därför ha rätt
...n erhålla specifikation
...kostnader, som Sheppsta
... uti. Och med vilken

...ner jag den anmärknings-
...e vederbörande vid till-
...å ort och ställe "göra
...e", vad han kan mera

...in närvars vid som-

manträden för torrläggningen
var absolut obehövlig.

Alltså har jag äran anhålla:

dels att jag i sinom tid erhål-
ler ett fullt specificerat kost-
nadsförslag

dels att jag icke erhåller
något torrläggningslån utan får
betala allt kontant.

Med utmärkt högaktning
John Annell

14.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurens nr:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	4/18 mtl. Valla 2'								
	Ivar Norberg								
1	Åker, lermylla på lera		1 23						
2	" " " "		1 55						
3	" " " "		1 10						
4	" " " "		43						
1-4	Summa		4 31						4 31
	5/14 mtl. Skeppsta 13								
	Johan Sonnell								
5	Åker, lermylla på lera		57						
6	" " " "		72						
5-6	Summa		1 29						1 29
	Sammandrag								
	4/18 mtl. Valla 2'								
1-4	Ivar Norberg		4 31						4 31
	5/14 mtl. Skeppsta 13								
5-6	John Sonnell		1 29						1 29
1-6	Summa		5 60						5 60

längd för ~~torrläggningsföretaget~~ Valla-Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.
				1400	85	1190	210	1,0	1722	-	1463	70	258	30			
				1400	55	770	630	1,0	2170	-	1193	50	976	50			
				1400	55	770	630	1,0	1540	-	847	-	693	-			
				1400	80	1120	280	1,0	602	-	481	60	120	40			
		4	31						6034	-	3985	80	2048	20			
				1300	70	910	390	1,0	741	-	518	70	222	30			
				1300	90	1170	130	1,0	936	-	842	40	93	60			
		1	29						1677	-	1361	10	315	90			
		4	31						6034	-	3985	80	2048	20			
		1	29						1677	-	1361	10	315	90			
		5	60						7711		5346	90	2364	10			

Valla pr Bettna den 27 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

Fr. Bissa

Bihädande godemän

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1944.

(Timpenning 1:35 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B.						
A B 0-3+35	335	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") betongrör, vibrerade, tillverkade av A-cement, blandning 1:3, 1,0 meter långa, 2 gånger strukna med anhydrol st.	330	4:25	1402	50		
		Inköp och frakt av grenrör av vibrerad betong 1:3, 2 gånger strukna med anhydrol st.	4	8:50	34	-		
		Schaktning av lera	120	1:50	180	-		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	335	0:50	167	50		
		Trumöga av vibrerad betong 1:3 jämte rustbädd och torvsättning vid punkt A			30	-		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s rör av vibrerad betong, blandning 1:3, 2 gånger strukna med anhydrol jämte botten och lock av betong samt stenfyllning vid punkten B			90	-	1904	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					196	-
Summa	335	Summa kronor					2100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jämförande kostnadsberäkning						
		för öppet dike å sträckan 1+50 - B till						
		streckade bottenlinjen.						
		(Eljest erforderligt för torrläggning						
		av marken tillhörande Skeppsta 1^{3}.)						
1+50 - B 3+35	185	Schaktning av lera	135	1:50	202	50		
		Utplanering av jordsträngarna	135	0:40	54	-	256	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående belopp					23	50
Summa	185	Summa kronor					280	-

Valla pr Bettna den 27 juni 1944.

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för Valla-Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1944.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde		Repartitionstal	Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Summa kostnad	
		Kr. ö öre		%	Kronor och öre					
1.	2.	3.		4.	5.		6.		7.	
4 1/8 mtl. Valla 2' Ivar Norberg	S	2048	20	86.6376	1819	39	192	54	2011	93
5/14 mtl. Skeppsta 1³ John Annell	–	315	90	13.3624	280	61	29	70	310	31
Summa		2364	10	100.0000	2100	–	222	24	2322	24

Valla pr Bettna den 27 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

Ivar Nissa

[signature]

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:100 000.
Förssa
Årdala
Vibyholm
Sandvik
Ripsa
Edeby
Uren
Stäringe
Tuvkärr
LÅNGHALSEN
Torpfjärden
Husby-Oppunda
Husbygärd
Vävelsta
Lid-sjön
Oppeby
Lid
Fjällveden
Malstanäs
Sofielund
Marsjön
Mänsjön
Svärdsta
Viby
Glottran
Holmbysjön
Ånsta
Kapps

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Valla och Skeppsta i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde n:r 65 omkring 2,5 kilometer sydsydväst om Husby-Oppunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 5,60 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits utförande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B såsom täckt rörledning såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppet A-B är å översiktskartan innesluten av en heldragen blå linje och omfattar enligt undersökning på marken en areal av 20 har. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 1,25 sekundliter pr har till 25 liter/sekund.

Avloppet skall utföras av 22,5 cm:s (9") betongrör med en minsta bottenlutning av 3,5:1000. Dimensionen har beräknats enligt

Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 40. Vid rörledningen skall anordnas trumöga av betong vid punkten A samt samlingsbrunn av betongrör med botten och lock av betong vid punkten B i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnen skall göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppets djup under markytan samt fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Enligt tidigare verkställd undersökning av grundvattnet från intilliggande marker, har vattnet befunnits hava påtaglig angreppsförmåga på betong. Betongrören skola därför vara vibrerade och tillverkade av portlandcement, klass A, med en blandning av 1:3 med i möjligaste mån vattentätt gods, två gånger strukna med anhydrol samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast rör av absolut förstklassigt fabrikat komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

V A L L A - S K E P P S T A dikningsföretag av år 1944
i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

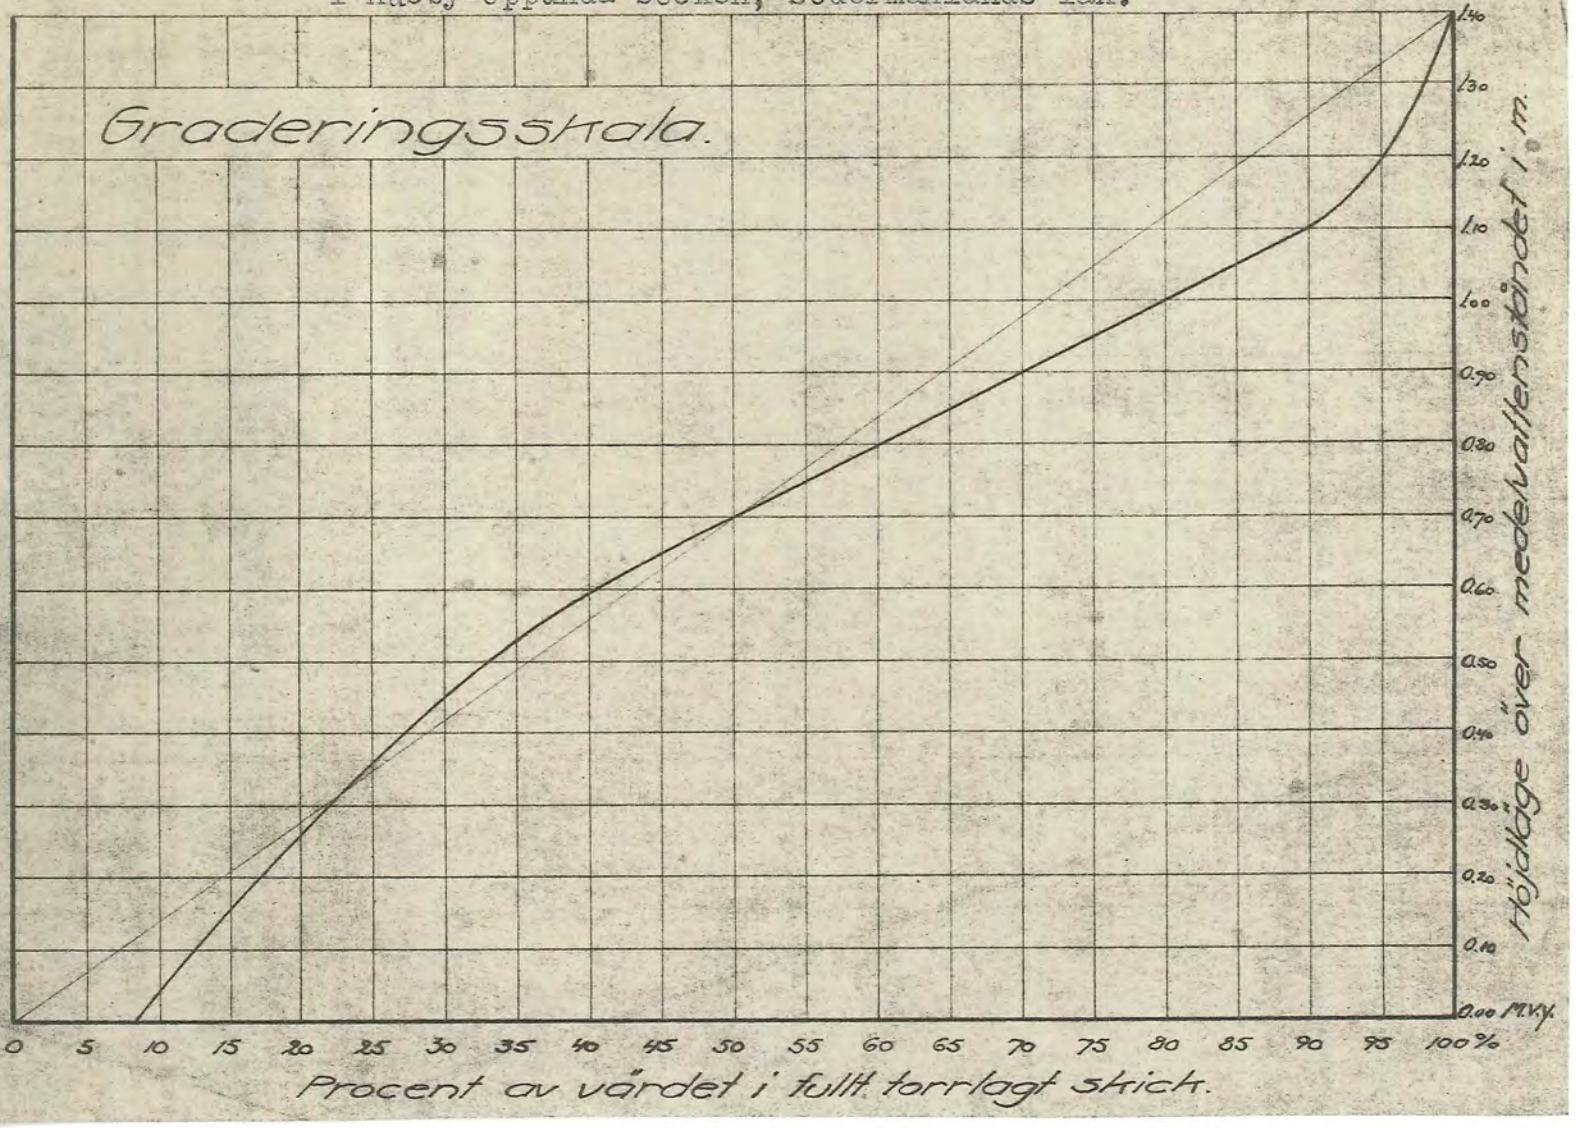

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5.346:90 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 7.711:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 2.364:10 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgår kostnaden för avloppets utförande till 2.100:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet enligt förut angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vat-

tenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1948.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid påfyllningen kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av minst 1,0 meter över desamma samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i den anordnade brunnen eller i de i ledningen anbragta grenrören.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller har en fixpunkt med höjdläget +11,16 m. inhuggits i form av en ring i jordfast sten, 100 m. nordväst om punkt B.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess

slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande samlingsbrunn skall dessutom rensas minst två gånger om året. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för arbetets första utförande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Valla - Skeppsta dikningsföretag av år 1944 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län.

Valla pr Bettna den 27 juni 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Valla-Skeppsha dikningsföretag av år 1944

i Husby-Oppunda *socken och* Södermanlands *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1,8	3,00	5	40		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 93 ar	st.	6	0,36	2	16		
			har	5,60	0,54	3	02		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket				4	-	14	58
		övriga regalark / blad	st.						
			Överföres					17	58

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					17	58
		Avvägning:						
1942	4/6	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3/4	12,00	9	-		
1944	3/6	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har ... har	5,60	0,50	2	80		
		avvägda punkter ... st.	65	0,03	1	95		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1,6	2,00	3	20		
		i annan mark ... „		5,00			16	95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 93 ar, ... st.	6	0,07		42		
		... har	5,60	0,06		34		76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	6	0,04		24		24
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	12	0,06		72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	6	0,12		72	5	44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0,5	3,50	1	75	1	75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	8	0,25	2	-		
		... „						
		... „					2	-
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	-	3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... $km.^2$	0,25	0,02		01		
		... dagar		12,00			2	01
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr $m.^2$ „						
		nämligen ... $m.^2$ sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ minska avvola	1	10,00	10	-	10	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	8	0,03		24	1	24
		... Överföres					60	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 97
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		– –
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp minsta arvode „	1	4,00	4 –	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 10	6 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		– –
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		– –
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	65	0,01	65	65
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4 05	4 05
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		– –
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00	21 –	21 –
1944	27/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* ... *dagar*	1	12,00	12 –	12 –
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
1944	29/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/4	12,00	3 –	3 –
1944	26/6	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... „	1/2	12,00	6 –	
		slamficka ... „		12,00		
						6 –
						116 37
		Lösen för: *Summa kronor*				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...				7 –
		övriga *regalark blad* ... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 93 *ar ägofigurer* ... *st.*	6	0,10	60	
		... *har*	5,60	0,08	45	
		Överföres			1 05	7 –

30.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1 05	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			26	
		3) insättning av höjdlägestal st.	65	0,02	1 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	8	0,05	40	4 76
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	0335	6:-	2 01	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		2 01
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				37 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (2 ex.)			4 -	15 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				33 85
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				20 -
		Summa kronor				68 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				116 37
		Lösen för kopior och avskrifter				37 02
		Övriga förrättningskostnader				68 85
		Summa kronor				222 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Uppsala häradsrätt.

Valla pr Bälinge den 27 juni 1944

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor kvitteras:

den 19

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212
