

gr. 7000
44

306
39

D 1*0298

DIARIE Nr 7747
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

3 mars 1939

för

"torrlägningsföretaget Malm" i Husby-Oppunda socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

1 rikm. 1 h. husby
under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tvåtusentvåhundrafyrtio (2.240) +)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundratjugo (1.920) ++)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

här under tecknad *ende intressent i* ~~ha 2. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~berättigande~~

~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+) lånet minsk.enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 mars 1939 till 2.060 kronor.

++) statsbidraget minsk.enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 mars 1939 till 1.750 kronor

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikation bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om ^{dess} underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skolen pr. Betona den 12 April 1939.
Henrik Michalowski

Att ~~Henrik Michalowski~~ Skolen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Maria Paenspan
Adress ~~från vägen 7 c.~~
från vägen

Jan Sku
Adress ~~från vägen 7 c.~~ Sthlm.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 april 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1★0298

DIARIE Nr 7747
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1939

Austrift.

Torrlägningsföretaget
Malm

i Husby-Öppunda socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 65/Hyltöpingån.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bär den
3 mars 1939 fastslämd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftar i tjänstens vägnar:

Martin Lingström

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

M A L M

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,

upprättat år 1938 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels
medgivit, så utän hinder för företagets godkännande ägo-
bron vid 10⁺²³ a dike A-B-C med utgifter den fastslämda
arbetsplanen, dels ock föreskrivit att de beviljade
Statsunderstöten skola minskas, nämligen från 2.240 kro-
nor till 2.060 kronor och statsbidraget från 1.920 kro-
nor till 1.750 kronor.

Stockholm den 16 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftar i tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill en ritning.

Betänkande, rörande torrlägningsföretaget Malm i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1938.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1938 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Malm 1², 1³, 2⁶, 3², 3³ och Ösby 1¹¹, 3¹⁵ i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 31 mars 1938. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.D.) och ritning (Bil.E.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 4 kilometer söder om Husby-Oppunda kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markrats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 19,20 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består å de lägre belägna delarna av dy- eller dymylla på lera och å de högre belägna delarna av lermylla på lerbotten.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattenskadade marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola tre ägovägs- eller ägobroar ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 8.404:35 kronor före torrläggningen, 13.188:30 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 4.783:95 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och brobyggnader beräknats till 3.800:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för laga syneförrättningen 316:03 kronor och för detta betänkande med bilagor 80:04 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 4.196:07 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil.A.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,88, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 45,80 procent av den för företaget beräknade kostnaden 4.196:07 kronor, eller med i avrundat tal 1.920:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 2.270:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetets torde kunna fullbordas inom loppet

av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Kostnadssammandrag.

Bil. B. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. C. Arvodesräkning.

Bil. D. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. E. Ritningskopia.

Nyköping i april 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Avloppet A-B-C enligt i synehandlingarna intaget,		
detaljerat kostnadsförslag		<u>3.440</u> ~~3.800:~~
Kostnad för laga syneförrättningen	316:03	
" " betänkandet med bilagor	80:04	396:07
		<u>3.836:07</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>4.196:07</u>

Nyköping 1 april 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Nid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 4.196 kronor 7 öre, varav å ländarens fastigheters andel 4.145 kronor 13 öre, sedan från delaktighet i länet utesluts fastigheterna Kalm 1³ och Öky 3¹⁵.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften beslykades å tjänstens vägnar:
Knut Lingström

Avskrift.

Framför med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för förslaget beräknats till 3.836 kronor 7 öre.

Stockholm den 16 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften beslykades å tjänstens vägnar:
Knut Lingström

Bil. B.

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Malm i Husby-Oppunda socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Husby-Oppunda socken.

1/2 mtl. Malm	1 ²		} ägare: Henrik Michalowski.
~~1/2 " "~~	~~1³~~	~~.....~~	
48/100 " "	2 ⁵		
1/4 " "	3 ²		
1/4 " "	3 ³		
1/10 " Ösby	1 ¹¹		
~~27/100 " "~~	~~3¹⁵~~	~~.....~~	

Nyköping i april 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

*Skrifningarna med blått vidtagna av
Kungl. Lantbruksstyrelsen. Du.*

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Malm i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	18:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	18:70
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	19:79
" " " " profil- sektions- och broritningar, §§ 54,55	13:55
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Summa kronor	80:04

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den 6 april 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

M A L M

i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1938 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde under
 laga syneförrättning med avseende å företag
 för torrläggning av vattenskadade marker, till-
 hörande Malm 1², 1³, 2⁶, 3², 3³ och Ösby 1¹¹,
 3¹⁵ i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Den 31 mars 1938.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom
 gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet för-
 ordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde
 i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 f.m. å Malms
 gård.

Vid sammanträdet hade på kallelse infunnit sig, såsom biträdande
 godemän, skiftesgodemännen

Sven Andersson, Ramsta, och

Eric Karlberg, Gillberga,

samt sakägaren

Henrik Michalowski, ägare av 1/2 mtl. Malm	1 ² ,
1/2 "	1 ³ ,
48/100 "	2 ⁶ ,
1/4 "	3 ² ,
1/4 "	3 ³ ,
1/10 " Ösby	1 ¹¹ ,
27/100 "	3 ¹⁵ .

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i
 anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda, varjämte förslag till markernas torrläggning upprättats. De upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Godsägaren Henrik Michalowski yrkade, att avlopp måtte upptagas upp till avvägningspunkten 13+5 för torrläggning av de i företaget ingående markerna till så stort djup, som kunde ernås med hänsyn till nu rådande vattenstånd i sjön Långhalsen, och att i samband därmed ombyggnad måtte ske av de över avloppet befintliga broarna vid punkterna 4+31, 7+38 och 10+23.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrlägningsförslaget jämte de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m.

§ 6.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 3 $\frac{1}{2}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Malm pr Bettna den 31 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

Eric Karlberg

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr 25 D.R. 1937.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruks-
ingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torr-
läggning av vattenskadade marker å nedanstående, undertecknad tillhöriga
fastigheter i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

1/2 mtl. Malm	1 ²	} ägare Henrik Michalowski.
1/2 " "	1 ³	
1/2 " "	2 ⁴	
1/2 " "	2 ⁶	
1/4 " "	3 ²	
1/4 " "	3 ³	
1/4 " Ösby	1 ¹¹	
1/2 " "	3 ¹⁵	

Annan jordägare beröres icke av företaget.

Malms gård pr Bettna den 1/9 1937.

Henrik Michalowski.

Nr 25 D.R. 1937.F Ö R Ö R D N A N D E.

Med anledning av en från godsägaren Henrik Michalowski, Malms gård, Bettna, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhöriga fastigheterna Malm 1², 1³, 2⁴, 2⁶, 3² och 3³, 1/4 mantal Ösby 1¹¹ och 1/2 mantal Ösby 3¹⁵, allt i Husby-Oppunda socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 4 september 1937.

Bo Hammarskjöld.

Chr. Fahlcrantz

Utan avgift.

N:o 4171. Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>1/2 mtl. Malm 1³</u>								
	Henrik Michalowski.								
1	Åker, lermysla på lera		11						
2	1 ^a dymysla " do.		13						
3	1 ^a dy " do.		30						
4	Arbetsgrav								
5	Åker, dymysla " do.		28						
6	1 ^a lermysla " do.		10						
1-6	Summa		92						92
	<u>1/2 mtl. Malm 1²</u>								
	Henrik Michalowski.								
7	Åker, lermysla på lera		12						
8	1 ^a dymysla " do.		24						
9	Arbetsgrav								
10	Åker, dy " do.		66						
11	1 ^a do. " do.		05						
12	1 ^a dymysla " do.		09						
13	1 ^a do. " do.		35						
14	1 ^a lermysla " do.		24						
15	1 ^a do. " do.		05						
7-15	Summa		1 80						1 80
	<u>48/100 mtl. Malm 3⁶</u>								
	Henrik Michalowski.								
16	Åker, lermysla på lera		17						
17	1 ^a dymysla " do.		30						
18	1 ^a dy " do.		43						
19	1 ^a do. " do.		05						
	Transport		95						

längd för torrlägningsföretaget *Malm*

i *Fusby - Gypunda* socken av *Falkenbergs* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget emädd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor			kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor			öre
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	85	765	45	0,90	89	10	84	15	4	25			
				800	50	400	40	0,55	57	20	52	-	5	20			
				800	35	280	40	0,40	96	-	84	-	12	-			
10				800	40	320	40	0,45	100	80	89	60	11	20			
				900	85	765	45	0,90	81	-	76	50	4	50			
10		1	02						424	10	386	25	37	25			
				900	85	765	45	0,90	97	20	91	80	5	40			
				800	45	360	40	0,50	96	-	86	40	9	60			
04				800	40	320	40	0,45	237	60	211	20	26	40			
				800	40	320	40	0,45	18	-	16	-	2	-			
				800	50	400	40	0,55	39	60	36	-	3	60			
				800	50	400	40	0,55	154	-	140	-	14	-			
				900	85	765	45	0,90	194	40	183	60	10	80			
				900	90	810	45	0,95	42	75	40	50	2	25			
04		1	84						879	55	805	50	74	05			
				900	90	810	45	0,95	145	35	137	70	7	65			
				800	50	400	40	0,55	132	-	120	-	12	-			
				800	40	320	40	0,45	154	80	137	60	17	20			
				800	40	320	40	0,45	18	-	16	-	2	-			
									450	15	411	30	38	85			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		95						
20	Påker, dy på lera		08						
21	I ^a , dy mylla på lera		19						
22	I ^a , do. " do.		13						
23	I ^a , lermylla " do.		09						
24	I ^a , do. " do.		15						
25	Agroväg								
26	Påker, do. " do.		16						
27	I ^a , do. " do.		42						
28	I ^a , dy mylla " do.	1	20						
29	I ^a , do. " do.		52						
30	I ^a , dy " do.		13						
31	I ^a , do. " do.		10						
32	I ^a , dy mylla " do.	1	83						
33	I ^a , lermylla " do.		60						
34	I ^a , do. " do.		17						
35	I ^a , dy mylla " do.		76						
36	Stolpsgrav								
37	Påker, dy mylla " do.		60						
38	I ^a , do. " do.		08						
39	I ^a , lermylla " do.		32						
16-39	Summa		8 28					8 28	

14 mll. Nalm 3³.

Henrik Michalowski

40	Påker, lermylla på lera		23						
41	I ^a , do. " do.		09						
42	I ^a , do. " do.		23						
43	I ^a , dy mylla " do.		51						
44	I ^a , do. " do.		61						
45	Stolpsgrav								
46	Påker, dy mylla " do.	1	12						
47	I ^a , lermylla " do.		27						
40-47	Summa		3 06					3 06	
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									450	15	411	30	38	85			
				800	50	400	40	0,55	35	20	32	-	3	20			
				800	65	520	40	0,70	50	40	46	80	3	60			
				800	55	440	40	0,60	62	40	57	20	5	20			
				900	90	810	45	0,95	76	95	72	90	4	05			
				900	90	810	45	0,95	42	75	40	50	2	25			
13																	
				900	70	630	180	0,90	129	60	100	80	28	80			
				900	70	630	225	0,95	359	10	264	60	94	50			
				800	45	360	280	0,80	768	-	432	-	336	-			
				800	50	400	160	0,70	291	20	208	-	23	20			
				800	50	400	80	0,60	62	40	52	-	10	40			
				800	45	360	80	0,55	44	-	36	-	8	-			
				800	35	280	240	0,65	951	60	512	40	439	20			
				900	85	765	135	1,0	540	-	459	-	81	-			
				900	60	540	315	0,95	145	35	91	80	53	35			
				800	35	280	360	0,80	486	40	212	80	273	60			
21																	
				800	50	400	320	0,90	432	-	240	-	192	-			
				800	45	360	360	0,90	57	60	28	80	28	80			
				900	70	630	225	0,95	273	60	201	60	72	-			
34	8	62							5258	70	3500	50	1758	20			
				900	75	675	225	1,0	207	-	155	25	51	75			
				900	95	855	45	1,0	81	-	76	95	4	05			
				900	80	720	180	1,0	207	-	165	60	41	40			
				800	40	320	400	0,90	367	20	163	20	204	-			
				800	45	360	360	0,90	439	20	219	60	219	60			
05																	
				800	35	280	400	0,85	761	60	313	60	448	-			
				900	50	450	405	0,95	230	85	121	50	109	35			
05	3	11							2293	85	1215	70	1078	15			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	<u>1/4 mlt. Malm 3²</u>								
	Henrik Michalowski								
48	Åker, lermylla på lera		12						
49	9 ^o lermylla " do.		36						
50	9 ^o do. " do.		30						
51	9 ^o lermylla " do.		10						
52	9 ^o do. " do.		26						
53	9 ^o do. " do.		71						
54	9 ^o lermylla " do.		43						
55	Arbetsgrav								
56	Åker, lermylla " do.		47						
57	9 ^o lermylla " do.		19						
48-57	Summa	2	74					2	74
	<u>1/10 mlt. Öby 1"</u>								
	Henrik Michalowski								
58	Åker, lermylla på lera		63						
59	9 ^o do. " do.		25						
60	9 ^o do. " do.		49						
61	9 ^o do. " do.		19						
62	Arbetsgrav								
63	Åker, lermylla " do.		69						
58-63	Summa	2	25					2	25
	<u>2 1/100 mlt. Öby 3¹⁵</u>								
	Henrik Michalowski								
64	Åker								
65	Åker, lermylla på lera		15						
64-65	Summa		15						15
	<u>Sammandrag</u>								
	<u>1/2 mlt. Malm 1³</u>								
1-6	Henrik Michalowski		22						22
	Transport		22						22

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	45	405	450	0,95	102	60	48	60	54	-			
				800	35	280	440	0,90	259	20	100	80	158	40			
				800	40	320	440	0,95	228	-	96	-	132	-			
				900	75	675	225	10	90	-	67	50	22	50			
				900	90	810	90	10	54	-	48	60	5	40			
				900	70	630	270	10	639	-	447	30	191	70			
				800	40	320	440	0,95	326	80	137	60	189	20			
04																	
				800	35	280	440	0,90	338	40	131	60	206	80			
				900	45	405	450	0,95	162	45	76	25	25	50			
04		2	78						2200	45	1154	25	1045	50			
				900	35	315	540	0,95	538	65	198	45	340	20			
				900	50	450	450	10	225	-	112	50	112	50			
				900	55	495	405	10	441	-	242	55	198	45			
				900	85	765	135	10	171	-	145	35	25	65			
08																	
				900	85	765	135	10	621	-	527	85	93	15			
08		2	33						1996	65	1226	70	769	25			
				900	85	765	135	10	135	-	114	75	20	25			
07		22							135	-	114	75	20	25			
10		1	02						424	10	386	25	37	25			
10		1	02						424	10	386	25	37	25			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		22						22
	$\frac{1}{2}$ mll. Malm 1 ²								
7-15	Henrik Michalowski		1 20						1 20
	$\frac{48}{100}$ mll. Malm 2 ⁶								
16-39	Henrik Michalowski		8 28						8 28
	$\frac{1}{4}$ mll. Malm 3 ³								
40-47	Henrik Michalowski		3 06						3 06
	$\frac{1}{4}$ mll. Malm 3 ²								
48-57	Henrik Michalowski		2 74						2 74
	$\frac{1}{10}$ mll. Öby 1 ¹¹								
58-63	Henrik Michalowski		2 25						2 25
	$\frac{27}{100}$ mll. Öby 3 ¹⁵								
64-65	Henrik Michalowski		15						15
1-65	Summa		19 20						19 20

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	10	1	02						424	10	386	25	37	25			
	04	1	84						879	55	805	50	74	05			
	34	8	62						5258	70	3500	50	1758	20			
	05	3	11						2293	85	1215	70	1078	15			
	04	2	78						2200	45	1154	25	1045	50			
	08	2	33						1996	65	1226	70	769	25			
	07	22							135	-	114	75	20	25			
	72	19	92						13188	30	8404	35	4783	25			

Malin pr. Belma den 31 mars 1938.

St. fänskens vägnär:

Martin Lingskärn

Läkens lantbruksingenjör

Ivan Andersson Eric Farberg

Biträdande godsmän.

Kostnadsförslag
 för utförande av bräggningsförelaget Malm i
 Husby-Gjunde socken av Södermanlands län, upp-
 rättat vid laga synförräkning år 1938.
 (Timpennig 100 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Spåret A-B-C</u>						
A 0-40-1 ⁺⁵⁰	190	Brensning av slam och vatten- väter till öppet vatten i sjön Långhalsen km	190	0,35	66	50	66	50
1 ⁺⁵⁰ -3	150	Schaktning av dyjord	130	0,70	91	-		
		J ₂ " lera	20	0,90	18	-	109	-
3-5	200	J ₂ " dyjord	230	0,70	161	-		
		J ₂ " lera	70	0,90	63	-	224	-
		Ombyggnad av ägnägsbro vid 4 ⁺³¹ enligt specificerat kostnadsförslag					330	-
5-7	200	Schaktning av dyjord	250	0,70	175	-		
		J ₂ " lera	130	0,90	117	-	292	-
7-9	200	J ₂ " dyjord	150	0,70	105	-		
		J ₂ " lera	300	0,90	270	-	375	-
		Ombyggnad av ägobro vid 7 ⁺³⁸ enligt specificerat kostnadsförslag					330	
9-11	200	Schaktning av lera	520	0,90	468	-	468	-
		Ombyggnad av ägobro vid 10 ⁺²³ enligt specificerat kostnadsförslag					330	-
11-13 ^C ⁺⁵	205	Schaktning av lera	400	0,90	360	-	360	-
		Ufplanering av jordstängerna	2200	0,25	550	-	550	-
		För arbete, kilsyn och gränsbedda uppfyller tilläggs o. a. praxis av föreskända belopp					365	50
Summa 1345		Summa kronor					3800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Specifiserat kostnadsförslag</u> <u>för brobyggnader.</u>								
<u>Sjö- och äggrävsbroar vid 4⁺³¹</u> <u>7⁺³⁸ och 10⁺²³</u>								
Inköp och frakt av 10 m:s (70 ^m)								
rör, betong 1:3, 0,75 m. längd st.			7	20-	140	-		
Rustbädd av 0,15 m:s virke					15	-		
Medläggning av rören st.			7	3:-	21	-		
Skyddsmurar av betong 1:3:3								
med armering av 16 mm:s rund-								
järn vid båda rörmy- ningarna st.			2	50-	100	-		
Rivning av gamla bron, återfyllning och planering av vägbanan m.m.					54	-		
Summa kronor					330	-		

Malm pr. Bettra den 31 mars 1938.

Nathan Singshörn

Läkens lantbruksingenjör.

Skola 1:100.000.



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Malm 1², 1³, 2⁶, 3², 3³ och Ösby 1¹¹, 3¹⁵ i Husby-Öppunda socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 omkring 4 kilometer söder om Husby-Öppunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 19,20 har åker.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består å de lägre belägna delarna av dy- eller dymylla på lera och å de högre belägna delarna av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C. Härigenom beräknas vattenståndet i avloppet komma att praktiskt taget sänkas till i nivå med sjön Långhalsens vattenstånd.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 3,5 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km² till 0,35 m³/sek.

Avloppet har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,75 meter å sträckan A-B och 0,5 meter å sträckan B-C. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,66 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,21 meter. Härvid är hänsyn dock icke tagen till den uppdämning, som kan förorsakas av vattenståndet i sjön Långhalsen.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen utmärktes de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola tre ägovägs- eller ägobroar vid punkterna 4+31, 7+38 och 10+23 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Rören till broarna skola vara utförda med en blandning av 1:3 med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.


Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen å 0,1 meters över nu förekommande högsta vattenstånd i sjön Långhalsen eller 1,4 meter över medelvattenytan i avloppet,

Torrläggningsföretaget Malm
i Husby-Öppunda socken av Södermanlands län.

Graderingsskala

Punkt 6.

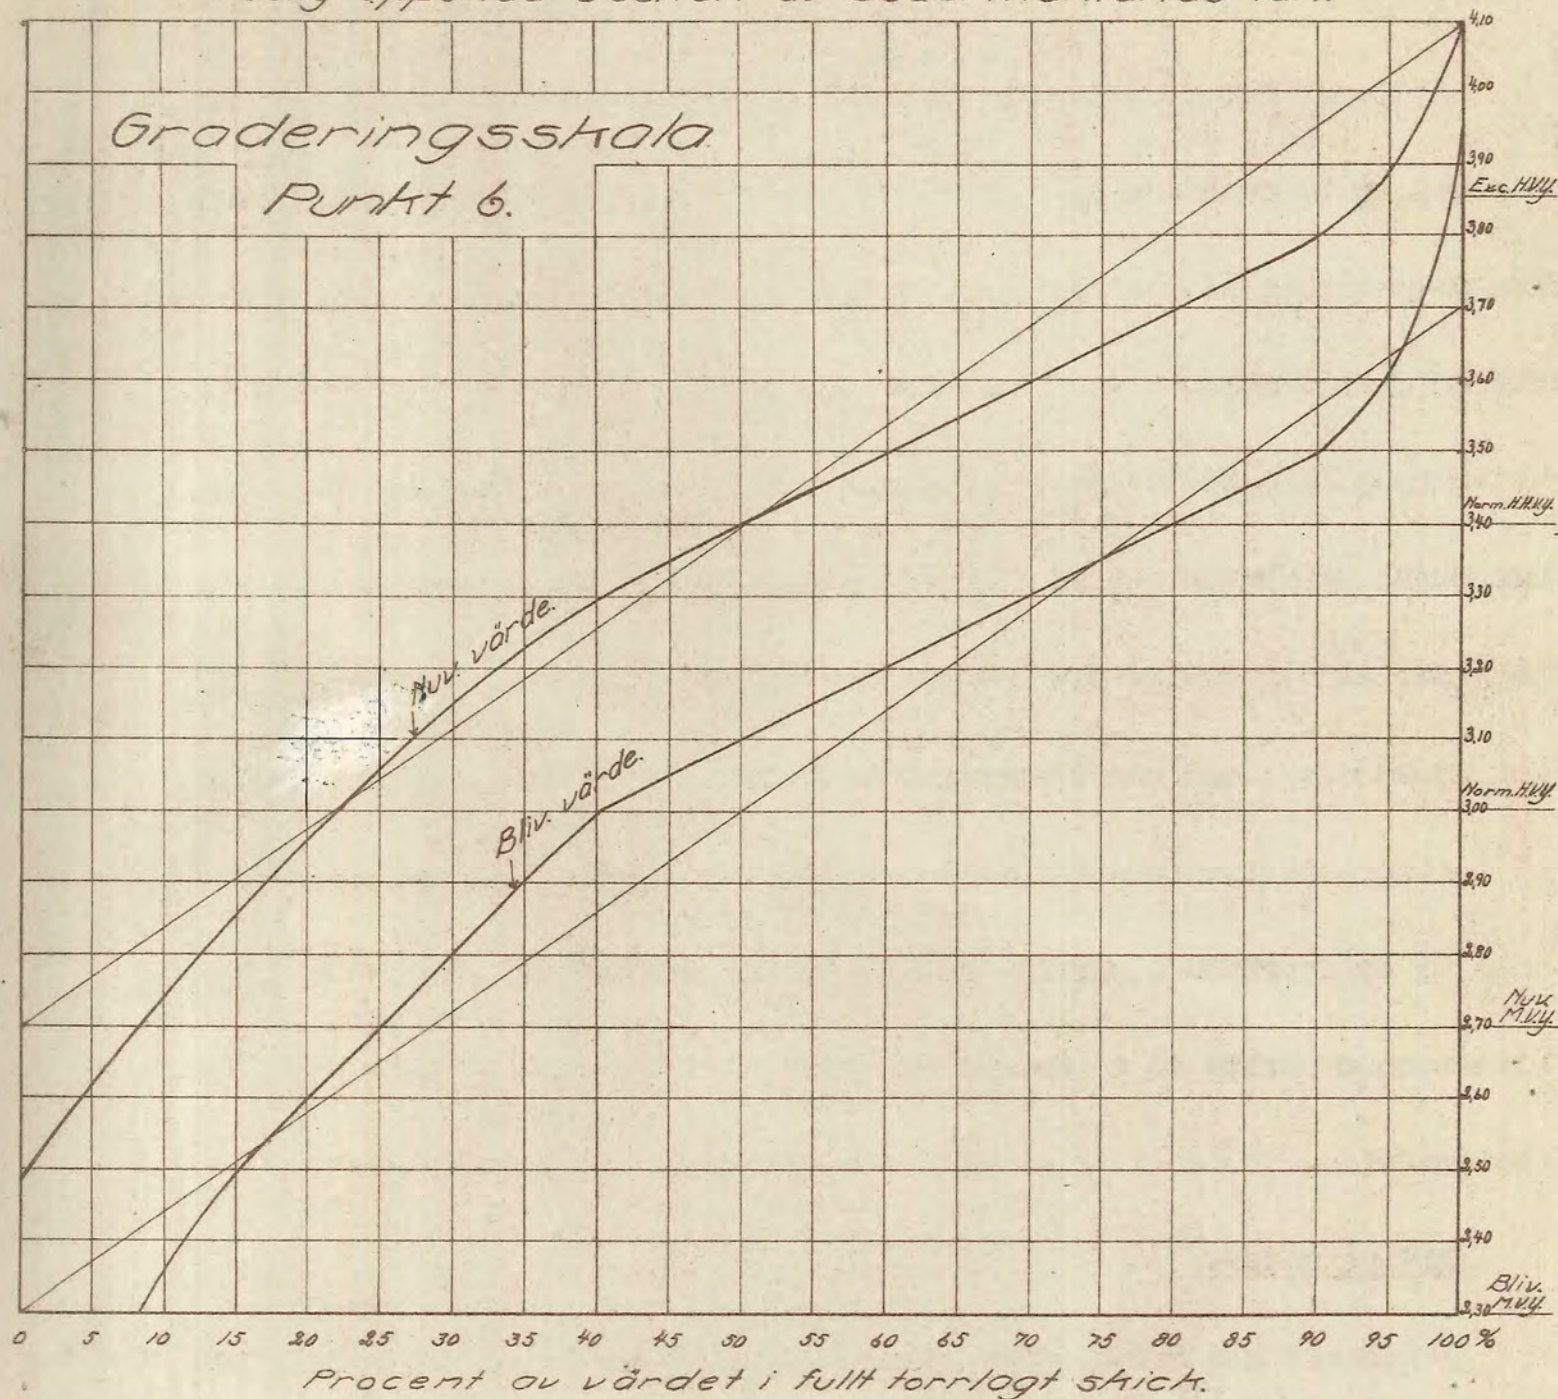

varvid dock tillägg gjorts för erforderligt fall för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid värderingen har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda med hänsyn till fullständig torrläggning uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av hithörande värderingslängd.

Markernas värde före och efter företagets utförande hava beräknats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande, respektive blivande vattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markernas nuvarande och blivande värde uträknats i enlighet med här bifogade graderingsskalor. Markernas nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick finnes infört i värderingslängdens 16 kolumn, och den blivande torrlägningsgraden utvisas av värderingslängdens 19 kolumn.

För varje ågofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden. För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 8.404:35 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 13.188:30 kronor. Den genom företaget beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 4.783:95 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets upptagande jämte brobyggnader och jordsträngarnas utplanering till 3.800:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. All i företaget ingående mark tillhör sökanden till företaget. De med företaget förenade kostnaderna skola dock, om så erfordras, fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till å desamma uppskattad båtnad genom torrläggningen enligt repartitionstal, som härför uträknats och införts i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetets skall vara i sin helhet fullbordat inom fyra år efter det denna synförrättning vunnit laga kraft.

I arbetet för företaget ingår även utplanerande eller bortförande av jordsträngarna. Därest detta ej omedelbart sker, skall iakttagas, att jordsträngarna, vilkas lutning mot avloppet icke får vara brantare än 1:1,25,

3/.

skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter samt att öppningar i strängarna skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget erhådda torrlägningsresultatet skall, där någons rätt kan vara därav beroende, avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall sålunda grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna värtbildningar och islämningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de na befintliga broarna över avloppet.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel o.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han,
att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendom-
stol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola in-
givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påstå-
enden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handling-
ar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande
vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Malm i Husby-Oppunda
socken av Södermanlands län.

Malm pr Bottna den 31 mars 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

Eric Karlberg

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Arbättningsföretaget Malm*

i *Husby-Gyunda* socken och *Gödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50	1	50	1	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	25	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	57	0,24	13	68		
		har	19,20	0,78	14	98		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	8	0,05		40		
		har	0,72	0,78		56		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10—15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	42	11,-	2	20	39	32
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			4	-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~					4	-
		Överföres					44	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 82
		Avvägning.				
1937	30,30 8 9 2/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	1920	0,50	9 60	
		avvägda punkter	100	0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,5	2,00	5 -	
		i annan mark		5,00		41 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3/ ar, ...	65	0,05	3 25	
		har	1992	0,10	1 99	5 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	65	0,04	2 60	2 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	114	0,06	6 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	57	0,12	6 84	17 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1345	3,50	4 71	4 71
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,25	7 -	
		„				
		„				7 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	3,5	0,02	07	
		dagar		12,00		2 07
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1345	3,50	4 71	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1345	1,00	1 35	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² „				
		nämligen				
		„ „ „				
		„ „ „				
		„ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) „ „ över 20 „		10,00		6 06
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34	0,03	1 02	2 02
		Överföres				136 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	/	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1345	4,00	5 38	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 80	9 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	/	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		— —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00	18 —	18 —
1938	3/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	4/2	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				202 08
		1 a) 1:sta ~~regalarbet~~ blad				7 —
		övriga regalarblad st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 3/ ar ägofigurer st.	65	0,07	4 55	
		har	1892	0,14	2 79	
		Överföres			7 34	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 34	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 84	
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 00	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	14 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1345	6:-	8 07	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 -	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
				12,00		- -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
			27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				58 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				27 40
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				25 -
		Summa kronor				55 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				202 08
		Lösen för kopior och avskrifter				58 55
		Övriga förrättningskostnader				55 40
		Summa kronor				316 03

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gyunda häradsrätt.

Malm fr. Belma den 31 mars 1938

Marin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sven Andersson

Eric Karlberg

Kronor kvitteras:

den 19

60ll 4/38

Förestående avskrift, sid. 1-36, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karlén Ljungström

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 mars 1938 avslutad laga syneförrättning angående torrlägningsföretaget Malm i Husby-Öppunda socken av Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 juli 1938.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:--

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören Martin Lingström, p.b.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Malm" i Husby-Oppunda socken
av Södermanlands län.

Lån 2,240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 3 mars 1939. Lånet minskat enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens
beslut den 16 mars 1939 till 2.060 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Husby-Oppunda socken.</u>			
Malm	1/2	2 1	Henrik Michalowski
"	48/100	6 2	Densamme
"	1/4	2 3	Densamme
"	1/4	3 3	Densamme
Osby	1/10	11 1	Densamme

Stockholm den 24 april 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Godk. 24/4 1939

306/29

Avskrift.

DIARIE Nr 7748
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1939.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Malm i Husby-Oppunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 mars 1939.

(Stämpel) Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.920:- kronor, genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 mars 1939 minskat till 1.750:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.240:- kronor, genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 mars 1939 minskat till 2.060:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ende intressent: Godsägaren Henrik Michalowski, Malms gård, Bettna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 april 1939.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de beräknade.

Nyköping den 21 april 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar.

Martin Lingström
