

120

Y 1*0738

8665

9.92

29 APR. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 februari 1927 för
Näs avdikningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C. Berner
vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundraåt-
tio /2.780/ kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, har **a** undertecknad **e**,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind **a** ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 augusti 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Näs pr Bredbyn

den

26/4

1927.

Olof Nilsson

P. O. Östlund

Erik Hallin

Att Faktor Olof Nilsson, hemmansägarna P.O. Östlund och Erik Hallin i Näs av Anundsjö socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Nilsson

Krist. Wästman

Adress

Bredbyn

Adress

Bredbyn

Med stöd av Kungl. brevet den 24 februari 1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 12 maj 1927.

Ant. Malmberg

W. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

120/27 - Bidrag

Y 1*0738

Afskrift

9-972

8665

29 APR 1927

Avskrift av handlingar rörande


NÅS AVDIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.



Afskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den
24 februari 1927 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
tillbägg, att upptagande av sträckan
9-11+72 av diket A-B-C med större
dimensioner än som i profildröjningen och
i grävningstabellen angivits med blå be-
teckning icke skall ingå i det arbete
som innefattas i den fastställda arbets-
planen.

Stockholm den 29 mars 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Handlingar rörande

NÄS AVDIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

Bestyrkes & tjänstens vägnar
Lau Holm


i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA.

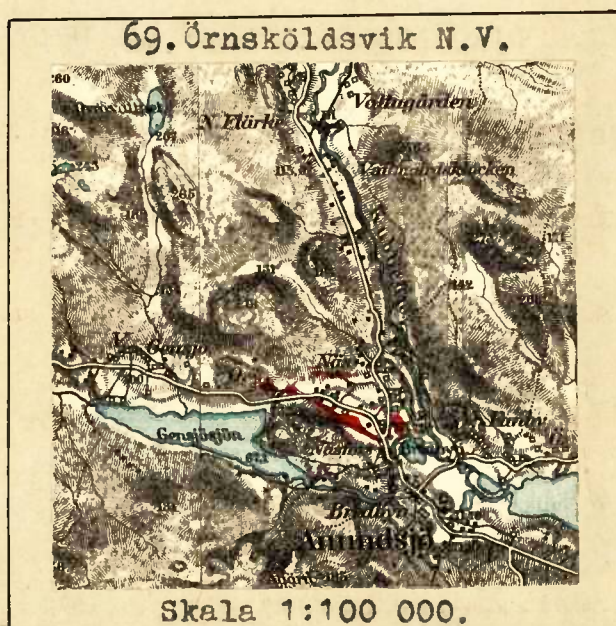

Betänkande och förslag rörande Näs
avdikningsföretag av år 1926 avse-
ende torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Näs by i Anund-
sjö socken av Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m. Efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen på
därom gjord ansökan utfärdat förordnande hava nödiga förundersökningar
för upprättande av förslag till torrläggning av vattenskadade marker
inom Näs by företagits under år 1925, och har på grundval av dessa un-
dersökningar nu föreliggande förslag upprättats.

Företagets samtliga intressenter hava i en till detta betänkande
fogad föreningsskrivelse /bil.B₁/ förbundit sig att gemensamt utföra
och fullborda ifrågavarande torrlägningsarbete under förutsättning
att bidrag från norrländska avdikningsanslaget beviljas till de med
företaget förenade kostnaderna.

Läge, areal, jordmån. De vattenskadade markerna äro belägna omkring
2 km. NV om Anundsjö kyrka och är området å vidstående översiktskarta
till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd färg.

De marker vilkas torrläggning nu avses bestå av två från varandra
helt skilda områden, västra och östra området, och utgöres enligt när-
slutna ägobeskrivning /bil.A/ dessas sammanlagda yttinnehåll av:

åker	12,28 har
äng	0,07 "
annan mark	<u>0,48 "</u>
Summa	12,83 har.

Jordmånen inom områdena utgöres av lermylla på lerjord. Vegetationen består av våra vanliga kulturväxter.

Vattenavledning. För torrläggning av ifrågavarande marker har, såsom bifogade plankarta närmare utvisar, föreslagits upptagande av avloppsdikena A-B-C-D-E-F-G och K-L här nedan benämnde Stora och Lilla avloppet.

Nederbördsområdena och vattenmängderna för dessa diken äro obetydliga, och då dessutom lutningsförhållandena äro goda torde de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utan fara för översvämning.

Bottenbredden har föreslagits till å nedre delen av Stora avloppet 0,5 meter å övre delen 0,3 meter, släntlutningen respektive 1;1,5 och 1:1,25 samt i Lilla avloppet bottenbredden 0,3 meter, släntlutningen 1:1 och slutligen grävningsdjupet till i medeltal 1,4, 1,2 och 1,25 met. och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrlägningsdjupet.

Broar. 11 st ägovägsbroar skola enligt förslaget byggas över Stora av-

loppet och en över Lilla avloppet samtliga enligt å ritning och i grävningstabellen närmare angivna dimensioner.

Hinder mot företaget. Några som helst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torde föreligga. Då företaget ej håller berör annan jordägares rätt synes hinder från enskild sida ej kunna ifrågakomma.

Förslagsritningar. Plankartan över området har upprättats medelst planmätning med intagande av all mark som nu ej kan torrläggas till 1,2 meters djup. De föreslagna avloppens lägen utmärkes å plankartan med dubbeldragna röda linjer, och äro även avvägningspålarnas lägen och nummer angivna med rött.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna marklutning, grävningdjup, bottenbredd, släntlutning m.m. Det föreslagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits en bredare röd.

✕ Förutom av profilritningen med därtill hörande sektioner framgå dikenas föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabellen /bil,C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens utförande skall iakttagas.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnas angivna till läge och höjd å såväl profil och plankarta som i

grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en timpenning av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget /bil. D/ till 6090:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets upprättande samt hantlangning 296:- kronor eller tillsammans 6386:- kr.

Fördelningen av kostnaderna på de olika delägarna framgår av den bifogade kostnadsfördelningslängden /bil.E/.

Jämnt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdikningskostnaderna till omkring 498:- kronor pr har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara fullbordade inom loppet av två år.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser torde till företaget kunna beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget motsvarande hälften av sammanlagda kostnaderna för företaget, sålunda 3193:- kronor eller i avrundat tal 3190:- kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets utförande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets genomförande beviljas största möjliga ~~stats~~bidrag från norrländska avdikningsanslaget.

Till detta betänkande äro fogade:

Översiktskarta.

Ägobeskrivning

Bil. A.

Förening och fullmakt

" B₁ och B₂.

Grävningstabell

" C.

Kostnadsförslag

" D.

Kostnadsfördelningslängd

" E.

Plan- och profilritning.

Visby i juli 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ä G O B E S K R I V N I N G

rörande Näs dikningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

1	2	Bys, hemmans och jordägares namn; ägoslag m.m.	A - R - E - A - L.							
			Åker		Ängs- och odl.- mark		Annan duglig mark		Impe- diment	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Västra området.</u>								
Aa		<u>Näs, Lisa Hedberg.</u>								
	1	Högmark								06
		Summa								06
Ab		<u>Näs, Mo & Domsjö A/Bol.</u>								
	2	Högmark								05
	3	Åker		04						
	4	"		04						
	5	"		05						
	6	"		08						
	7	"		07						
	8	"		08						
	9	"		04						
	10	"		12						
		Summa		53						05
Ac		<u>Näs, J.A.Gulricksson & D.Vågman</u>								
	11	Åker		01						
		Summa		01						
Ad		<u>Näs, K. Backlund.</u>								
	12	Åker		07						
		Summa		07						
Ae		<u>Näs, P. O. Östlund.</u>								
	13	Åker		28						
	14	"		09						
	15	"		10						
	16	"		18						
		Överföres		65						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Överföres		65						
	17	Åker		05						
		Summa		70						
Af		<u>Näs, G. Rydman.</u>								
	18	Åker		23						
	19	"		32						
		Summa		55						
Ag		<u>Näs, E. Hallin.</u>								
	20	Åker		37						
	21	"		28						
		Summa		65						
Ah		<u>Näs, J. Wikström.</u>								
	22	Åker		28						
	23	"		34						
		Summa		62						
Ak		<u>Näs, L. Olsson.</u>								
	24	Åker		37						
	25	"		57						
		Summa		94						
Al		<u>Näs, J. Johansson.</u>								
	26	Åker		35						
	27	"		19						
		Summa		54						
Am		<u>Näs, A. Wikström.</u>								
	28	Åker		31						
	29	"		12						
		Summa		43						
An		<u>Näs, A. Hagström.</u>								
	30	Åker		86						
	31	"		97						
		Summa	1	83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ao		<u>Näs, O. Håkansson.</u>								
	32	Åker		75						
	33	"		16						
	34	"		45						
	35	"		09						
		Summa	1	45						
Ap		<u>Näs, J. O. Olsson.</u>								
	36	Åker		16						
	37	"		10						
	38	Äng				07				
	39	Skogsmark						07		
	40	"						05		
		Summa		26		07		12		
Ar		<u>Näs, M. Byström.</u>								
	41	Skogsmark						28		
	42	"						08		
		Summa						36		
As		<u>Näs, O. Nilsson.</u>								
	43	Åker		07						
	44	"		03						
		Summa		10						
Ah		<u>Näs, J. Wikström.</u>								
	45	Åker		04						
	46	"		18						
	47	"		70						
	48	"		26						
		Summa	1	18						
As		<u>Näs, O. Nilsson.</u>								
	49	Åker		17						
	50	"		30						
		Summa		47						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Östra området.</u>								
Ae		<u>Näs, P. O. Östlund.</u>								
	51	Åker		16						
	52	"		36						
	53	"		30						
	54	"		38						
	55	"		30						
	56	"		22						
	57	"		20						
	58	"		03						
		Summa	1	95						
		<u>SAMMANDRAG.</u>								
		<u>Västra området.</u>								
Aa	1	Näs, Lisa Hedberg								06
Ab	2-10	" Mo & Domsjö A/Bol.		53						05
Ae	11	" J.A.Gulriksson & D.Vågman		01						
Ad	12	" K. Backlund		07						
Ae	13-17	" P. O. Östlund		70						
Af	18-19	" G. Rydman		55						
Ag	20-21	" E. Hallin		65						
Ah	22-23	" J. Wikström		62						
Ak	24-25	" L. Olsson		94						
Al	26-27	" J. Johansson		54						
Am	28-29	" N. Wikström		43						
An	30-31	" A. Hagström	1	83						
Ao	32-35	" O. Håkansson	1	45						
Ap	36-40	" J. P. Olsson		26		07			12	
Ar	41-42	" M. Byström							36	
As	43-44	" O. Nilsson		10						
Ah	45-48	" J. Wikström	1	18						
As	49-50	" O. Nilsson		47						
		<u>Östra området.</u>								
Ae	51-58	Näs, P. O. Östlund	1	95						
		Summa	12	28		07		48		11

Stockholm i maj 1926.

Carl Berner.

F Ö R E N I N G

rörande utdikning av vattenskadade marker tillhörande Näs by i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Emellan undertecknade ägare till nämnda marker inom Näs by har denna dag träffats följande överenskommelse:

- 1/. Förbinda vi oss att i enlighet med här nedan intagna grunder utföra och fullborda utdikningsföretaget inom Näs by i fullkomlig överensstämmelse med det förslag som på grundval av utförda förundersökningar kommer att upprättas av lantbruksingenjör Carl Berner dock med iakttagande av de ändringar i arbetsplanen som Kungl. Maj:t möjligen kan finna skäligt föreskriva såsom villkor för densammas fastställande, allt under förutsättning att statsbidrag till arbetets utförande beviljas;
- 2/. Likaledes förbinda vi oss att för all framtid underhålla det utförda arbetet uti föreslaget och lagenligt skick;
- 3/. Grunden för utdikningens genomförande och dess framtida underhåll bliver den att var och en dikar eller bekostar dikningen på sin mark samt i rågångar grannar deltaga med hälften vardera.
- 4/. I samma proportion, som de beräknade kostnaderna för företagets genomförande belöper sig på var och en av oss, skall kostnaderna för förslagens upprättande och övriga förrättningskostnader för-

delas mellan oss.

5/. Det statsbidrag, som möjligen kan erhållas skall fördelas mellan oss i samma proportion som kostnaderna för företagets utförande enligt den fastställda arbetsplanen belöpa sig på var och en av oss.

6/. Till arbetsstyrelse utse vi enhälligt följande 3 personer nämligen: Faktor Olof Nilsson, Näs pr Bredbyn, P.O. Östlund, Näs pr Bredbyn och Erik Hallin, Näs pr Bredbyn.

Arbetsstyrelsen får i uppdrag:

a/ att ingå till Konungen med underdånig ansökan om största möjliga statsbidrag till utdikningsarbetets genomförande;

b/ att med Kungl. Maj:t och Kronan upprätta kontrakt om arbetets utförande inom viss bestämd tid;

c/ att uppbära och kvittera det statsbidrag, som möjligen kan erhållas samt detsamm efter förestående grund fördela;

d/ att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter;

e/ att noga tillse och övervaka, att arbetet utföres i fullkomlig överensstämmelse med det fastställda förslaget;

f/ att i övrigt vidtaga allt vad till företagets ändamålsenliga genomförande lända kan.

7/. Arbetet skall vara fullständigt färdigt till avsyning inom 2 år

efter det statsbidraget beviljats.

8/. Försummar någon av oss att inom föreskriven tid fullständigt genomföra det honom åliggande arbetet eller brister i fullgörandet av nu åtagna förpliktelser äger arbetsstyrelsen att utan vidare hörande på den försumliges bekostnad genast låta utföra eller ombesörja desamma och på laglig väg söka honom härför.

9/. Att förvara företagets kartor och handlingar utses faktor Olof Nilsson, Näs pr Bredbyn, telefon Bredbyn 24.

Sålunda överenskommet försäkra:

Näs pr Bredbyn den 9 sept. 1925.

M. Byström.	Lars Olsson.	Olof Nilsson.
J. Johansson.	Erik Hallin.	Lisa Hedberg.
Nils Wikström.	Ossian Håkansson.	Per Olsson.
J. A. Hagström.	D. Vågman.	P. O. Östlund
G. Ryman.	K. Backlund.	J. Wikström.
J. A. Gulliksson.	Mo & Domsjö Aktblg gn.	E. M. Persson.

Bil. B₂.

Härigenom befullmäktigas Herr Förvaltaren G.H. von Post i Norrflärke att i alla angelägenheter, som röra undertecknat bolags fasta och lösa egendom och intressen i allmänhet inom Anundsjö, Mo och Björ-

na socknar i Västernorrlands län, antingen själv eller genom av honom befullmäktigat ombud bolagets talan föra, rätt bevaka och rösträtt utöva; gällande denna fullmakt, som jämväl medför befogenhet att å styrelsens vägnar avgiva deklaration till skogsaccis, inför alla domstolar, exekutiva och andra myndigheter, vid konkurs- och lantmäterisammanträden, kommunal-, kyrko- och vägstämmor, vid alla andra stämmor, sammanträden och möten av vad slag det vara må, ävensom eljest där bolagets rätt och intressen är ifråga. Härnösand den 25 juni 1925.

Mo och Domsjö Aktiebolag

Carl Kempe.

Vittna:

Gustaf A. Grahn. Eric Höglund.

Rätt avskrivet betyga:

Henning Hörnsten. E. Eriksson.

Fullmakt för Inspektor Erik Persson, Bredbyn att vid sammanträden rörande torrlägningsföretag i Näs by av Anundsjö socken, Västernorrlands län, bolagets talan föra och rätt bevaka, hållande vi för gilt ombudets laga åtgärder. Norrflärke den 1925.

Vittna:

G. H. von Post.

Henning Hörnsten.

E. Eriksson.

Kungl.
 Patent- och Registreringsverket
 Aktiebolagsavdelningen
 Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 11 oktober 1897 beviljat registrering för Mo och Domsjö Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte vid Domsjö i Själevads socken av Västernorrlands län, enligt en den 30 oktober 1922 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Seth Michael Kempe å Drafle och Löjtnanten Johan Carl Kempe å Granudden, båda i Hemsö socken av ovannämnda län samt advokaten Ernst Conrad Treffenberg i Djurshölm, med disponenten Karl Salin i Stockholm, och jägmästaren Mauritz Carlgren å Varglund, Hemsö socken, till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 25 juni 1925.

Ex officio:

C.F. Edelstam.

Stämpel.

Lösen	Kr.	1:50
Stämpel	"	<u>2:--</u>
Summa		3:50

Vidimeras:

Arvid Magnusson

G. Löfgren.

Rätt avskrivet betyga:

Henning Hörnsten.

E. Eriksson.

Journal

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Journal des observations

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar	
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppsdiket A-B-C-D-E-F-G.</u>							
<u>Sträckan A-B-C.</u>							
0	-	1.80	0.50	5.90	1:1.5	Grävningen börjar. Fyll höjd + 6.62	
+ 10	10	1.80	"	5.90	"		
+ 36	26	1.60	"	5.30	"		
+ 50	14	1.05	"	3.65	"		
1	50	1.20	"	4.40	"	1+11-1+75 Nygrävning.	
+ 50	50	1.50	"	5.00	"		
2	50	1.20	"	4.40	"	Vid 1+78 stopas upprättning, $h = 20$, $B = 15$ cm.	
+ 50	50	1.40	"	4.70	"	" 2+90 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
3	50	1.40	"	4.70	"	" 3+37 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
+ 50	50	1.40	"	4.70	"		
4	50	1.40	"	4.70	"	" 4+10 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
+ 50	50	1.40	"	4.70	"		
5	50	1.40	"	4.70	"	" 4+97 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
+ 50	50	1.40	"	4.70	"	" 5+56 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
6	50	1.40	"	4.70	"		
+ 50	50	1.40	"	4.70	"		
7	50	1.40	"	4.70	"		
+ 50	50	1.40	"	4.70	"	" 7+85 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
8	50	1.40	"	4.70	"		
+ 50	50	1.40	"	4.70	"		
9	50	1.40	"	4.70	"	+ 9+10 " " " $h = 20$, $B = 15$ cm.	
+ 50	50	~~1.00~~ 1.40	"	~~3.50~~ 4.70	"		
+ 85	25	~~1.30~~ 1.75	"	~~4.40~~ 5.75	"		
10	15	~~0.70~~ 1.20	"	~~3.60~~ 4.25	1:1.5 1:1.25	Vid 10+10. Fyll ~ 10 m. väntat, höjd + 18.12	
+ 50	50	~~0.70~~ 1.20	"	~~3.25~~ 3.75	"	" 10+80 stopas upprättning, $h = 15$, $B = 15$ cm.	
11	50	~~0.70~~ 1.20	"	~~3.25~~ 3.75	"		
+ 50	50	~~0.70~~ 1.20	"	~~3.25~~ 3.75	"		
+ 72	22	~~0.70~~ 1.20	"	~~3.25~~ 3.75	"	9+45-11+72. Nygrävning	
Summa	1172						

[illegible]

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbar-
nas överkant;
- att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare av-
loppets kanter än 1,0 meter samt snarast möjligt böt bortföras;
- att jordbankarna ej få givas brantare inre sidoluthing än motsvarande
dikesslänt samt omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för
ytvaŕtnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen
inmynnande tegdiken eller svackor i marken, dock minst på var
50:nde meter;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår;
- att krökar å diket skola avrundas för minskade av faran för urskärning;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl.med det snaraste
skola borttagas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att föreslagna ågobroar få, därest markågaren så önskar, flyttas till
annat ställe än det i grävningslistan och å ritningarna angivna
samt
- att fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande finnas inhuggna
med läge i plan och profil, som av ritningar och grävningslista
närmare framgår.

Stockholm i maj 1926.

Carl Berner.

Kostnadsförslag.

Timp. 70 öre

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Autoppsdiktet A-B-C-D-E-F-G.</u>								
<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0-0+36	36	Lera	50	1.-	50 -			
		Tilläggs c:a 10% för oförutsetta utgifter m.m.			5 -		55 -	
0+36-1+11	75	Lera	190	0.80	152 -			
		Tilläggs c:a 10%			16 -		168 -	
1+11-1+75	64	Lera	250	0.80	200 -			
		Tilläggs c:a 10%			20 -		220 -	
1+75-1+95	20	Lera	50	0.80	40 -			
		Tilläggs c:a 10%			4 -		44 -	
1+95-2+60	65	Lera	170	0.80	136 -			
		Styckero vid 1+98 (inf. specialkostn. förslag)			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			29 -		315 -	
2+60-3+02	42	Lera	100	0.80	80 -			
		Styckero vid 2+90			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			23 -		253 -	
3+02-3+84	82	Lera	180	0.80	144 -			
		Styckero vid 3+37			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			30 -		324 -	
3+84-4+60	76	Lera	175	0.80	140 -			
		Styckero vid 4+10			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			30 -		320 -	
4+60-5+20	60	Lera	110	0.80	88 -			
		Styckero vid 4+97			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			24 -		262 -	
5+20-5+75	55	Lera	70	0.80	56 -			
		Styckero vid 5+56			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			21 -		227 -	
5+75-6+17	42	Lera	65	0.80	52 -			
		Styckero vid 5+89			150 -			
		Tilläggs c:a 10%			21 -		223 -	
	617	Överföres	1410				2411 -	

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	617	Överfört	1410				2411	-
6+17-7+88	171	Lera	210	0.80	200	-		
		Styckero vid 7+85			150	-		
		Tilläggs o:a 10%			35	-	385	-
7+88-9+50	162	Lera	460	0.80	368	-		
		Styckero vid 9+10			150	-		
		Tilläggs o:a 10%			52	-	570	-
9+50-11+72	222	Lera m. sten o block	160		320	-		
			380	2.00	760	-		
		Lera	120		96	-		
			200	0.80	200	-		
		Översten	20	3.50	70	-		
		Styckero vid 10+80			120	-	664	-
		Tilläggs o:a 10%			58	-	1264	-
			240		444	-	4030	-
	1172	Summa					4630	-
<u>Sträckan D-E.</u>								
13+33-13+94	61	Lera	60	0.80	48	-		
		Tilläggs o:a 10%			5	-	53	-
13+94-14+50	56	Lera med sten o block	35	2.-	70	-		
		Lera	80	0.80	64	-		
		Tilläggs o:a 10%			13	-	147	-
	117	Summa	175				200	-
<u>Sträckan F-G.</u>								
15+23-17+48	225	Sten och block	45	3.50	157	50		
		Lera m. sten o block	20	2.50	50	-		
		Lera	350	0.80	280	-		
		Översten	8	3.50	28	-		
		Styckero vid 16+80			120	-		
		Tilläggs o:a 10%			66	50	702	-
17+48-18+50	82	Lera	145	0.80	116	-		
		Tilläggs o:a 10%			12	-	128	-
	307	Summa	568				830	-

Läge pånummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Fuloppsdiktet K-L.</u>						
20 - 23+23	323	lera, dybländad	450	0.60	270	-		
		dy	30	0.45	13	50		
		Styckero vid 22+50			110	-		
		Tilläggs 0.10 %	480		36	50	430	-
	323	<u>Summa</u>					430	-
		<u>Sammandrag</u>						
	1172	A-B-C	2420		4030	-		
	117	D-E	175		200	-		
	307	F-G	568		830	-	5490	-
	323	K-L	480		430	-	6090	-
Summa	1919	<u>Summa dikningskostnad</u>	3643				5490	-
		<u>Härtill kommer:</u>					6090	-
		för förslagens upprättande			256	-		
		" handläggning dagv. 8 5:-			40	-	296	-
		<u>Summa Kostnad</u>					5386	-
		<u>Stockholm i maj 1926.</u>					6386	-
		<u>Carl Berner</u>						
		<u>Spezialkostnadsförslag för ågarna vid 1+98</u>						
		<u>Virke:</u>						
		Följare	m ³	0.26				
		Bärplank	"	0.91				
		Bärbjälkar	"	0.46				
		Bärbjälkar	"	0.29				
		Kantplank	"	0.18				
		<u>Summa "</u>	2.10	0.60	126	-		
		Butlar, arbete, transporter o dyf.			24	-		
		<u>Summa</u>			150	-		
		<u>Afskrift.</u>						
		<u>Wid arbete =</u>						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Littera	Delägares namn; dikessträcka m.m.	Diknings- kostnad		Summa diknings- kostnad		Förrätt- nings- kostnad		Total kostnad	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Näs by.</u>								
Aa.	<u>Lisa Arberg:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 0-0+36	27	50	27	50	1	16	28	66
Ab.	<u>Moo & Lomejö A.B:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 0-0+36	27	50						
	" 0+36-1+00	138	-						
	" 1+11-1+75	220	-	385	50	16	21	401	71
Ac.	<u>J. A. Gunnarsson och D. Vågman:</u>								
	av A-B-C: sträckan 1-1+11	30	-	30	-	1	26	31	26
Ad.	<u>K. Backlund:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 1+75-1+95	22	-	22	-		93	22	93
Ae.	<u>P. O. Collund:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 1+75-1+95	22	-						
	" 1+95-2+60	315	-						
	av K.-L. hela liket	430	-	767	-	32	24	799	24
Af.	<u>G. Rydman:</u>								
	av A-B-C: sträckan 2+60-3+02	253	-	253	-	10	64	263	64
Ag.	<u>E. Hallin:</u>								
	av A-B-C: sträckan 3+02-3+84	324	-	324	-	13	62	337	62
Ah.	<u>J. Wikström:</u>								
	av A-B-C: sträckan 3+84-4+60	320	-						
	" D-E: " 13+94-14+50	147	-						
	" F-G: " 15+23-17+48	702	-	1169	-	49	14	1218	14
Ak.	<u>L. Olsson:</u>								
	av A-B-C: sträckan 4+60-5+20	262	-	262	-	11	01	273	01
Al.	<u>J. Johansson:</u>								
	av A-B-C: sträckan 5+20-5+75	227	-	227	-	9	54	236	54
	Överföras			3467	-	145	75	3612	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	[~] Överfört			3467	-	145	75	3612	75
7m	<u>N. Wikström:</u>								
	av A-B-C: sträckan 5+75-6+17	223	-	223	-	9	37	232	37
7n	<u>A. Hagström:</u>								
	av A-B-C: sträckan 6+17-7+88	385	-	385	-	16	18	401	18
7o	<u>O. Håkansson:</u>								
	av A-B-C: sträckan 7+88-9+50	570	-	570	-	23	96	593	96
7p	<u>J. P. Olsson:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 9+50-10+85	393	-						
	" 10+85-11+72	478	-	871	-	36	61	907	61
7r	<u>M. Byström:</u>								
	av A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 9+50-10+85	393	-	393	-	16	52	409	52
7s	<u>O. Nilsson:</u>								
	av D-E: sträckan 13+23-13+94	53	-						
	" F-G: " 17+48-18+30	128	-	181	-	7	61	188	61
	<u>Summa</u>			6090	-	256	-	6346	-

Streckhalan i maj 1926.
Carl Berner.

Lantliga hantlingar rätt avskrivna betygas
A. Ljängstens vägnar:
Carl Berner
Status o. lantbruksingenjör

Bestyrkes i Ljängstens vägnar:
Carl Holm

16
27

18760
19 OKT. 1927

I n t y g .

På begäran av arbetsstyrelsen för Näs avdiknings-
företag av år 1926 i Anundsjö socken av Västernorrlands län,
vartill Kungl. Majt den 24 februari 1927 anvisat ett statsbi-
drag utan återbetalningsskyldighet av 2.780 kronor från
statens avdikningsanslag , intygas härmed att arbetet på
detta företag är påbörjat .

Näs pr Bredbyn den.....

.....*P. E. Jansson*.....

.....*P. O. Larsson*.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....*W. Kihlman*.....

.....*R. Nilsson*.....

1871

1871

1871

1871

1871

P. M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelsen den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag (nr 257)

till Näs avdikningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Ägoslag och areal

Åker	12,28 hektar
Ständig slåtter- och betes-	
vall	- "
Annan mark	0,55 "
Summa	12,83 "

KOSTNAD 5.786 kronor

Medelkostnad per hektar omkring 450 kronor.

Till kostnaden för diken A - E och F - G, 1.085 kronor 54 öre, varigenom torrläggas en areal av 1,75 hektar för en medelkostnad av omkring 620 kronor per hektar, beräknas statsbidrag till $1,75 \times 250 = 437$ kronor 50 öre.

Till kostnaden för övriga diken, 4.700 kronor 46 öre, varigenom torrläggas en areal av 11,08 hektar för en medelkostnad av omkring 425 kronor per hektar, beräknas statsbidrag till hälften av kostnaden det vill säga 2.350 kronor 23 öre.

STATSBIDRAG utgår med 2.780 kronor.

Arbetsplanen fastställas med tillägg ett upptagande av sträcken 9 - 11 + 72 av diket A - B - C med större dimensioner än som å profilritningen och i grävningstabellen angivits med blå be-teckning icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fast-ställda arbetsplanen. Stockholm den 4 februari 1927.

Olof Fredholm.
föredragande.

Godkänd den 13 nov 1929

16
27



21282

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1929

BEVIS

över verkställd ^{besiktning} avsyning av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1929.

angående det företag, som avser

"Näs dikningsföretag av år 1916"

uti

Buundsjö

socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

24 februari 1927

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr.

2780:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

12 maj 1927

Fastställd arbetstid till den

1 augusti 1929

Förlängd arbetstid till den

Vid av undertecknad

*Genom agronom W. Andersson
den 19 oktober 1929 verkställd ansejning av
öran angivna arbete befäms det samma
vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, varför företaget i
sin helhet förordas till godkännande.*

Härnösand den

28 oktober 1929

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

31885

BEVIS

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914
